



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/066/2016

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO CHEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DIA **7** DE **NOVIEMBRE** DE **2016**, SE REUNIERON LO REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHORA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDR** R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOySP/FISMDF-066/AD-043/2016**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
29-ago-16	27-oct-16	5.00	POSTES	10
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
29-ago-16	27-oct-16			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION **INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
MONTO CONTRATADO :		440,987.34	440,987.34	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		440,987.34	440,987.34	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

PEDRO GRACIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA





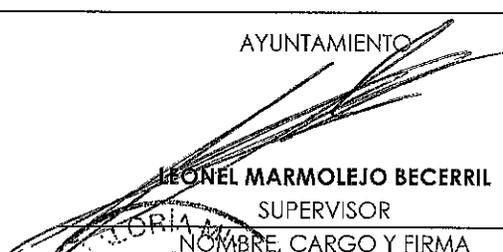
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA
 FISMD/066/2016

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO	 DELEGADO MUNICIPAL	
_____ NOMBRE Y FIRMA	II. AYUNTAMIENTO CONSTITUC JOCOITILÁN, Yucatán 2016-2018	 Nieto Silvestre NOMBRE Y FIRMA
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>Martín de Jesús Velasco,</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Antonio Martínez Pina,</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>José Jesús Moreno Alvarado,</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>Maricela Basilio Palma,</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Félix Gómez Uchima,</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Antonio Martínez Pina,</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA _____ NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  LEONEL MARMOLEJO BECERRIL SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
 FIS MDF/066/2016

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTUTA Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	29-ago	15-sep	195,527.76	0.00	31,284.44	226,812.20
2	16-sep	27-oct	184,633.74	0.00	29,541.40	214,175.14
TOTAL			380,161.50	0.00	60,825.84	440,987.34

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31600017575	\$23,872.25	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1763808	\$44,098.73	
