




**SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS	CONSEJERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	
C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	
ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
M. EN D. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA	DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA	
M. EN A.J. JORGE REYES SANTANA	COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO	
L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON.	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	
L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE AUDITORÍA	
ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO	AUXILIAR DE PROYECTOS ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA





**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las **diez horas del día cuatro de septiembre del año dos mil quince**, reunidos en el Salón de Licitaciones del Edificio Administrativo "B" del Poder Judicial del Estado de México, los integrantes del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, en su carácter de Coordinador Administrativo y Presidente del Comité Interno de Obra Pública; C.P. Martín Augusto Bernal Abarca, Director General de Administración, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Interno de Obra Pública; Actuario Alfonso Daniel Henkel Hernández, Director General de Finanzas y Planeación, en su carácter de Vocal Representante del Área de Finanzas y Planeación ante el Comité Interno de Obra Pública; L.A.E. Laura Antonia Andrade Rojas, Directora de Recursos Materiales y Servicios, en su carácter de Vocal del Comité Interno de Obra Pública; M. en A. de J. Jorge Reyes Santana, Coordinador General Jurídico y Consultivo, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en D. Electoral Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Director de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública; Arq. Fernando Velázquez Sánchez, Subdirector de Administración de Obra Pública, en su carácter de Ponente del Comité Interno de Obra Pública y Arq. Alfonso Márquez Ron, Subdirector de Construcción de Obra Pública, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública y como invitados del Comité Interno de Obra Pública L.C. Juan Vidal Jasso Rodríguez, Director de Auditoría y Arq. Filemón Chávez Osorio, Auxiliar de Proyectos adscrito a la Subdirección de Control y Vigilancia de Obra, quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que sus nombramientos no les han sido revocados y que se reúnen con fundamento en lo dispuesto por los artículos **21, 22, 23 y 24** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de celebrar sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, de acuerdo al Orden del Día propuesta.

En uso de la palabra el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, da la bienvenida a los miembros del Comité Interno de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México e instruye al Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, pasar lista de asistencia a efecto de corroborar la existencia de quórum legal, por lo que se procede en consecuencia una vez verificada la presencia de quórum legal para poder sesionar.

Acto continuo siendo las **diez horas con quince minutos del día cuatro de septiembre del año dos mil quince**, se da por iniciada la presente Sesión Ordinaria del Comité Interno de Obra Pública, en cumplimiento al oficio convocatorio previo.

A continuación el M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, atendiendo a las instrucciones del Presidente del Comité, procede a dar lectura al orden del día, el cual se somete a la consideración de los integrantes del Comité Interno de Obra Pública, mismo que fue aprobado de forma unánime y que se encuentra estructurado conforme a los siguientes términos:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616, Colonia Santa Clara, Toluca, México, Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion/construccion@pjudomex.gob.mx



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Hacer del conocimiento de los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública, acerca del avance físico y financiero del Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal.
4. Se presenta al Comité Interno de Obra Pública, la situación que se presenta en el Edificio de Juzgados de Control y Juicios Orales de Otumba, respecto del servicio de energía eléctrica, con el propósito de dar a conocer acerca de la conveniencia de contratar bajo la modalidad de Adjudicación Directa, lo concerniente a los trabajos de ingeniería necesarios para poder cumplir con la Normatividad que dicta la Comisión Federal de Electricidad y que el inmueble se encuentre en condiciones de poder recibir el servicio eléctrico correspondiente.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

Una vez leído el orden del día, se aceptan por **unanimidad** los puntos a tratar y se procede al desahogo del punto uno del orden del día.

PUNTO UNO. Se toma lista de asistencia y se deja constancia de la existencia del quórum legal necesario para dar por iniciada la sesión del Comité Interno de Obra Pública.

ACUERDO UNO. Se verifica la existencia de quórum legal suficiente para poder sesionar y se acuerda proseguir con el punto siguiente del Orden del Día.

PUNTO DOS. Se da lectura al Orden del Día, solicitándose su respectiva aprobación.

ACUERDO DOS. Se aprueba de manera unánime el Orden del Día, acordándose de conformidad los puntos a tratar.

PUNTO TRES. Hacer del conocimiento de los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública, acerca del avance físico y financiero del Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal.

Al respecto, el Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, presenta a los Integrantes del Comité, documento que contiene el estatus actual y pormenorizado del Programa Anual de Obra Pública 2015.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 2718200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx



ACUERDO TRES. Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime, ordenan que la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública invariablemente cumpla con todas y cada una de las acciones comprometidas en el Programa Anual de Obra 2015.

PUNTO CUATRO. Se hace del conocimiento del Comité Interno de Obra Pública, la situación que se presenta en el Edificio de Juzgados de Control y Juicios Orales de Otumba, respecto del servicio de energía eléctrica, con el propósito de informar acerca de la conveniencia de contratar bajo la Modalidad de Adjudicación Directa, los trabajos de ingeniería necesarios para poder cumplir con la Normatividad que dicta la Comisión Federal de Electricidad, para que el inmueble sea sujeto de contratar y recibir el servicio eléctrico correspondiente.

Por lo cual, se anexa **ESTUDIO DE CONVENIENCIA**, formulado por la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, en el que de manera detallada se explican las razones por las que resulta conveniente realizar la contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa, de alguna empresa especializada en trabajos como los que se requieren.

Asimismo y como parte integral de dicho estudio se incluye la cotización de tres empresas que cumplen con las expectativas requeridas y a las cuales se les solicitó la cotización de los trabajos en comento.

ACUERDO CUATRO. Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime y previo análisis y discusión del **ESTUDIO DE CONVENIENCIA** presentado, con fundamento en los artículos 12.19 y 12.37, fracción IV del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como por los artículos 22, 23, 26 y 69 de su Reglamento, acuerdan se lleve a cabo la contratación de la empresa denominada **MIC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN**, bajo la Modalidad de Adjudicación Directa, ya que su propuesta económica resulta ser la más adecuada conforme al presupuesto base obtenido por la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, instruyéndosele a su vez para que se proceda de inmediato con los trámites necesarios para la contratación respectiva.

PUNTO CINCO. Asuntos Generales.

- **PUNTO CINCO 1.** El Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, hace la acotación a los miembros del mismo que derivado de los recientes ajustes a la estructura organizacional del área administrativa del Poder Judicial del Estado de México, se advierte la carencia ante el Comité Interno del nombre de los suplentes de la Dirección General de Finanzas y Planeación, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, para el caso de inasistencia de los titulares.

ACUERDO CINCO 1. Los miembros del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime acuerdan tener por designados como suplentes de las áreas indicadas a: **C.P. ATENEA SALOMÉ GARCÍA OCAÑA, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD**, en suplencia del titular **ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN; LIC. JOSÉ**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9210 Ext. 15447
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx




LUIS LECHUGA SOTO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, en suplencia de la titular **L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS** y **ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA**, en suplencia del titular **M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**.

- **PUNTO CINCO 2.** Derivado de que a la fecha no se encuentra establecida la aplicación del recurso económico destinado a la "Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción del Edificio de Juzgados de Jilotepec, México (Segunda Etapa)", el Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, presenta a los Integrantes del mismo, la propuesta de redirigir el recurso económico destinado para tal fin, a los trabajos de Supervisión Externa para la construcción del Centro de Convivencia Familiar, Región Tlalnepantla (Lago de Guadalupe), Cuautitlán Izcalli, México, toda vez que en esta obra no se contempló originalmente la contratación del servicio relacionado con la obra pública, ya que resulta indispensable contar en obra con dicho servicio para garantizar la óptima consecución de los resultados esperados.
- **ACUERDO CINCO 2.** Los Integrantes del Comité de Obra Pública, de manera unánime acuerdan sea redirigido el recurso económico que se tenía destinado para la "Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción del Edificio de Juzgados de Jilotepec, México (Segunda Etapa)", para ser aplicado en la "Supervisión Externa para la Construcción del Centro de Convivencia Familiar, Región Tlalnepantla (Lago de Guadalupe), Cuautitlán Izcalli, México". Por lo tanto, se ordena al Secretario Técnico para que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias para que la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, se avoque a la programación y planeación de todo lo necesario para la contratación correspondiente.

PUNTO SEIS. Clausura de la Sesión.

ACUERDO SEIS. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, da por terminada la presente Sesión, cerrándose a las catorce horas con cincuenta minutos del día de su fecha.

POR EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO


MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx




**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"




**C.P. MARTÍN AUGUSTO BERNAL ABARCA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ**



**ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL
HERNÁNDEZ
VOCAL DEL COMITÉ**




**M. en D. E. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA
INVITADO PERMANENTE**



**M. en A. de J. JORGE REYES SANTANA
INVITADO PERMANENTE**



**L.A.E. LAURA ANDRADE ROJAS
VOCAL DEL COMITÉ**




**M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**



**L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA**



**ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ
PONENTE DEL COMITÉ**



**ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON
INVITADO PERMANENTE**




**ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO
AUXILIAR DE PROYECTOS ADSCRITO
A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y VIGILANCIA DE OBRA**

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx





**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

**SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

LISTA DE ASISTENCIA


NOMBRE	CARGO	FIRMA
MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS	CONSEJERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	
C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
M. EN D. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA	DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA	
M. EN A.J. JORGE REYES SANTANA	COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO	M. en D. Silvia Vázquez Sánchez
L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	CPA. CLAUDIA ARRIAGA
M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON.	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	
L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE AUDITORÍA	
Arq. Filemó's Chávez Osorio	Auxiliar de Proyecto Subdirección de Control y Vigilancia.	

C.P. Aleneas S. García D. Subdirectora de Contabilidad
Horacio Sandoval Jiménez Consejo

blé Luis Velazga spto.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx





**ESTUDIO QUE FUNDAMENTA LA CONVENIENCIA DE CONTRATAR
BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

**QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.19 Y 12.37
DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO POR LOS
ARTÍCULOS 22, 23, 26 Y 69 DE SU REGLAMENTO**

**OBRA: SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE
CONTROL Y JUICIOS ORALES DE OTUMBA, MÉXICO.**

I. ANTECEDENTES.

El Edificio de Juzgados de Control y Juicios Orales de Otumba, México, a la fecha cuenta con Servicio de Energía Eléctrica proporcionado directamente por el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba, Estado de México, ya que no ha sido posible regularizar el mismo ante la Comisión Federal de Electricidad, a través del respectivo contrato.

Este hecho origina una dependencia total con el Centro Preventivo, teniéndose serios problemas con el funcionamiento de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de México, ya que cuando se llega a presentar algún tipo de desperfecto en las instalaciones eléctricas del Centro Preventivo, estas repercuten directamente en el funcionamiento del inmueble judicial, y máxime cuando se trata de suspensión del servicio de energía eléctrica provocado por falta de pago a CFE.

En cuanto a la función diaria de los Juzgados de Control y de Juicios Orales ubicados en el inmueble, se prevé que si durante el desarrollo de alguna audiencia falla la energía eléctrica, se podría provocar en primer término que dejen de ser videograbadas las audiencias que se estuviesen desarrollando, además de que se pueden perder datos relevantes relativos a las propias audiencias. En segundo término, se pretende lograr que el inmueble en su conjunto funcione de forma autónoma, sin que este supeditado al servicio de energía eléctrica que pueda ser proporcionado por terceros, además de tratar de eficientar el gasto que actualmente se tiene cuando se da la necesidad de hacer uso de la planta de emergencia instalada en el edificio.

Adicionalmente, el mal funcionamiento del Edificio de Juzgados de Control y Juicios Orales de Otumba, México, por cuestiones eléctricas ha sido dado a conocer a la Dirección de

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@piedomex.gob.mx



Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, a través de oficios emitidos por diversos titulares de Juzgados ubicados en el inmueble, con los cuales dan a conocer la situación que se presenta, realizando a su vez la solicitud correspondiente para que sean solucionados los problemas existentes.

Los trabajos de regularización del Servicio de Energía Eléctrica para el edificio en comento, se encuentran contemplados en el Programa Anual de Obra Pública 2015, bajo el nombre de **"SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE OTUMBA, MÉXICO"**, mismos que en específico se refieren a trabajos de ingeniería en general que deben ser realizados en lo referente a las instalaciones eléctricas del inmueble, a efecto de que se cumpla con la normatividad que emana de CFE, y estar en condiciones de poder celebrar el contrato respectivo.

II. PROPUESTA DE CONVENIENCIA.

Con la finalidad regularizar de manera inmediata el servicio de energía eléctrica en el Edificio en cuestión, resulta conveniente que sea contratada una empresa especializada en trabajos de ingeniería eléctrica bajo la MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, por medio de la cual se evitará comprometer información de naturaleza confidencial de la institución, además de garantizar que se cuente con la experiencia, materiales y equipos suficientes para contar con instalaciones apegadas a la Normatividad, sin que se paralicen las actividades de los Juzgados correspondientes.

Con la finalidad de brindar la transparencia que dicta la Normatividad respectiva, se ha invitado a tres empresas distintas, especializadas en este tipo de actividades, para que coticen los trabajos que se requiere ejecutar en las instalaciones eléctricas del edificio en comento, mismas que atendiendo a la invitación correspondiente, han presentado sus respectivas cotizaciones conforme a lo siguiente:

- GRUPO CONSTRUCTOR VICMI S.A. DE C.V. Que presupuesta la cantidad de \$1'539,970.73 (un millón quinientos treinta y nueve mil novecientos setenta pesos 73/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. Tiempo de entrega de los trabajos: 40 días.
- LM GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. Que presupuesta la cantidad de \$1'349,922.36 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil novecientos veintidós pesos

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx



36/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. Tiempo de entrega de los trabajos: 50 días.

- MIC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN. Que presupuesta la cantidad de \$999,980.87 (novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos 87/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. Tiempo de entrega de los trabajos: 45 días.

Los datos antes señalados, serán puestos a la disposición de las instancias respectivas, a efecto de que se determine lo correspondiente.

TOLUCA, MÉXICO A 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ELABORO:

M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

1. The first part of the document
 discusses the general principles
 of the proposed system. It
 outlines the objectives and
 the scope of the project.

2. The second part of the document
 describes the technical details
 of the system. It includes
 a detailed description of the
 hardware and software components.

3. The third part of the document
 discusses the implementation
 of the system. It includes
 a description of the testing
 procedures and the results of the tests.

4.

5.

6.

7.

8.


9.

10.





CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
OBRA PÚBLICA										
1		ADECUACIÓN DE DOS SALAS DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE IXTLAHUACA, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO CON UN AVANCE DEL 70%.
2		ADECUACIÓN DE DOS SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CUAUTITLÁN (TORRE I) MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO CON UN AVANCE DEL 85%.
3	ESCONAMI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	ADECUACIÓN DE DOS SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CUAUTITLÁN, MÉXICO. (FINIQUITO)	14/10/2014	04/02/2015	100.00%	100.00%	\$376,000.00	\$375,974.48	\$320,278.78	OBRA FINIQUITADA Y RECEPCIONADA.
4		CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, REGIÓN TIALNEPANTLA (LAGO DE GUADALUPE), CUAUTITLÁN (CALLI), MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO CON UN AVANCE DEL 35%. HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON EL LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO QUE DEFINIRÁ LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA. SE CONTÓ CON LA LIBERACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR PARTE DE LA LIC. PATRICIA VILLALOBOS ALVÁREZ EL DÍA 27-AGOSTO-2015. ASÍ MISMO ESTA POR CONCLUIRSE EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS NECESARIO PARA PROPONER LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.
5	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S. A. DE C. V.	ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE I), SEGUNDA ETAPA.	21/05/2015	16/11/2015	43.37%	50.55%	\$19,562,129.00	\$17,395,622.54	\$7,544,112.19	OBRA EN PROCESO SE REPORTO AVANCE FISICO.
6	GRUPO TECMAR, S. A. DE C. V.	ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE TOLUCA, MÉXICO. (FINIQUITO)	09/09/2013	21/02/2014	100.00%	100.00%	\$1,164,000.00	\$1,163,717.00	\$1,003,344.20	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
7		ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAR DOS SALAS DE JUICIO ORAL QUE INCLUYEN ÁREA SEGURIDAD PARA INCLUPADO EN EDIFICIO DE JUZGADOS DE LERMA, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO CON UN AVANCE DEL 97%. SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN. EN ESTE MOMENTO SE LLEVA ACABO LA CONVOCATORIA PARA SU PUBLICACIÓN EL PRÓXIMO 5 DE OCTUBRE DE 2015
8		ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAR DOS SALAS DE JUICIO ORAL QUE INCLUYEN ÁREA SEGURIDAD PARA INCLUPADO EN EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANINGO, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO CON UN AVANCE DEL 20%.
9	SISTEMAS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS Y CENTRO DE MEDIACIÓN DE ATLACOMULCO, MÉXICO. (FINIQUITO).	18/12/2012	19/10/2013	100.00%	100.00%	\$1,145,000.00	\$1,144,331.17	\$1,144,331.17	OBRA FINIQUITADA POR RECEPCIONARSE. ES LA TERCERA INVITACIÓN QUE SE LE HACE A LA EMPRESA PARA QUE ASISTA A EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
10	ALBERTO CASTILLO RODRÍGUEZ (MECANICS)	ESTUDIO DE GEORADAR Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO DEL CONJUNTO JUDICIAL DE LA AMÉRICAS, EN ECATEPEC, MÉXICO.	02/10/2015	15/12/2015	0.00%	2.00%	\$750,000.00	0.00%	0.00%	SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS.



11		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y PENALES DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. INCLUYE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.			0.00%	0.00%	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	NO SE HA PODIDO REALIZAR LA LICITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN DEL PREDIO POR PARTE DEL PODER JUDICIAL YA QUE ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL NORMATIVO PARA INICIAR DICHO PROCESO, SE CARECE DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO.
12		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE OTUMBA, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	
13	SARMIENTO Y ASOCIADOS, INGENIERÍA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE 1). PRIMERA ETAPA.	01/09/2014	30/04/2015	100.00%	100.00%	\$917,000.00	\$916,680.09	\$916,680.09	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
14	SARMIENTO Y ASOCIADOS, INGENIERÍA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE 1). SEGUNDA ETAPA.	01/05/2015	01/12/2015	56.33%	54.35%	\$1,550,000.00	\$1,509,061.18	\$850,010.19	SERVICIO DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
15		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC, MÉXICO (PRIMERA ETAPA).			0.00%	0.00%	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	NO SE HA PODIDO CONTINUAR CON EL PAGO DE LOS TRABAJOS YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO FORMALIZADO DE LA CONTRATISTA.
16		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC, MÉXICO (SEGUNDA ETAPA).			0.00%	0.00%	\$1,435,000.00	\$0.00	\$0.00	NO ES POSIBLE INICIAR CON ESTA ACCIÓN DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA.
		FONDO AUXILIAR								
17		ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR REGIÓN TLALNEPANTLA (LAGO DE GUADALUPE) CUAUTLILÁN IZCALLI, MÉXICO, MÉXICO.	01/10/2015	28/10/2015	0.00%	5.00%	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO PAGO DE LOS SERVICIOS.
18		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TLALNEPANTLA (LOS REYES IZTACALA), MÉXICO.	08/07/2015	05/08/2015	0.00%	100.00%	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS, SOLO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS PARA PODER PAGAR Y CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE.
19		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TEXCOCO, MÉXICO.	26/08/2015	14/09/2015	0.00%	100.00%	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS, SOLO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS PARA PODER PAGAR Y CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE.
20	ESTRADA GONZÁLEZ ARTURO	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.	28/08/2015	26/10/2015	0.00%	5.00%	\$300,000.00	\$297,925.02	\$0.00	SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO LOS TRABAJOS CON UN PORCENTAJE INICIAL DEL 20%.
21	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS NOVA, S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA DE LA TORRE 1 DE JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.	08/07/2015	05/08/2015	66.29%	5.00%	\$220,800.00	\$215,133.30	\$142,609.99	LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS, SOLO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.
22		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE CUAUTLILÁN, MÉXICO.	16/01/2015	31/01/2015	100.00%	100.00%	\$133,000.00	\$132,882.12	\$120,890.12	YA FUE REALIZADO EL FINQUITO DE ESTE CONTRATO, SOLO SERÁ NECESARIO LA TRAMITACIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.
23		MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL EN TOLUCA, MÉXICO.	17/09/2015	15/12/2015	0.00%	0.00%	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	OBRA EN PROCESO.
24		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE CUAUTLILÁN IZCALLI, MÉXICO.	21/09/2015	19/11/2015	0.00%	0.00%	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	OBRA EN PROCESO.
25		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE ECATEPEC (CHICONAUTLA), TORRE II, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	SE REALIZA EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONCURSO SIMPLIFICADO.
26		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE IXTAPALUCA, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$1,437,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO DE CONCURSO SIMPLIFICADO, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARA A CABO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015.
27		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS Y CENTRO DE MEDIACIÓN DE IXTAPAN DE LA SAL, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO DE CONCURSO SIMPLIFICADO, SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.







OBRA: ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE 1).
 CONTRATO: PJ-LP-01-2015
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S.A. DE C.V.
 SUPERVISIÓN: SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.



PODERE EJECUTIVO FEDERAL DE MEXICO

INFORME No. 18

Periodo: DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

"REPORTE SEMANAL DE OBRA "DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN"

NOMBRE DE LA OBRA: "ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE 1).SEGUNDA ETAPA."

NUMERO DE CONTRATO:	PJ-LP-01-2015
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	21 DE MAYO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2015

TRABAJO EJECUTADOS A LA FECHA:

1) SE REALIZÓ JUNTA SEMANAL EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON LA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S.A. DE C.V., SUPERVISIÓN EXTERNA SAI Y SUPERVISIÓN INTERNA DEL PJEM. SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: A) SUPERVISIÓN EXTERNA SOLICITA AL ÁREA DE PROYECTOS DEL PJEM EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DEL EDIFICIO TORRE 1, ADEMÁS DEL PROYECTOS DE VOZ Y DATOS, AUSE CONCLUYÓ CON EL RELLENO DEL GROUT EN EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE ALMA ABIERTA EN AZOTEA, ALA NORTE. C) SUPERVISIÓN INTERNA DEL PJEM INFORMA QUE SE REALIZARÁ EL DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE LA CASETA EN EL TRASPATIO A UN COSTADO DEL ELEVADOR DE JUECES. D) NUEVAMENTE SE INSTRUYE AL CONTRATISTA SPARTO A TERMINAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA (SISTEMA DE EMERGENCIAS SUPERVISIÓN EXTERNA INSTRUYE AL CONTRATISTA SPARTO A UTILIZAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA OBRA, CHALECO REFLEJANTE, CASCO Y CALZADO DE SEGURIDAD, CON LA INTENCIÓN DE EVITAR RIESGOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. F) NUEVAMENTE SE INSTRUYE AL CONTRATISTA SPARTO PREVEER EL PASO DE LAS INSTALACIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN POR LOSA DEL ALA NORTE ANTES DE REALIZAR EL RELLENO EN AZOTEA. G) LA CONTRATISTA SPARTO HIZO ENTREGA DE LAS PRUEBAS DE LIQUIDOS PENETRANTES EN REFUERZO ESTRUCTURAL DE SEGUNDO NIVEL, DEL ALA NORTE, RESULTANDO ACEPTABLES.

2) LA CONTRATISTA SPARTO HIZO ENTREGA DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO, QUE SE TOMARON EN PASILLO DE INTERNOS. RESULTANDO ACEPTABLES.

3) SUPERVISIÓN EXTERNA HIZO ENTREGA DE 20 MATRICES DE P.U. EXTRAORDINARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE A LA CONTRATISTA SPARTO.

4) INDICACIONES AL CONTRATISTA: COLOCAR SEÑALIZACIONES, CDNFINAR ZONAS DE TRABAJO, MANTENER LIMPIA LA OBRA, ASIGNACIÓN DE SITIOS ESTRATÉGICOS PARA EL ACOPIO DE MATERIAL Y PRODUCTO DE DEMOLICIÓN. EL PERSONAL DEBERÁ ASISTIR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE. SE INSTRUYE AL CDNTRATISTA A INCREMENTAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN MAQUINARIA, EQUIPO, Y PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

5) DE NUEVA CUENTA SUPERVISIÓN INTERNA DEL PJEM, INSTRUYE AL CONTRATISTA SPARTO CONCLUIR LOS DETALLES SOLICITADOS PARA EL ELEVADOR DE JUECES EN MINUTA DE TRABAJO No. 84 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


MONTO DEL CONTRATO:	\$ 14,996,226.33	CONVENIO ADICIONAL	\$ -
I.V.A.	\$ 2,399,396.21	I.V.A.	\$ -
TOTAL CONTRATO:	\$ 17,395,622.54	TOTAL CONVENIO ADICIONAL:	\$ -

SEMANA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RECURSOS					
HUMANOS		MATERIALES		EQUIPO	
CANT.	CATEGORIA	CANT. UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1.00	COORDINADOR	5.00 TON.	CEMENTO	4.00	CARRETILLAS
1.00	SUPERINTENDENTE	30.00 PZAS	TUBO CONDUIT 3/4"	2.00	LOTE DE HERRAMIENTAS
3.00	RESIDENTE	7.00 M3	ARENA	4.00	LOTE DE ANDAMIOS
24.00	ALBAÑALES	7.00 M3	GRAVA	5.00	ESCALERAS
4.00	ELECTRICISTAS	1.00 PZA	ELEVADOR	3.00	PLANTA DE SOLDAR
6.00	PAILEROS	6.00 M3	TEZONTLE	2.00	EQUIPO DE OXACETILENO
2.00	LIMPIEZA	30.00 M3	RETIRO MATERIAL	3.00	CORTADORAS
0.00	P.C.I.			2.00	RASTRILLO
2.00	PLOMEROS			5.00	PALAS
				2.00	TALADRO
				1.00	GENERADOR ELECT.
				1.00	ESMERIL
				5.00	PICOS
43.00	PERSONAS				

AVANCES DE OBRA FINANCIERO		
	SIN IVA	ANTICIPO
CONTRATADO	\$ 14,996,226.33	\$ 4,498,867.80
ESTIMADO	\$ 4,660,697.06	\$ 1,380,209.12
SALDO	\$ 10,395,529.27	\$ 3,118,658.78

AVANCES DE OBRA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FISICO		
	SEMANAL	ACUMULADO
PROGRAMADO	\$ 466,066.36	\$ 12,430,451.33
EJECUTADO	\$ 152,370.85	\$ 11,400,279.85
DIFERENCIA	\$ 313,695.51	\$ 1,030,171.49

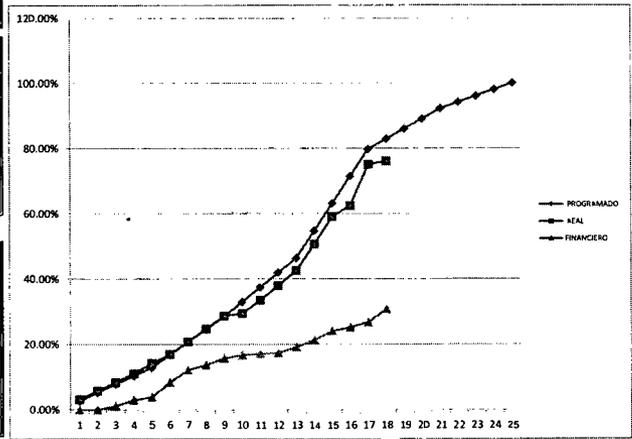

LA SUPERVISIÓN EXTERNA SAI REvisa, AVALA, Y ENTREGA A LA SUPERVISIÓN INTERNA LA ESTIMACIÓN No. 22 Y 23, DE LA CONTRATISTA SPARTO PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

2- SUPERVISIÓN EXTERNA SAI, REALIZÓ PRUEBAS DE LIQUIDOS PENETRANTES EN REFUERZO ESTRUCTURAL, Y RESULTADO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO F'c=250 KG/CM2, EN COLADO REALIZADO EN MURO DE PASILLO DE INTERNOS.

AVANCES DE OBRA SEMANAL No. 18 PROGRAMADO GLOBAL	
PROGRAMADO GLOBAL	82.87%
EJECUTADO	76.02%
RETRASO	-6.85% CDN RETRASO

OBSERVACIONES GENERALES


SE INSTRUYE AL CONTRATISTA A INCREMENTAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN MAQUINARIA, EQUIPO, Y FUERZA DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA: 28/09/2015



SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.

ING. PEDRO SARMIENTO BARRIOS
ADMINISTRADOR ÚNICO





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA

OBRA: ADECUACIÓN DE SALAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE1).

CONTRATO: PJ-LP-01-2015

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S.A. DE C.V.

SUPERVISIÓN: SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.

SAI
SARMIENTO Y ASOCIADOS
INGENIERÍA S.A. DE C.V.

INFORME No. 13

Periodo: DEL 2º AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015


REPORTE FOTOGRAFICO



SE REALIZA APLANADO EN MUROS DE PASILLO DE INTERNOS.




CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE Y REFUERZO ESTRUCTURAL.

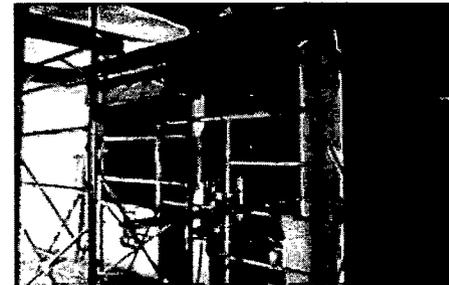

HABILITADO DE COLUMNA DE ACERO EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL EN ALA NORTE.



REFUERZO ESTRUCTURAL EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO TORRE 1, ALA NORTE.

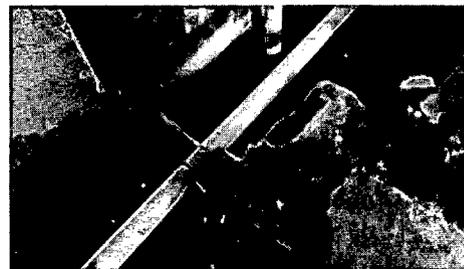

CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIAS PLUVIALES.




SE REALIZA FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA PARA ALCANZAR NIVELES.

FECHA:
28-sep-15

SAI
SARMIENTO Y ASOCIADOS
INGENIERÍA S.A. DE C.V.

SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.

ING. PEDRO SARMIENTO BARRIOS
ADMINISTRADOR ÚNICO





OBRA: ADECUACIÓN DE SALAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE1)
 CONTRATO: PJ-LP-01-2015



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
 CONSEJO DE LA JUDICATURA

SUPERVISIÓN: SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.


INFORME NO. 18

Período: DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRÁFICO




SE REALIZA FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA PARA ALCANZAR NIVELES.

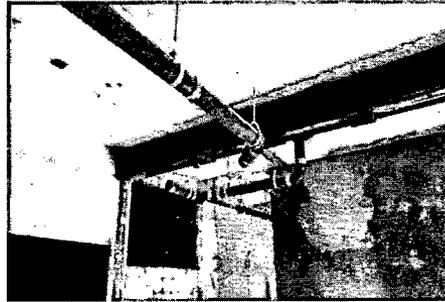

SE CONTINUAN COLOCANDO BAJADAS PLUVIALES DE FOFO Y PVC.



SE REALIZA PRUEBA HIDROSTATICA EN BAÑOS (ENTRE EJE "B-C 6-7") PLANTA BAJA ALA NORTE.

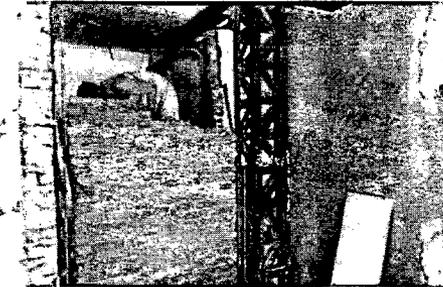

SE CONTINUAN REALIZANDO DETALLES DE ALBAÑILERIA EN PLANTA BAJA ALA NORTE (MUROS, CAENAS, APLANADOS, FIRMES, ETC.).



SE CONTINUAN CON DETALLES DE ALBAÑILERIA (MUROS DE TABIQUE, APLANADOS, ETC) EN ALA NORTE.




SE CONTINUA CON EL HABILITADO DE TUBERIA CONDUIT PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALA NORTE .

FECHA:
 28-sep-15



SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.

ING. PEDRO SARMIENTO BARRIOS
 ADMINISTRADOR ÚNICO



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	"ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE 1), SEGUNDA ETAPA"		
NÚMERO DE CONTRATO:	P.J-LP-01-2015		
EMPRESA O CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO, S.A. DE C.V.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	20/05/2015		
FECHA DE CONTRATO:	21/05/2015		
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL:	21/05/2015		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	21/05/20015 AL 16/11/2015		
FUENTE DE RECURSOS:	PRESUPUESTALES EJERCICIO 2015		

MONTO DEL CONTRATO:	\$ 14,996,226.33	CONVENIO ADICIONAL	\$ -	TOTAL OBRA (SIN I. V. A.)	\$ 14,996,226.33
I. V. A.	\$ 2,399,396.21	I. V. A.	\$ -	I. V. A.	\$ 2,399,396.21
TOTAL CONTRATO ORIGEN	\$ 17,395,622.54	TOTAL CONVENIO ADICION	\$ -	TOTAL OBRA:	\$ 17,395,622.54

ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	\$ 4,498,867.90
ANTICIPO CONVENIO ADICIONAL	\$ -


TOTAL ANTICIPO EJERCICIO	\$ 5,218,686.76	INCLUYE IVA
TOTAL ANTICIPO EJERCICIO	\$ -	INCLUYE IVA

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	No.	FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		AMORTIZACIÓN DE		ANTICIPO POR		SUB-TOTAL	L.V.A.	TOTAL DE OBRA CON		RETENCIONES		IMPORTE NETO
							ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA	ANTICIPO	AMORTIZAR	DESCUENTOS DE ANTICIPO	(2.20%)							
			1	140	21-may-15	ANTICIPO 30%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,498,867.90	\$ -	\$ -	\$ 4,498,867.90	\$ 719,818.86	\$ 5,218,686.76	\$ -	\$ -	\$ 5,218,686.76	
			2	152	18-jun-15	ESTIMACIÓN 1 NORMAL	\$ 164,231.40	\$ -	\$ 49,269.42	\$ 4,449,598.48	\$ 114,961.98	\$ 18,393.92	\$ 133,355.90	\$ 18,393.92	\$ 133,355.90	\$ 3,613.09	\$ -	\$ 129,742.81	
			3	153	18-jun-15	ESTIMACIÓN 2 NORMAL	\$ 277,540.09	\$ -	\$ 83,262.03	\$ 4,366,336.45	\$ 194,278.06	\$ 31,084.49	\$ 225,362.55	\$ 31,084.49	\$ 225,362.55	\$ 6,105.88	\$ -	\$ 219,256.67	
			4	161	01-jul-15	ESTIMACIÓN 3 NORMAL	\$ 126,083.37	\$ -	\$ 37,825.01	\$ 4,328,511.44	\$ 88,258.36	\$ 14,121.34	\$ 102,379.70	\$ 14,121.34	\$ 102,379.70	\$ 2,773.83	\$ -	\$ 99,605.86	
			5	169	09-jul-15	ESTIMACIÓN 4 NORMAL	\$ 671,362.34	\$ -	\$ 201,408.70	\$ 4,127,102.74	\$ 469,953.64	\$ 75,192.58	\$ 545,146.22	\$ 75,192.58	\$ 545,146.22	\$ 14,769.97	\$ -	\$ 530,376.25	
			6	179	03-ago-15	ESTIMACIÓN 5 NORMAL	\$ 574,215.33	\$ -	\$ 172,264.60	\$ 3,954,838.14	\$ 401,950.73	\$ 64,312.12	\$ 466,262.85	\$ 64,312.12	\$ 466,262.85	\$ 12,632.74	\$ -	\$ 453,630.11	
			7	180	03-ago-15	ESTIMACIÓN 6 NORMAL	\$ 229,524.68	\$ -	\$ 68,857.40	\$ 3,885,980.74	\$ 160,667.28	\$ 25,706.76	\$ 186,374.04	\$ 25,706.76	\$ 186,374.04	\$ 5,049.54	\$ -	\$ 181,324.50	
			8	181	03-ago-15	ESTIMACIÓN 7 V.A.	\$ 144,759.11	\$ -	\$ 43,427.73	\$ 3,842,553.00	\$ 101,331.38	\$ 16,213.02	\$ 117,544.40	\$ 16,213.02	\$ 117,544.40	\$ 3,184.70	\$ -	\$ 114,359.70	
			9	182	03-ago-15	ESTIMACIÓN 8 NORMAL	\$ 166,493.52	\$ -	\$ 49,948.06	\$ 3,792,604.95	\$ 116,545.46	\$ 18,647.27	\$ 135,192.73	\$ 18,647.27	\$ 135,192.73	\$ 3,662.86	\$ -	\$ 131,529.87	
			10	183	03-ago-15	ESTIMACIÓN 9 NORMAL	\$ 145,935.49	\$ -	\$ 43,780.65	\$ 3,748,824.30	\$ 102,154.84	\$ 16,344.77	\$ 118,499.61	\$ 16,344.77	\$ 118,499.61	\$ 3,210.58	\$ -	\$ 115,289.03	
			11	184	06-ago-15	ESTIMACIÓN 10 NORMAL	\$ 52,468.36	\$ -	\$ 15,740.51	\$ 3,733,083.79	\$ 36,727.85	\$ 5,876.46	\$ 42,604.31	\$ 5,876.46	\$ 42,604.31	\$ 1,154.30	\$ -	\$ 41,450.01	
			12	186	11-ago-15	ESTIMACIÓN 11 NORMAL	\$ 46,122.68	\$ -	\$ 13,836.80	\$ 3,719,246.99	\$ 32,285.88	\$ 5,165.74	\$ 37,451.62	\$ 5,165.74	\$ 37,451.62	\$ 1,014.70	\$ -	\$ 36,436.92	
			13	187	21-ago-15	ESTIMACIÓN 12 NORMAL	\$ 72,887.42	\$ -	\$ 21,866.23	\$ 3,697,380.76	\$ 51,021.19	\$ 8,163.39	\$ 59,184.58	\$ 8,163.39	\$ 59,184.58	\$ 1,603.52	\$ -	\$ 57,581.06	
			14	187	21-ago-15	ESTIMACIÓN 13 V.A.	\$ 96,630.39	\$ -	\$ 28,989.12	\$ 3,668,391.65	\$ 67,641.27	\$ 10,822.60	\$ 78,463.87	\$ 10,822.60	\$ 78,463.87	\$ 2,125.87	\$ -	\$ 76,338.00	
			15	189	21-ago-15	ESTIMACIÓN 14 NORMAL	\$ 95,570.26	\$ -	\$ 28,671.08	\$ 3,639,720.56	\$ 66,899.18	\$ 10,703.87	\$ 77,603.05	\$ 10,703.87	\$ 77,603.05	\$ 2,102.55	\$ -	\$ 75,500.50	
			16	195	01-sep-15	ESTIMACIÓN 15 NORMAL	\$ 317,054.67	\$ -	\$ 95,116.40	\$ 3,544,604.16	\$ 221,938.27	\$ 35,510.12	\$ 257,448.39	\$ 35,510.12	\$ 257,448.39	\$ 6,975.20	\$ -	\$ 250,473.19	
			17	196	02-sep-15	ESTIMACIÓN 16 NORMAL	\$ 397,215.33	\$ -	\$ 119,164.60	\$ 3,425,439.56	\$ 278,050.73	\$ 44,488.12	\$ 322,538.85	\$ 44,488.12	\$ 322,538.85	\$ 8,738.74	\$ -	\$ 313,800.11	
			18	197	02-sep-15	ESTIMACIÓN 17 V.A.	\$ 22,056.79	\$ -	\$ 6,617.04	\$ 3,418,822.52	\$ 15,439.75	\$ 2,470.36	\$ 17,910.11	\$ 2,470.36	\$ 17,910.11	\$ 485.25	\$ -	\$ 17,424.86	
			19	198	08-sep-15	ESTIMACIÓN 18 NORMAL	\$ 130,200.70	\$ -	\$ 39,060.21	\$ 3,379,762.31	\$ 91,140.49	\$ 14,582.48	\$ 105,722.97	\$ 14,582.48	\$ 105,722.97	\$ 2,864.42	\$ -	\$ 102,858.55	
			20	199	08-sep-15	ESTIMACIÓN 19 V.A.	\$ 34,194.58	\$ -	\$ 10,258.37	\$ 3,369,503.94	\$ 23,936.21	\$ 3,829.79	\$ 27,766.00	\$ 3,829.79	\$ 27,766.00	\$ 752.28	\$ -	\$ 27,013.72	
			21	202	15-sep-15	ESTIMACIÓN 20 NORMAL	\$ 199,006.70	\$ -	\$ 59,702.01	\$ 3,309,801.93	\$ 139,304.69	\$ 22,288.75	\$ 161,593.44	\$ 22,288.75	\$ 161,593.44	\$ 4,378.15	\$ -	\$ 157,215.29	
			22	203	15-sep-15	ESTIMACIÓN 21 V.A.	\$ 49,263.41	\$ -	\$ 14,779.02	\$ 3,295,022.91	\$ 34,484.39	\$ 5,517.50	\$ 40,001.89	\$ 5,517.50	\$ 40,001.89	\$ 1,083.80	\$ -	\$ 38,918.09	
			23	207	23-sep-15	ESTIMACIÓN 22 NORMAL	\$ 560,581.74	\$ -	\$ 168,174.52	\$ 3,126,848.39	\$ 392,407.22	\$ 62,785.16	\$ 455,192.38	\$ 62,785.16	\$ 455,192.38	\$ 12,332.80	\$ -	\$ 442,859.58	
			24	208	23-sep-15	ESTIMACIÓN 23 V.A.	\$ 27,298.70	\$ -	\$ 8,189.61	\$ 3,118,658.78	\$ 19,109.09	\$ 3,057.45	\$ 22,166.54	\$ 3,057.45	\$ 22,166.54	\$ 600.57	\$ -	\$ 21,565.97	
			25																
			26																
			SUB-TOTALES 2015					\$ 4,600,697.06	\$ 1,380,209.12		\$ 7,719,355.84	\$ 1,235,096.94	\$ 8,954,452.75	\$ 1,235,096.94	\$ 8,954,452.75	\$ 101,215.34	\$ -	\$ 8,853,237.41	

CÉDULA DE CONTROL SIN VALIDEZ

SUB-TOTALES 2016

GRAN TOTAL 2015	\$ 4,600,697.06	\$ 1,380,209.12	\$ 7,719,355.84	\$ 1,235,096.94	\$ 8,954,452.75	\$ 101,215.34	\$ 8,853,237.41
I.V.A.	\$ 736,111.53						
TOTAL CON I.V.A.	\$ 5,336,808.59						
SALDO	\$ 12,058,813.95						
SALDO POR EJERCER	\$ 8,441,169.78						



28	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TEGUAMAC, MÉXICO.			0.00%	0.00%	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	SE REALIZA EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
----	--	--	--	-------	-------	--------------	--------	--------	--

PRESUPUESTADO	CONTRATADO	EJERCIDO
\$7,610,800.00	\$23,151,326.90	\$12,042,256.73
TOTAL		

