



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 07 de Febrero de 2017, estando presentes por parte de la empresa TECOPSA TERRACERIAS, CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS S.A de C.V. el C. Luis Paniagua Saucedo, Administrador Único de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **Construcción de Guarniciones y Banquetas de la calle Luis Donaldo Coloso, de Calzada del Pacifico a Calle sin nombre (al Sur) Delegación Capultitlan, Capultitlan.** Adjudicada a la empresa, **TECOPSA TERRACERIAS, CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS S.A. de C.V.** bajo el amparo del contrato HATOP-AD-FEFOM-16-075

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

Construcción de Guarniciones y Banquetas de la calle Luis Donaldo Coloso, de Calzada del Pacifico a Calle sin nombre. (al Sur), Delegación Capultitlan, Capultitlan.

TERRACERIAS: SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, LOS MATERIAL SOBREPANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA LA CARGA Y EL ACARREO A TIRO LIBRE: EL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE EJECUTO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COLOCACION Y EL AFINE Y COMPACTACION CON PIZON DE MANO Y BALLARINA MECANICA INCLUYE RIEGO DE AGUA CON UN PROCESO DE CAPAS DE 20CMS. HABILITADO PARA RECIBIR LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 LONGITUD DE 534.24ML. Y GUARNICIONES DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 15X20X25, CON UNA LONGITUDE 66.25ML. SE CONSTRUYERON BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150K/CM2 DE UN ESPESOR DE 8CMS. LONGITUD DE 590.22ML. BANQUETA DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE FC=200K/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR LONGITUD TOTLA 214.44ML. SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

www.toluca.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Importe contractual \$540,939.55

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$ 540,938.14

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
31 de Agosto 2016

Fecha de término
Contractual 14 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 45 días

Fecha de inicio Real:
31 de Agosto de 2016

Fecha de término
Real: 14 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 45 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$540,939.55

Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: \$540,939.55

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	31/08/2016	14/10/2016	Contrato	\$393,141.91	\$393,141.91	\$147,797.64	\$101,674.63	\$101,674.63	\$38,223.53
002 FINICION	31/08/2016	14/10/2016		\$147,796.23	\$540,938.14	\$1.41	\$38,223.53	\$139,898.16	\$0.00

Saldo a cancelar : \$ 1.41

Total Ejercido: \$ 540,938.14

www.toluca.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Datos de la estimación final

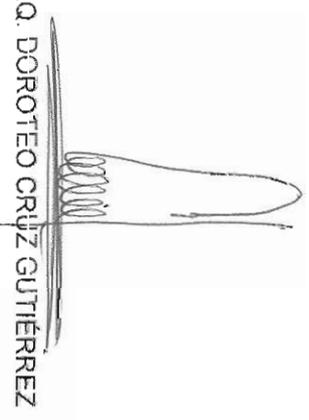
Monto de contrato c/iva: \$540,393.55 Fondo de Convenio c/iva: N/A Monto total contratado c/iva: \$540,393.55

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
D02 FINQUIT	31/08/2016	14/10/2016	Contrato	\$147,796.23	\$147,796.23	\$1.41	\$38,223.53	\$139,898.16	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.


C. LUIS PANIAGUA SAUCEDO

Administrador Único de la Empresa
TECOPSA TERRACERIAS, CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS S. A de C.V.


ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ

Supervisor de obra
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA
