



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO



**ACTA CONSTITUTIVA DEL
COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA
PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL**

En la localidad de CONSTITUCIÓN DE 1917 Municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México, siendo las 10:00 hrs. Del día 21 del mes de SEPTIEMBRE 2010 en PLAZA CONSTITUCIÓN DE 1917, MAYARIT, se reunieron: La Coordinación de Construcción y Supervisión de Obras el C. JAVIER VARGAS ESPINOSA y por la Controlaría Interna el C. HECTOR E AGUILAR PAUCÓN con el propósito de informar a la comunidad sobre la obra o acción que el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, llevará a cabo, y constituir el **Comité Ciudadano de Control y Vigilancia** que la supervise. Acto seguido los representantes de la Coordinación de Construcción y Supervisión de Obras, informan a los vecinos presentes que la obra o acción programada en beneficio de los habitantes de esta localidad consiste en:

REMODELACIÓN DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

Ubicada en: PLAZA CONSTITUCIÓN DE 1917, EN MAYARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

Con un monto TOTAL \$ 346,384.11

Obra o acción que será ejecutada por contrato bajo la modalidad de:

ADJUDICACION DIRECTA CONCURSO SIMPLIFICADO LICITACION PUBLICA

Otra; Especifique: POR ADMINISTRACIÓN

Los recursos que se aplicarán a la obra serán aportados en su totalidad por el Municipio de Tlalnepantla de Baz.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlalnepantla de Baz
2009-2012



"2010. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

Tlalnepantla de Baz, a 05 de julio de 2010.

OFICIO No. SBA/DAAC/330/10

ING. REYNALDO GASCA JAIME,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE.

Por instrucciones del Licenciado Jorge Armando Chávez Enríquez, Secretario del Ayuntamiento, adjunto remito a usted copias certificadas del acuerdo tomado por el cuerpo edilicio, durante el desarrollo del segundo punto del Orden del día en la **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo**, de fecha 02 de julio del año en curso, a saber:

- Acuerdo por el que el Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, aprueba las modificaciones al Programa de Obra Pública Anual (POA) para el Ejercicio Fiscal 2010.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. JOSÉ FRANCISCO LOZADA CHÁVEZ,
SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.



c.c.p.- Lic. Arturo Ugalde Meneses, Presidente Municipal Constitucional.- Para su superior conocimiento.
c.c.p.- Lic. Jorge Armando Chávez Enríquez, Secretario del Ayuntamiento.- Presente.
c.c.p.- Archivo/Minutario
JACHE/JFLCH/fmsr

AL CONTESTAR CÍTESE LA DEPENDENCIA Y EL NÚMERO DE OFICIO
Palacio Municipal.
Plaza Df. Gustavo Baz s/n, Tlalnepantla Centro, Edo. de Méx., C.P. 54000
Tel: 5366-38-00 Ext: 3750
www.tlalnepantla.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO: NÚMERO: S.M. 2109/2010

- - - EL LICENCIADO JORGE ARMANDO CHÁVEZ ENRÍQUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 91, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE.-----

C E R T I F I C A-----

QUE EN LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE TOMÓ EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 32, 33, 35, DE LA LEY DE LA COORDINACIÓN FISCAL; 5, DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN; 113, 116, 122, 125, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 2, 27, Y 31, FRACCIONES XVIII, XXI, XXXIII Y XLIV, 112, FRACCIONES VII Y VIII, 113-A AL 113-H, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN LA DÉCIMA SECCIÓN DE LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2010; EL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y EXPIDE EL SIGUIENTE ACUERDO: PRIMERO. SE APRUEBA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), EN LAS 27 ÁREAS GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS (AGEB'S) DE ALTA Y MUY ALTA MARGINALIDAD, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), EN SU ESTUDIO DENOMINADO ÍNDICE DE MARGINACIÓN URBANA 2005, MISMAS QUE COINCIDEN CON EL ESTUDIO REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DE TLALNEPANTLA DE BAZ, DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ACUERDO. SEGUNDO. SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL (POA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:-----

PROGRAMA.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)-----
SE MODIFICA EL NÚMERO E IMPORTE DE OBRAS DE LOS SIGUIENTES SUBPROGRAMAS:--

- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.- SE REDUCE DE 51 A 13 OBRAS Y DE \$30'081,389.00 A \$14'428,330.33-----
- SE CANCELA EL SUBPROGRAMA MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES POR UN IMPORTE DE \$17'000,000.00-----
- SE INCREMENTA EL SUBPROGRAMA "INDIRECTOS" DE \$ 2'120,661.09 A \$3'534,435.15--
- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.- SE INCREMENTA DE 13 A 19 OBRAS Y DE \$18'012,548.30 A \$49'585,572.90-----



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO: S.M. 2109/2010

(2)

PROGRAMA.- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (REP)-----

• SE INCREMENTA DE \$11'200,000.00 A \$11'315,300.00-----

PROGRAMA.- HABITAT-----

• SE REDUCE EL NÚMERO DE OBRAS DE 23 A 20 Y, SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO
AUTORIZADO DE \$32'000,000.00 A \$34'918,824.00.-----

PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM):-----

• SE REDUCE LA CANTIDAD DE PROYECTOS Y EL IMPORTE DEL SUBPROGRAMA
PROYECTOS EJECUTIVOS DE 11 A 8 Y DE \$21'636,204.20 A \$13'536,204.20.-----

• SE ADICIONA EL SUBPROGRAMA MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES POR UN MONTO
DE \$8'100,000.00-----

• EN EL SUBPROGRAMA "INFRAESTRUCTURA CULTURAL" SE INCREMENTA EL NÚMERO
DE OBRAS DE 3 A 4 Y DE \$4'347,500.00 A \$6'224,412.91-----

• SE ADICIONA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON IMPORTE DE
\$2'888,571.00-----

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE INCREMENTA EL POA DEL EJERCICIO 2010, EN
\$5'922,695.00 SEGÚN LO SIGUIENTE:-----

RECURSOS FEDERALES REP 2010 SEGÚN POA-----\$11'200,000.00-----

RECURSOS ASIGNADOS-CONCERTADOS CON SEDESOL-----\$11'315,300.00-----

DIFERENCIA-----\$115,300.00-----

RECURSOS FEDERALES HABITAT SEGÚN POA-----\$32'000,000.00-----

RECURSOS ASIGNADOS-CONCERTADOS-----\$34'918,824.00-----

DIFERENCIA-----\$2'918,824.00-----

RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE-----

EDUCACIÓN PÚBLICA-----\$2'888,571.00-----

DIFERENCIA-----\$2'888,571.00-----

TOTAL-----\$5'922,695.00-----

POR LO QUE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL (POA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, SE MODIFICA DE \$342'568,211.30 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 30/100 M.N.) A \$348'490,906.30 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.); APROBÁNDOSE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ACUERDO. TERCERO. SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO CONCRETO, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO. CUARTO. RESPECTO AL PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO HÁBITAT, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$5'310,000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SERÁN APLICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ACCIONES SOCIALES Y UN IMPORTE TOTAL DE \$34'918,824.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES -----



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO: S.M. 2109/2010

(3)

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 008/100 M. N.) DE RECURSOS FEDERALES, MUNICIPALES Y ESTATALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ASÍ COMO DEL PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES POR UN MONTO DE \$2'800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), QUE SERÁN APLICADOS A ACCIONES SOCIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y UN IMPORTE TOTAL DE \$11'315,300.00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DE RECURSOS FEDERALES, MUNICIPALES Y ESTATALES, QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LOS OFICIOS NÚMEROS DGDS/0694/2010 Y DGDS/0695/2010 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2010, QUE FORMAN PARTE COMO ANEXO DEL PRESENTE ACUERDO, Y QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN: -----

1.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT-----

APORTACIÓN	ACCIONES SOCIALES	OBRAS	TOTAL
FEDERAL	\$2'655,000.00	\$17'345,000.00	\$20'000,000.00
MUNICIPAL	\$2'655,000.00	\$17'458,524.00	\$20'113,524.00
ESTATAL		\$ 115,300.00	\$ 115,300.00
TOTAL	\$5'310,000.00	\$34'918,824.00	\$40'228,824.00

2.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES SOCIALES-----

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ACCIONES SOCIALES
<ul style="list-style-type: none"> • PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DECARGAS DE DRENAJE EN LOS POLÍGONOS: 15272 Y 15275 • PAVIMENTACIÓN EN LOS POLÍGONOS: 15261 Y 15263 	<ul style="list-style-type: none"> • CAMPAÑAS ENTREGA DE APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS • CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE BELLEZA Y ELABORACIÓN DE UÑAS • ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES • ELABORACIÓN DE PLAN • ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS-----

APORTACIÓN	ACCIONES SOCIALES	OBRAS	TOTAL
FEDERAL	\$1'400,000.00	\$5'600,000.00	\$7'000,000.00
MUNICIPAL	\$1'400,000.00	\$5'600,000.00	\$7'000,000.00
ESTATAL		\$ 115,300.00	\$ 115,300.00
TOTAL	\$2'800,000.00	\$11'315,300.00	\$14'115,300.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA MUNICIPAL
OFICIO: NUMERO: S.M. 2109/2010

(4)

2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES SOCIALES

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ACCIONES SOCIALES
<ul style="list-style-type: none">• PARQUE PÚBLICO JORGE JIMÉNEZ CANTÚ• MÓDULO PREP LOS ÁNGELES• PARQUE RECREATIVO SAN ISIDRO IXHUATEPEC• PARQUE HIDALGO "PLAZA TEMÁTICA"• EDÉN EN EL CAMELLÓN INDEPENDENCIA• PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES• PARQUE LINEAL PROLONGACIÓN CIEN METROS• PARQUE LINEAL ALFREDO DEL MAZO	<ul style="list-style-type: none">• 62 TALLERES: FORTALECIMIENTO DE VALORES, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, FOMENTO A UNA CULTURA DE LA DENUNCIA, RISOTERAPIA Y CUENTACUENTOS, ENTRE OTROS• 10 EVENTOS ARTÍSTICOS• 10 EVENTOS DE PREVENCIÓN• 8 EVENTOS DEPORTIVOS• PLAN DE ACTUACIÓN

QUINTO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DÍA DE SU APROBACIÓN. LEVANTADO EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CUATRO FOJAS ÚTILES, ESCRITAS SÓLO POR EL ANVERSO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, PARA LOS TRÁMITES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ARMANDO CHÁVEZ ENRIQUEZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNEPANTLA DE



SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO

JACHE/JF/CH/grc*



H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalnepantla de Baz
2009-2012

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

"2010. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

, 25 de junio del 2010

Para: Ing. Reynaldo Gasca Jaime
Director General de Obras Públicas

De: Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe del Departamento de Obras por Administración

Pongo a su consideración los materiales y costos para el mes de julio, los cuales cubrirían las eventualidades y/o compromisos de las giras del C. Presidente Municipal Constitucional, Lic. Arturo Ugalde Menes.

Cabe hacer mención que se encuentran incluidos los insumos necesarios para la remodelación de la Plaza Bicentenario, ubicada en la colonia Constitución de 1917

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
CEMENTO	TON.	80	\$182,620.00
ARENA	M3	120	\$29,670.00
GRAVA	M3	150	\$49,162.50
VARILLA DE 3/8"	PZAS	80	\$6,320.00
ALAMBRO DE 1/4"	KG	80	\$1,440.80
ALAMBRE RECOCIDO	KG	100	\$1,958.00
TEJA TIPO COLONIAL	PZAS.	1300	\$29,900.00
PINTURA VINILICA	LTS.	125	\$4,000.00
PINTURA EN POLVO PARA CONCRETO	BULTOS	284.5	\$16,501.00
CIMBRA	M2	80	\$1,472.00
TABIQUE ROJO RECOCIDO	PZAS.	5000	\$15,000.00
TEPETATE	M3	56.84	\$3,410.40
CLAVOS DE 2"	KG	20	\$320.00
CLAVOS DE 2 1/2"	KG	20	\$360.00
CLAVOS DE 4"	KG	20	\$400.00
MALLA ELECTROSOLDA	ROLLOS	12	\$9,600.00
TAZAS Y LAVABOS PARA BAÑOS CON ACCESORIOS	PZAS	3	\$6,600.00
DISCO COPA TURBO DE 4" PARA PULIR BANCAS DE MARMOL	PZAS	10	\$19,803.00
SUBTOTAL			\$378,537.70

IMPORTE TOTAL DE MATERIAL
IMPORTE TOTAL DE MANO DE OBRA
COSTO TOTAL DE LA OBRA

\$378,537.70

\$120,000.00

\$498,537.70

Atentamente,

c.c.p.- Archivo/minutario
JIDZ/faby**

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel. 5366-3927





**H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalnepantla de Baz
2009-2012**

4
**DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION**

"2010. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

27 de julio del 2010.
DGOP/SC/2020/10

C. Javier Vargas Espinoza
Supervisor de Obra del Municipio de
Tlalnepantla de Baz.
Presente.

Con fundamento en los artículos 218 y 219 del REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, le informo que ha sido asignada como Supervisor de Obra **"Construcción de Plaza Cívica (plaza Bicentenario), en calle Nayarit entre Laredo y San Luis Potosí en la colonia Constitución de 1917"**, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, la cual se realizará al amparo de la obra No. DGOP/SC-adm/O-0037-10; para llevar a cabo las actividades referidas en el artículo citado, así como para todas aquellas definidas en el Manual de Procedimientos de la DGOP.

Es importante señalar que, por estar fuera de sus atribuciones, queda estrictamente prohibida la autorización de material, para ejecutar cualquier trabajo que no esté claramente soportado por los conceptos incluidos y en otra obra que no sea la correspondiente.

Asimismo, es de suma importancia que para el control permanente de la bitácora de obra, deberá contener intrínseco de obra; en estos términos verificar la aplicación de la normatividad, especificaciones aplicables y demás documentos que garanticen la correcta ejecución de la obra. Cabe hacer mención que deberá incluir los avances físicos, la fuerza de trabajo asignada a la obra y todos aquellos factores externos que alteren el avance y calidad de la obra, incluyendo el clima, serán consignados en el libro en mención.


Atentamente,

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

[Firma]
c.c.p. -Ing. Reynaldo Gasca Jaime, Director General de obras Públicas. Para su conocimiento.
c.c.p.- Ing. José Israel Domínguez Zavala.- Jefe del Departamento de Obras por Administración.
c.c.p.-Archivo/Minutario
MAMD/JIDZ/faby**

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel. 5366-3927





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



OBRA:	DGOP/SC-Adm/O-0037-10
COMUNIDAD:	CONSTITUCION DE 1917
UBICACION:	NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA

PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS (POA)	X
OFICIO DE AUTORIZACION DE CABILDO DEL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	X

No.	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE TECNICO
-----	---

INICIO

1	PETICION DE OBRA	
2	ACUERDO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	X
3	PERMISOS Y LICENCIAS	X
4	COCICOVI	NO APLICA
5	FICHA TECNICA	X
6	GENERADOR DE OBRA DE INICIO	X
7	PROYECTO DE OBRA DE INICIO	X
8	TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS	X
9	PRESUPUESTO DE OBRA DE INICIO	X
10	PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DE INICIO	X
11	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE INICIO	X
12	NORMAS Y ESPECIFICACIONES	X
13	FOTOS DE INICIO	NO APLICA

TERMINO

14	ESTUDIO DE PREINVERSION	NO APLICA
15	INFORME DE SUMINISTRO DE MATERIALES	X
16	VALES DE SALIDA DE MATERIALES	X
17	PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (TERMINO)	X
18	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (TERMINO)	X
19	BITACORA DE OBRA	X
20	GENERADOR DE OBRA DE APLICACION	X
21	PROYECTO DE OBRA DE APLICACION	X
22	CATALOGO DE CONCEPTOS DE APLICACION	X
23	PRESUPUESTO DE OBRA DE TERMINO	NO APLICA
24	FOTOGRAFIAS (PROCESO Y TERMINO DE OBRA)	X
25	ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE LOS TRABAJOS	X
26	OFICIO DE INVITACION DE TERMINO DE OBRA	NO APLICA
27	REGISTRO DE RECURSOS HUMANOS	X
28	REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	X
29	ACTA DE TERMINO - RECEPCION DE OBRA	X
30	INFORME A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CONCLUSION DE LAS OBRAS	NO APLICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MEXICO



Con fundamento en los Artículos 113, 113A, 113B, 113C, 113D, 113E, 113F, 113G, 113H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se procede a constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, para supervisar la obra o acción mencionada, el cual estará integrado por un Contralor Social, un Subcontralor Social "A" y un Subcontralor Social "B". Efectos democráticamente de entre los vecinos asistentes a la asamblea que no sean dirigentes de organizaciones políticas ni servidores públicos, y cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes.

CLASULAS

PRIMERA: El Comité de Control y Vigilancia es un órgano auxiliar de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, cuyo objetivo es la supervisión de la obra o acción que se describen en el cuerpo de esta Acta Constitutiva.

SEGUNDA: Para el cumplimiento de su objetivo el Comité tiene las siguientes funciones:

- I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo al Expediente Técnico y dentro de la normatividad correspondiente.
- II. Participar como observador en los procesos o actos administrativos relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra.
- III. Hacer visitas de inspección a la obra o acción y llevar registro de lo observado en la bitácora.
- IV. Verificar que la calidad de la obra o acción sea la que señale el Expediente Técnico.
- V. Hacer del conocimiento de la autoridades correspondientes las irregularidades que observe durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de la sobras sujeto de supervisión.
- VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de la obra.
- VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras o acciones informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones.
- VIII. Promover el buen uso y el adecuado mantenimiento de la obra, ante las Autoridades Municipales.
- IX. Coadyuvar con la Contraloría Municipal en la vigilancia de las obligaciones de proveedores contratistas relacionados con la obra o acción



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO



TERCERA: Las funciones encomendadas al Comité, podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros, de manera individual o conjunta, y podrán auxiliarse e los otros vecinos directamente beneficiados, pero la representación de la comunidad en los asuntos relacionados con la supervisión de las mismas les corresponderá exclusivamente a ellos.


CUARTA: Serán funciones específicas de cada uno de los miembros del Comité, las siguientes cláusulas:

DEL CONTROL SOCIAL, Organizar las inspecciones de la obra, convocando a los otros miembros del Comité y solicitar al órgano ejecutor el expediente técnico.
DEL SUBCONTROL SOCIAL "A": Registrar en bitácora las observaciones que detecten en el recorrido e integrar el archivo con toda la documentación generada en la supervisión.
DEL SUBCONTROL SOCIAL "B": Informar periódicamente a los vecinos, el resultado de a supervisión y avance de la obra, irregularidades detectada, etc; y apoyar a los otros integrantes del Comité en la realización de sus funciones.

QUINTA: El Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra. Para convocar a asamblea, se requiere la solicitud de un mínimo de la tercera parte de ellos o, a juicio del Comité, cuando existan puntos importantes que tratar, siendo requisito indispensable dar aviso con 24 horas de anticipación.

SEXTA: El Cocicovi, informará periódicamente a los vecinos beneficiarios con el Programa de la obra, de los resultados de sus trabajos de supervisión, así como de cualquier asunto relacionado con el suministro y aplicación de los materiales.

SEPTIMA: El Cocicovi, no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades en su carácter de controladores sociales, salvo las que expresamente se señalan en la cláusula segunda de esta acta constitutiva.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MEXICO



CLAVE: DGOF/SC-Adm/O-0037-10

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la asamblea constitutiva del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de la obra: Reconstrucción de Plaza Cívica (Plaza Bicentenario), de la localidad: Constitución, de 1913 siendo las 10:30 hrs. Del mismo día, mes y año, firmando de conformidad los participantes en el acto.

Supervisor

Nombre y Firma
Luis Jorge Espinoza

POR LA CONTRALORIA INTERNA

Firma
Hector E. Aguilar Paredes

Auditor

H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalinepantla de Baz

2009-2012

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

"2010 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO"

07 de Septiembre del 2010
DGOP/DOPA/SC/2440/2010

C. ANGEL CARLOS MENDOZA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Adjunto 10 expedientes de Obras por Administración por iniciar en la Zona Oriente así como 20 de la Zona Poniente de este Municipio, con recurso (PIM - 2010), para la integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOV), expedientes que incluyen.

- Catálogo de conceptos
- Ficha técnica
- Programa de Obra
- Plano Arquitectónico

CONS.	CLAVE DE OBRA	COMUNIDAD	UBICACION	DESCRIPCION	SUPERVISOR
-------	---------------	-----------	-----------	-------------	------------

ZONA ORIENTE

1	DGOP/SC-ADM/O-0037-10	CONSTRUCCIÓN DE 1917	CALLE NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)	C. JAVIER VARGAS ESPINOZA
2	DGOP/SC-ADM/O-0038-10	DIVISION DEL NORTE	AV. EMILIANO ZAPATA CDA. DE	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL CONSEJO	TEC. JORGE CUEVAS ALVAREZ
3	DGOP/SC-ADM/O-0039-10	DIVISION DEL NORTE	GIMNASIO	PLANCHA DE CONCRETO	TEC. JORGE CUEVAS ALVAREZ
4	DGOP/SC-ADM/O-0040-10	LA LAGUNA	GIMNASIO	PLANCHA DE CONCRETO	TEC. JORGE CUEVAS ALVAREZ
5	DGOP/SC-ADM/O-0041-10	LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN	EXPLORADORES DE OCCIDENTE ENTRE ALPINO TIZOC Y GAVILANES	CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, BANQUETA Y ESCALÓN	TEC. BERNARDO CASTRO GARRIDO
6	DGOP/SC-ADM/O-0042-10	LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN	EXCURSIONISTAS DEL D.F. Y GAVILANES ENTRE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, ESCALONES Y DESCANSOS	TEC. JORGE CUEVAS ALVAREZ
8	DGOP/SC-ADM/O-0043-10	LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN	ANAPURNA ENTRE GLACIAL Y LIMITE URBANO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESCALONADA	TEC. BERNARDO CASTRO GARRIDO
9	DGOP/SC-ADM/O-0046-10	MARINA NACIONAL	AV. NECAXA ENTRE AV. FERROCARRIL	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	C. JAVIER VARGAS ESPINOZA
20	DGOP/SC-ADM/O-0047-10	MARINA NACIONAL	GIMNASIO	PLANCHA DE CONCRETO	C. JAVIER VARGAS ESPINOZA

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalinepantla Centro.

"2010 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO"

ZONA PONIENTE

1	DGOP/SC-Adm/P-0089-10	U.H. LOMA ESCONDIDA	COLINDANTE CON CONDOMINIO CEYLAN	REPARACIÓN DE BARDA	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
2	DGOP/SC-Adm/P-0091-10	U.H. LOMA ESCONDIDA	ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD	PLANCHA DE CONCRETO	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
3	DGOP/SC-Adm/P-0072-10	MIGUEL HIDALGO	CALLE ABAZOL, AV. HIDALGO Y PROLONGACIÓN GALEANA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
4	DGOP/SC-Adm/O-0046-10	21 DE MARZO	CALLE RAMON CORONA	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
5	DGOP/SC-Adm/P-0061-10	LA COMUNIDAD	ATRAS DE LA F.E.S. IXTACALA	TROTAPISTA	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
6	DGOP/SC-Adm/P-0065-10	LA SIDERAL	CALLE ACUARIO ENTRE MERCURIO Y ALFA CENTAURO	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
7	DGOP/SC-Adm/P-0066-10	LA SIDERAL	CALLE ALFA CENTAURO, MARTES, MERCURIO, ACUARIO Y VIA LACTEA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
8	DGOP/SC-Adm/P-0051-10	CHALMA LA UNION	PROLONGACIÓN CALLE 4	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
9	DGOP/SC-Adm/P-0082-10	SAN JOSE PUENTE DE VIGAS	AV. LOPEZ MATEOS, PRESIDENTE JUAREZ Y CDA. DE HIDALGO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
10	DGOP/SC-Adm/P-0083-10	SAN PABLO XALPA	CALLE INDEPENDENCIA	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
11	DGOP/SC-Adm/P-0092-10	XOCOYAHUALCO	AV. DEL TRABAJO, IRO. DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. HIDALGO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ARQ. CLAUDIA DELGADILLO TORRES
12	DGOP/SC-Adm/P-0054-10	EL OLIVO I	CALLE LIMON S/N, ESQ. BENITO JUAREZ	REHABILITACION DE TECHUMBRE	C. OSCAR BAZAN MARTINEZ
13	DGOP/SC-Adm/P-0076-10	PARAJES	AV. DEL TRABAJO, ESQ. CALLE LERMA	APLANADO FINO	C. OSCAR BAZAN MARTINEZ
14	DGOP/SC-Adm/P-0077-10	REFORMA URBANA	CALLE RETORNO MUNICIPIO LIBRE	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO	C. OSCAR BAZAN MARTINEZ
15	DGOP/SC-Adm/P-0085-10	SANTA MARIA TLAYACAMPA	CALLE EMILIANO ZAPATA Y 1RA. CERRADA DE ZAPATA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ESCALONES	C. OSCAR BAZAN MARTINEZ
16	DGOP/SC-Adm/P-0048-10	AMPLIACIÓN PIRULES	LIMITE DE LA COLONIA PIRULES Y ROBLES PATERA	REMOZAMIENTO DE MURO	C. CARLOS BAUTISTA AGUILAR
17	DGOP/SC-Adm/P-0050-10	BENITO JUAREZ TEQUEXQUINHUAC	CALLE MIGUEL ALEMAN ESQ. GRAN VIA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN	C. CARLOS BAUTISTA AGUILAR
18	DGOP/SC-Adm/P-0068-10	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	LATERAL SUR DE AV. DE LOS MAESTROS	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN	C. CARLOS BAUTISTA AGUILAR

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, C.P. 54000, Tel. 5366-3927




Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel. 5366-3927

c.p. Lic. Juan Carlos Pérez Saavedra - Subsecretario de Gobierno
c.p. Ing. Reynaldo Gasca Jaime - Director General de Obras Públicas
c.p. Ing. Jorge Barajas Sánchez - Subdirector de Evaluación y Control
c.p. Ing. José Israel Domínguez Zavala - Jefe del Departamento de Obras por administración.
c.p. Archivo / minutarlo

[Handwritten signature]

Municipio de compromisos

TLALNEPANTLA DE BAZ




ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ATENCIÓN

Agradeciendo la atención que sirva dar al presente, me despido de Usted.

20	DGOP/SC-Adm/P-0079-10	RIO SAN JAVIER	PARQUE LINEL RIO SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN DE MURO, BANQUETA Y GUARNICIÓN	C. CARLOS BAUTISTA AGUILAR
19	DGOP/SC-Adm/P-0080-10	ROBLES PATERA	CERRO DE LA MALINCHE	RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO Y REHABILITACIÓN DE ADOQUIN	C. CARLOS BAUTISTA AGUILAR

"2010 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO"





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLAXEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CALENDARIO DE COCICOVIS

DGP/SG-ADM/0-0037-10

CONST	FECHA	HORA	PROGRAMA	OBRA	LUGAR	COLONIA
1	27/sep./2010	10:30	PIM	Construcción de la plaza cívica (Plaza Bicentenario)	Calle Nayarit entre Laredo y San Luis	Constitución de 1917
2		11:00	PIM	Construcción de Oficinas del Consejo de Av. Emiliano Zapata y cda. De Emiliano Zapata		División del Norte
3		12:00	PIM	Plancha de Concreto	Gimnasio	División del Norte
4		13:00	PIM	Plancha de Concreto	Gimnasio	División del Norte
5	22/sep./2010	14:00	PIM	Construcción de Arroyo, banqueta y escalón	Explotaciones de Occidente entre Lázaro Cárdenas 3ª de Gavilanes y Tizoc y Secc. Gavilanes	Lázaro Cárdenas 3ª
6		10:00	PIM	Construcción de muro de piedra, escalones y descansos	Gavilanes entre Lázaro Cárdenas 3ª de Gavilanes y Tizoc y Secc. Gavilanes	Lázaro Cárdenas 3ª
7		11:00	PIM	Reconstrucción de banqueta asfaltada	Arroyo de Anahuac entre Lázaro Cárdenas 3ª de México y límite urbano	Lázaro Cárdenas 3ª
8		12:00	PIM	Construcción de cacos de concreto armado	Calle López Mateos entre Rucio Pascual Ortiz	Marina Nacional
9	23/sep./2010	13:00	PIM	Rehabilitación de áreas deportivas	Av. Necaxa entre Av. Ferrocarril	Marina Nacional
10		14:00	PIM	Plancha de Concreto	Gimnasio	Marina Nacional
11		10:00	PIM	Reparación de barda	Colinante con Condominio Cayán	U. H. Loma Escarpada
12		11:00	PIM	Plancha de Concreto	Estacionamiento de la Unidad	U. H. Loma Escarpada
13	23/sep./2010	12:00	PIM	Reconstrucción de banquetas y guarnición de Hídrico	Calle Abasco, Av. Miguel Hídrico y Galeana	U. H. Loma Escarpada
14		13:00	PIM	Reconstrucción de arroyo	Calle Ramón Corona	21 de Marzo
15		14:00	PIM	Trota pista	Alrededor de la F.E.S. Ixtacalpa	La Comunicac
16		10:00	PIM	Reconstrucción de arroyo	Calle Acuario entre Mercurio y Alfa Centauro	La Sideral
17	24/sep./2010	11:00	PIM	Reconstrucción de banquetas	Acuario y Via Láctea	La Sideral
18		12:00	PIM	Reconstrucción de arroyo	Prolongación Calle 4	Chalma la Unión
19		13:00	PIM	Reconstrucción de banquetas	Av. López Mateos, Presidente Juárez y Cda. De Hídrico	San José Puente de Vigas
20		14:00	PIM	Reconstrucción de arroyo	Calle Independencia	San Pablo Xalica
21	27/sep./2010	10:00	PIM	Reconstrucción de banquetas	Av. Del trabajo, 1º de mayo, 16 de Hídrico y Av. Xcoyauhtlic	Xcoyauhtlic
22		11:00	PIM	Rehabilitación de Tacuandora	Calle Lema de Calle Lema s/n, esq. El Olivo	El Olivo

Plaza Dr. Gustavo Baz S/N Tlaxepantla Centro
Estado de México, C. P. 54000

TLAXEPANTLA DE BAZ
Municipio de Tlaxepantla



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: RESUMEN DE OBRA

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGOPISC-	
Adm/O-0037-10	
HOJA: 1 DE: 22	
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION:	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON.	
FIRMA:	
TEC. JAVIER MARGAS ESPINOSA	

- 1.- DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $\Sigma = 44.57 \text{ M}^3$
- 2.- DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $\Sigma = 77.30 \text{ M}^3$
- 3.- DEMOLICION DE GUARNICIONES
 $\Sigma = 8.53 \text{ M}^3$
- 4.- EXCAVACION
 $\Sigma = 4.0 \text{ M}^3$
- 5.- RETIRO DE ESCOMBRO
 $\Sigma = 134.40 \text{ M}^3$
- 6.- MEJORAMIENTO DEL TERRENO
 $\Sigma = 130.40 \text{ M}^3$
- 7.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
 $\Sigma = 1,218.80 \text{ M}^2$
- 8.- RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $\Sigma = 77.30 \text{ M}^3$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

RESUMEN DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPISC-	Adm/O-0037-10
HOJA: 2	DE: 22
COMUNIDAD:	
CONSTRUCCION DE 1917	
UBICACION: NAVARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547
AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON.

FIRMA:

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

9.- RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESPAMPADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 0.18 MTS DE ESPESOR

$\Sigma = 80.23 \text{ M3}$

10.- CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS CON VARILLAS DE 3/8"

$\Sigma = 1.12 \text{ M3}$

11.- CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8"

$\Sigma = 1.72 \text{ M3}$

12.- CONSTRUCCION DE TRABES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8"

$\Sigma = 2.73 \text{ M3}$

13.- COLOCACION DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA FORRAR ARCOS

$\Sigma = 32.64 \text{ M2}$

14.- APLICACION DE PINTURA EN POLVO SOBRE CONCRETO ESTAMPADO

$\Sigma = 284.76 \text{ BULTOS PARA UN AREA DE 1,218.80 M2}$

15.- COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL SOBRE KIOSKO

$\Sigma = 50.76 \text{ M2 M2}$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

TLALNEPANTLA, ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC- Adm/D-0037-10
HOJA: 4 DE: 22

COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI


DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
ING. JOSE RAFAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

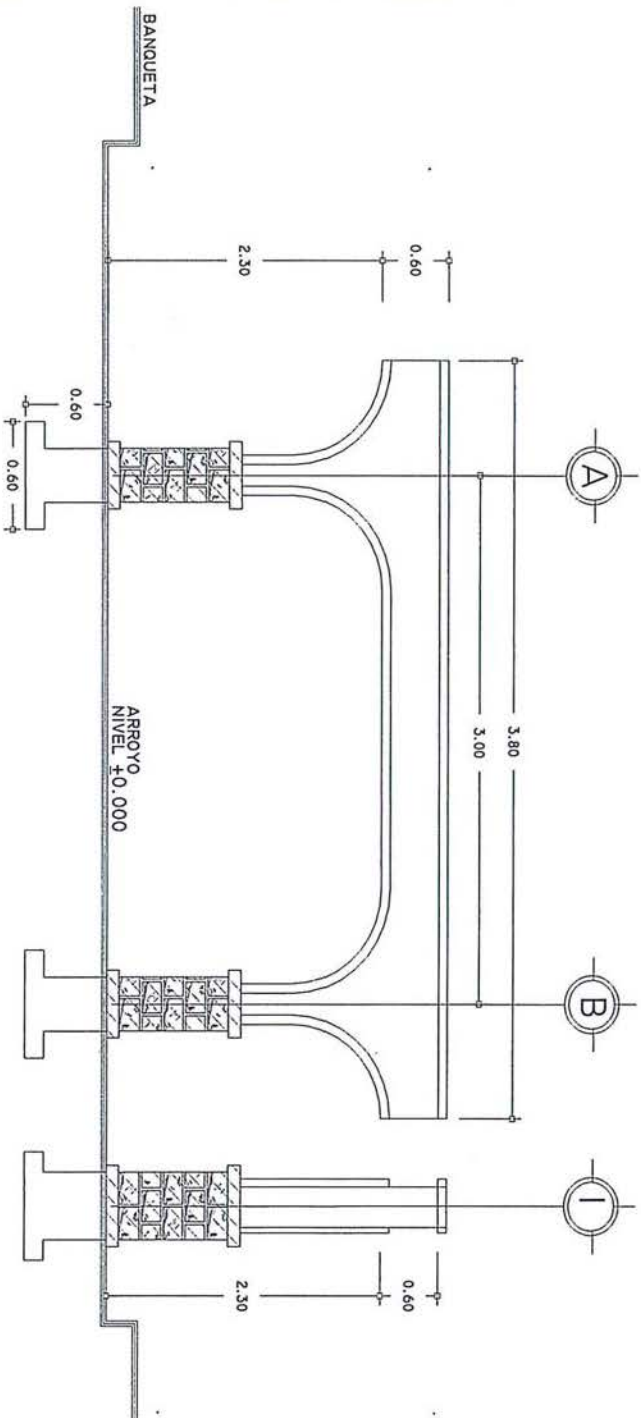

22



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR

TLALNEPANTLA, ORIENTE
PROGRAMA: PIM


DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC- Adm/O-0037-10
HOLA-5 DE: 22

COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACIÓN: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5.547

AUTORIZACIÓN
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVILA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

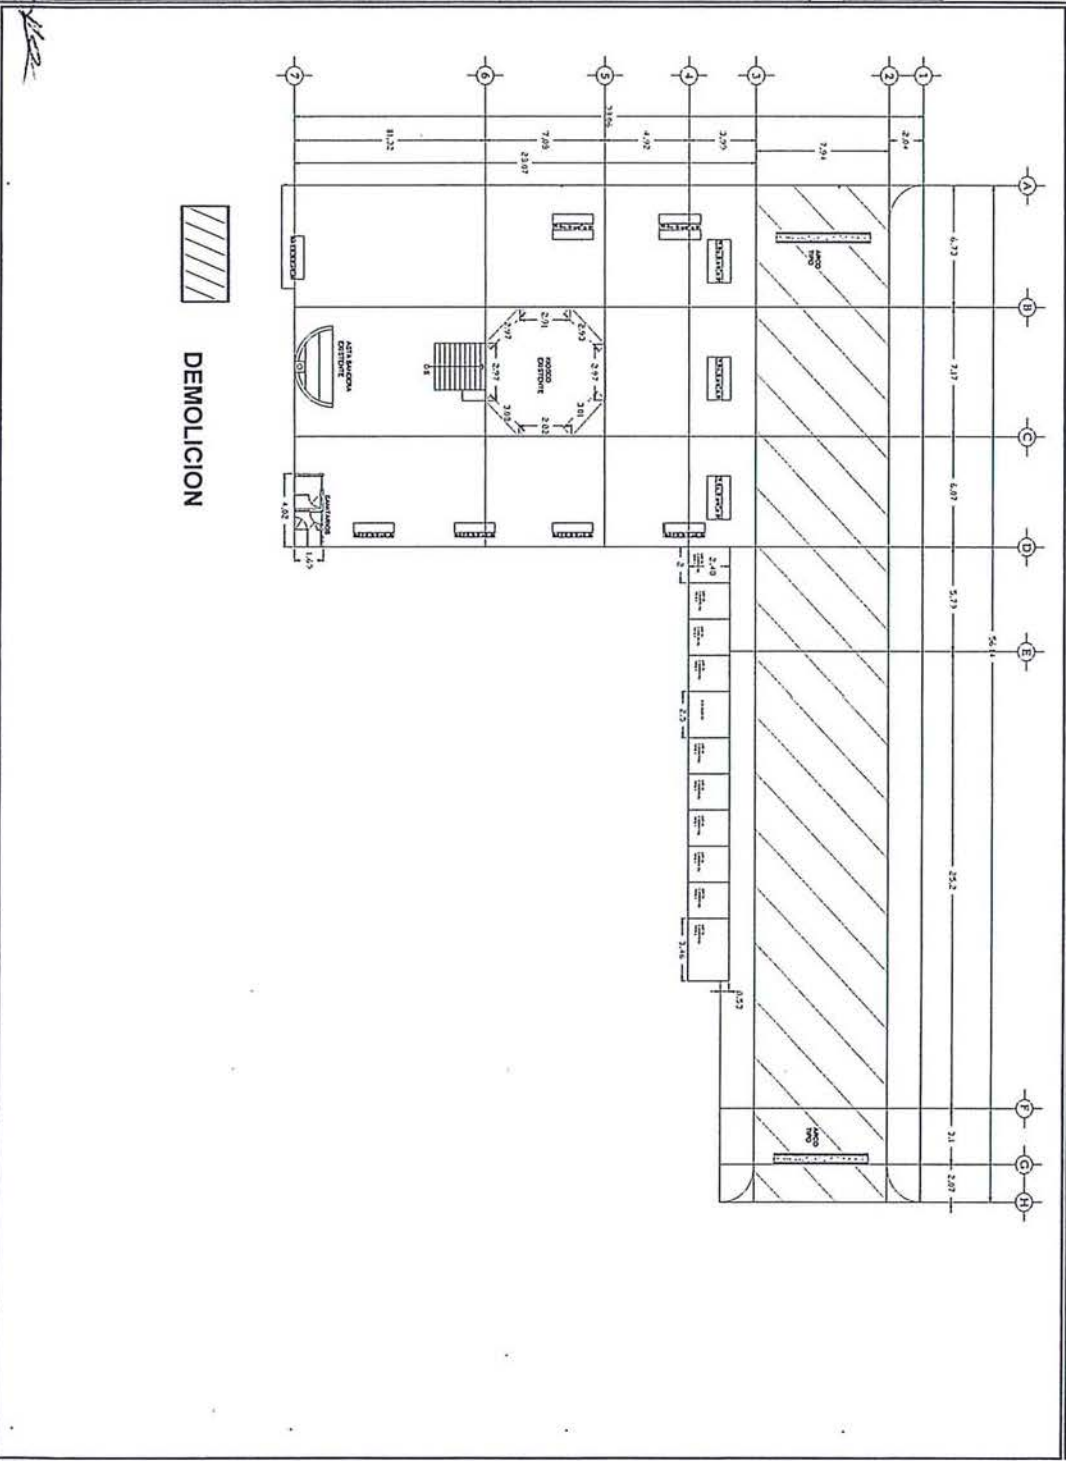



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA, ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC- Adm/O-0037-10

HOJA: 7 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE GREGORIO BARRAGAN ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

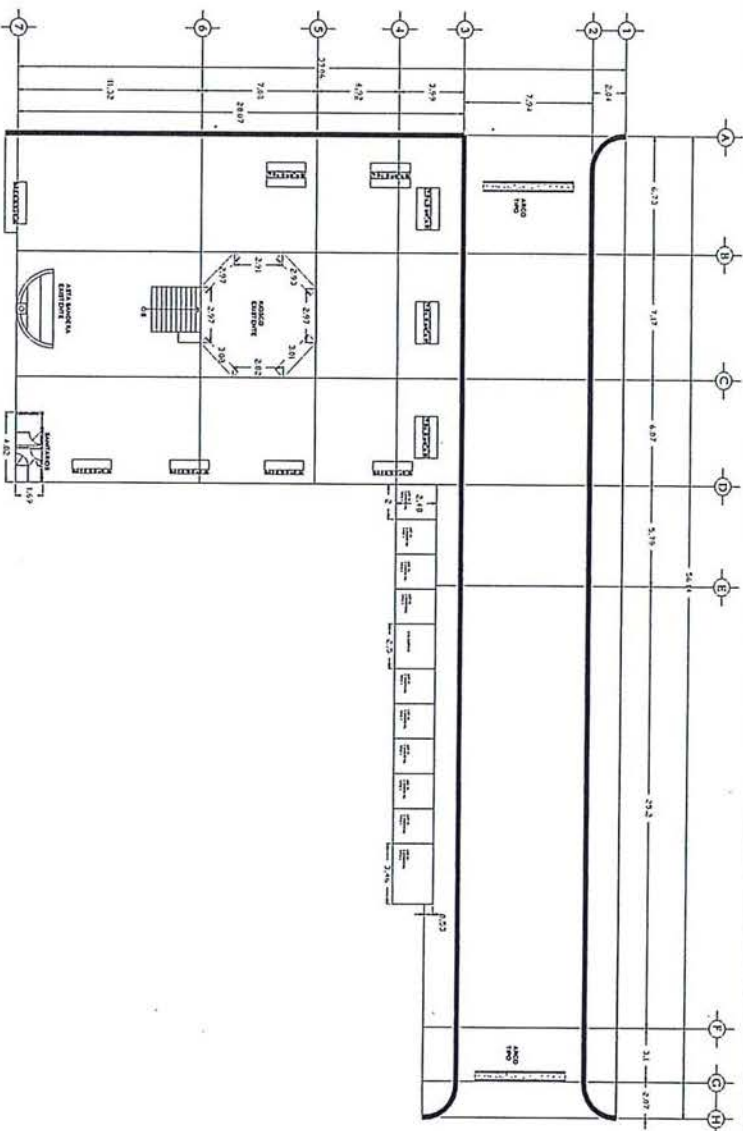

DEMOLICION



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: EXCAVACION PARA COLOCACION DE ARCOS

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPISC-Adm/O-0037-10

HOJA: 8 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSE BALBINO GONZALEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA



EXCAVACION

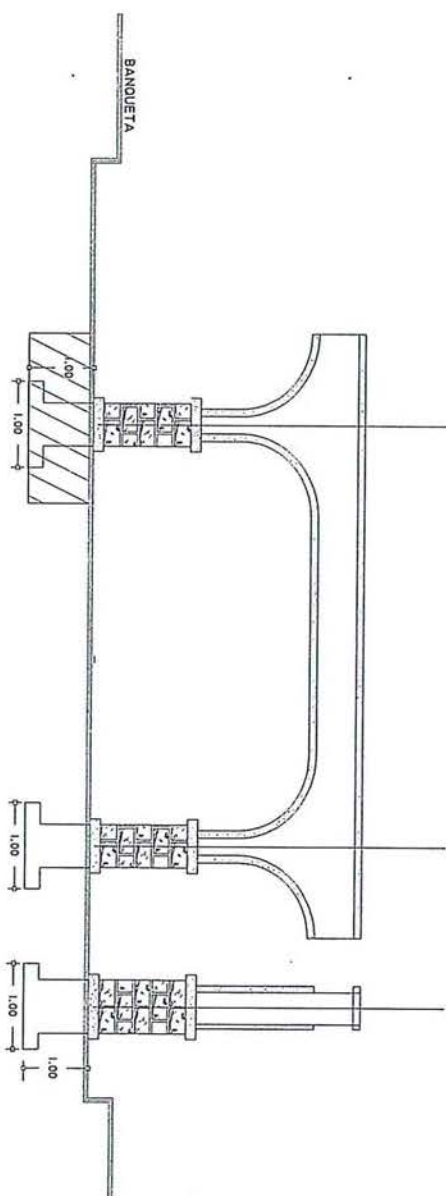



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA-ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC- Adm/D-0037-10

HOJA: 9 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE RAFAEL GONZALEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE ARROYO, BANQUETA, GUARNICION Y DE EXCAVACION

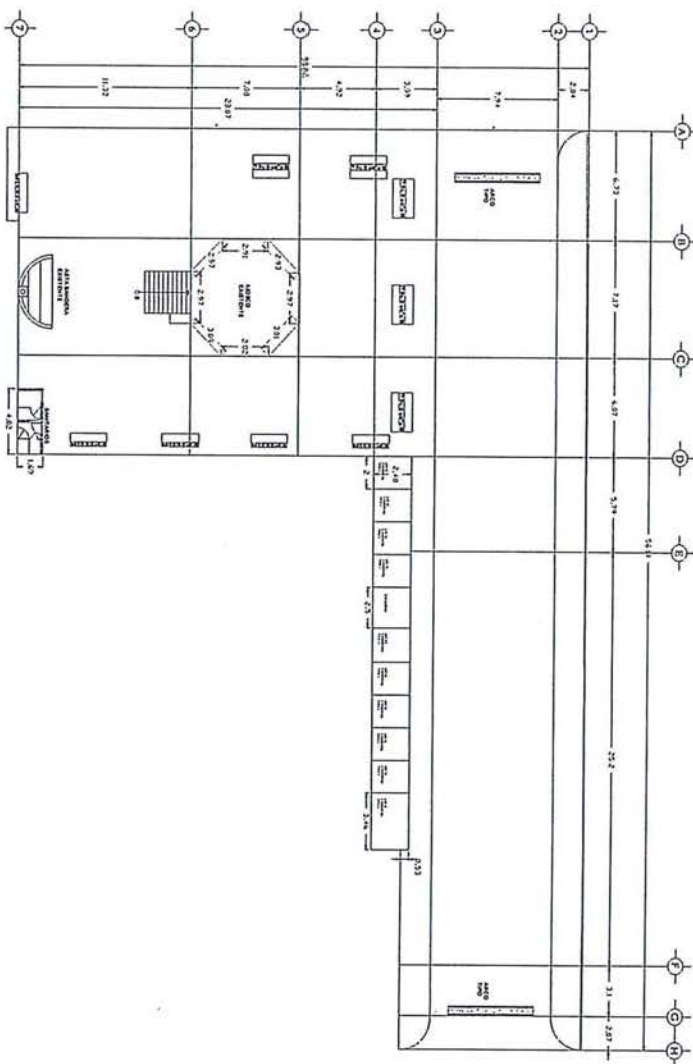

RETIRO DE ESCOMBRO

27



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
HOLA: 10 DE: 22

COMUNIDAD:
CONSTRUCCION DE 1917
UBICACION: NAVARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE LUIS DEL PINO JAVILA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: MEJORAMIENTO DEL TERRENO

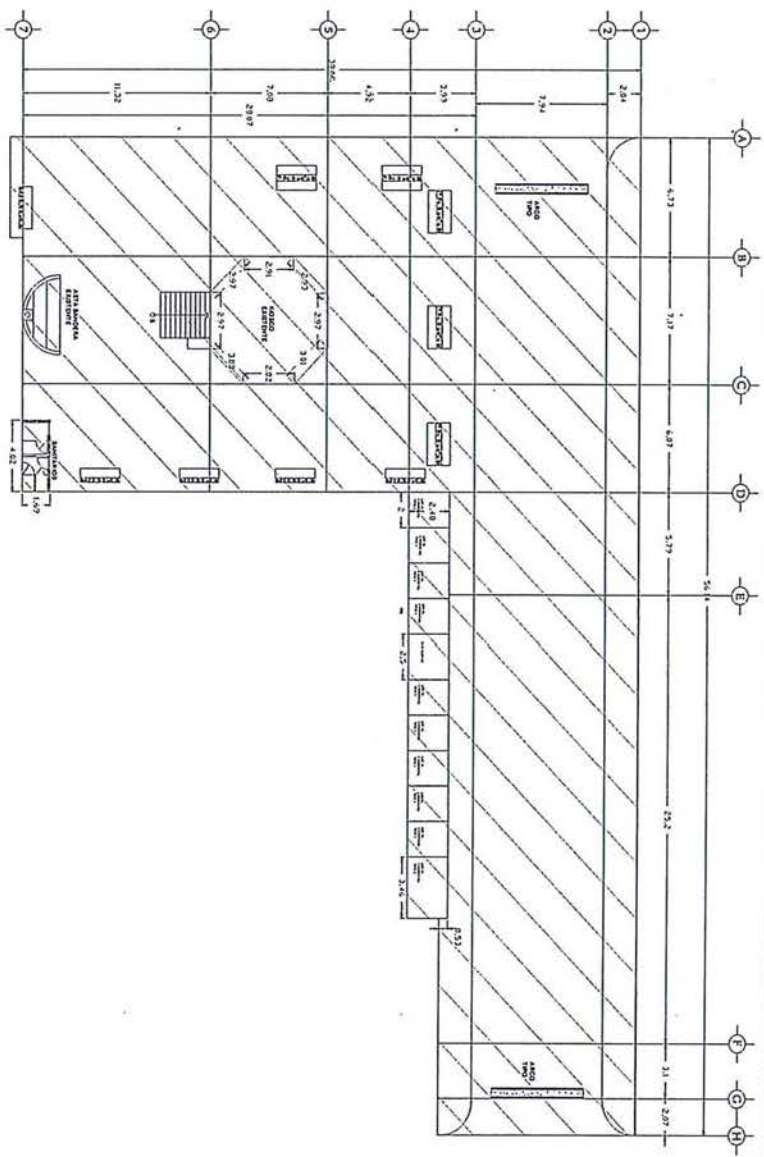

MEJORAMIENTO DEL TERRENO



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: RECONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS ESPESOR

TLALNEPANTLA, ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOPISC-Adm/O-0037-10
HOJA: 12 DE: 22

COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAVARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI


DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION:

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE IBEREL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

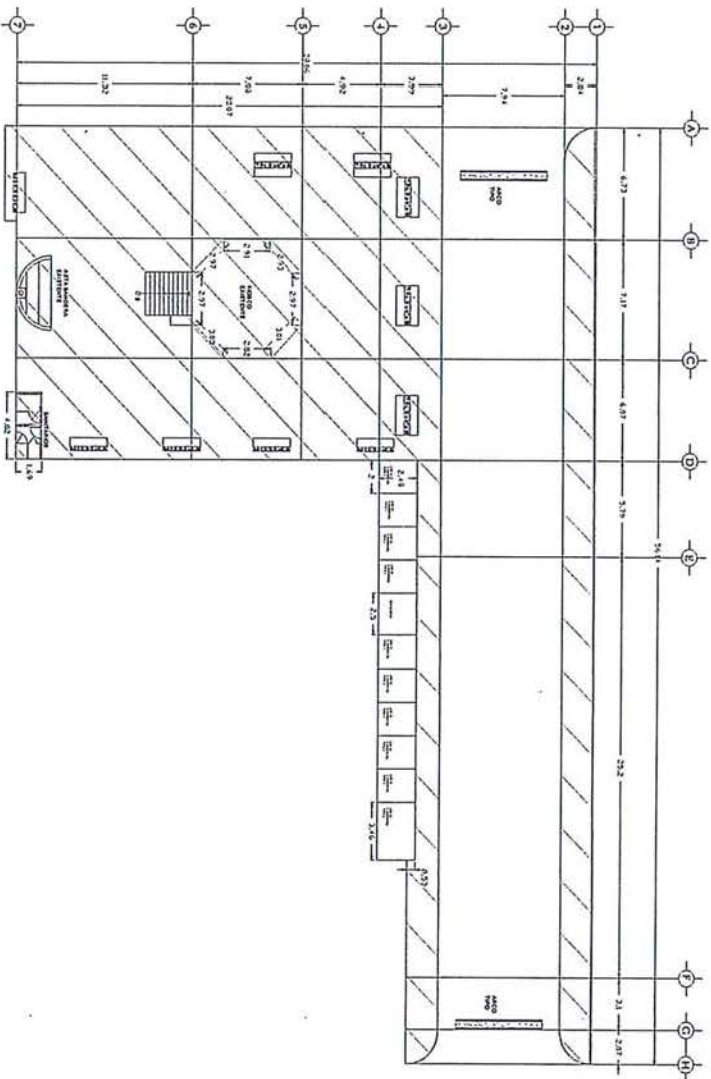

RECONSTRUCCION DE BANQUETA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS CON VARILLAS DE 3/8"

TLALNEPANTLA-ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/D-0037-10

HOJA: 13 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTRUCCION DE 1917

UBICACION: NAVARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE LUIS EL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

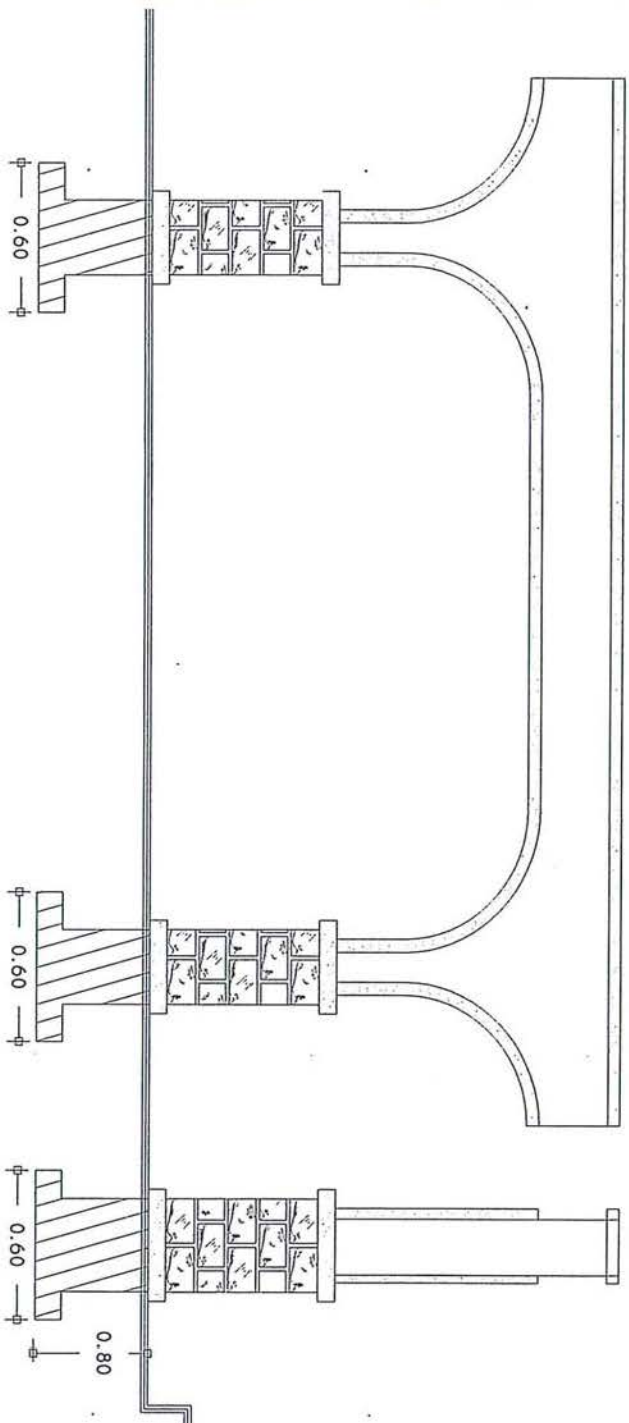

CONSTRUCCION DE DADOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8"

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC- Adm/O-0037-10

HOJA:14 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA



CONSTRUCCION DE COLUMNAS

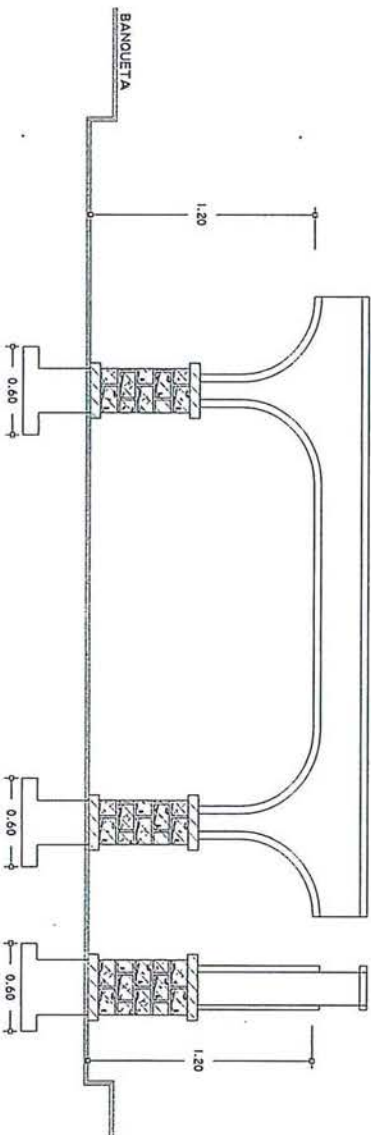



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRABES DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM², ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8"

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC- Adm/O-0037-10

HOJA: 15 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTRUCCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSE RAFAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA



CONSTRUCCION DE TRABES

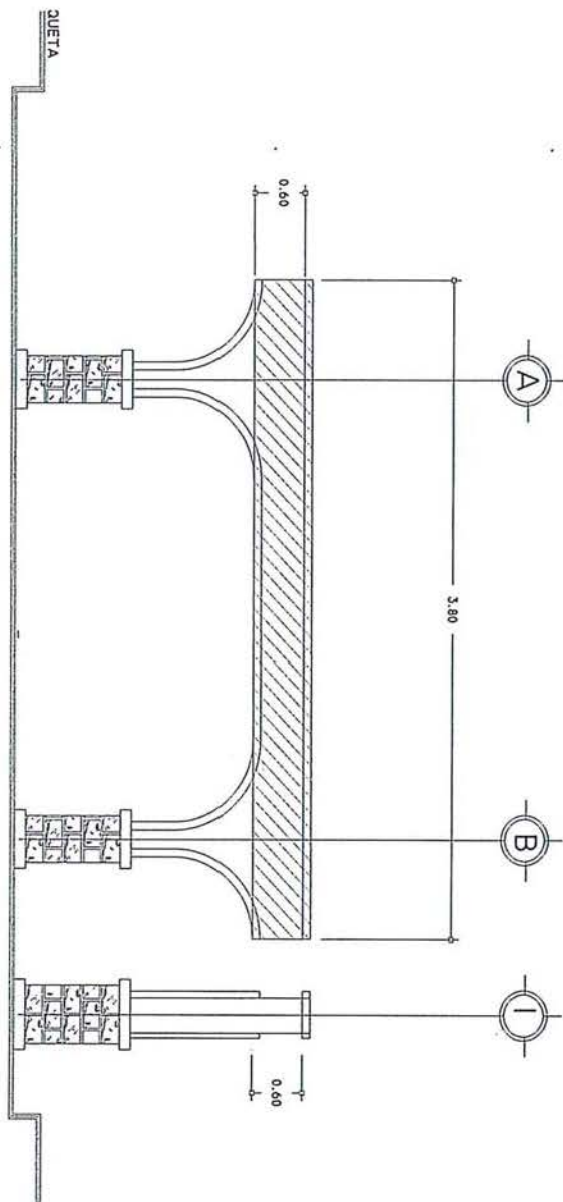



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

DESCRIPCION: COLOCACION DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA FORADO DE ARCOS

TLALNEPANTLA, ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGO/SC- Adm/O-0037-10

HOJA: 16 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAVARIT

ENTRE: LAREDO Y SANLUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSE ROBERTO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA



COLOCACION DE TABIQUE

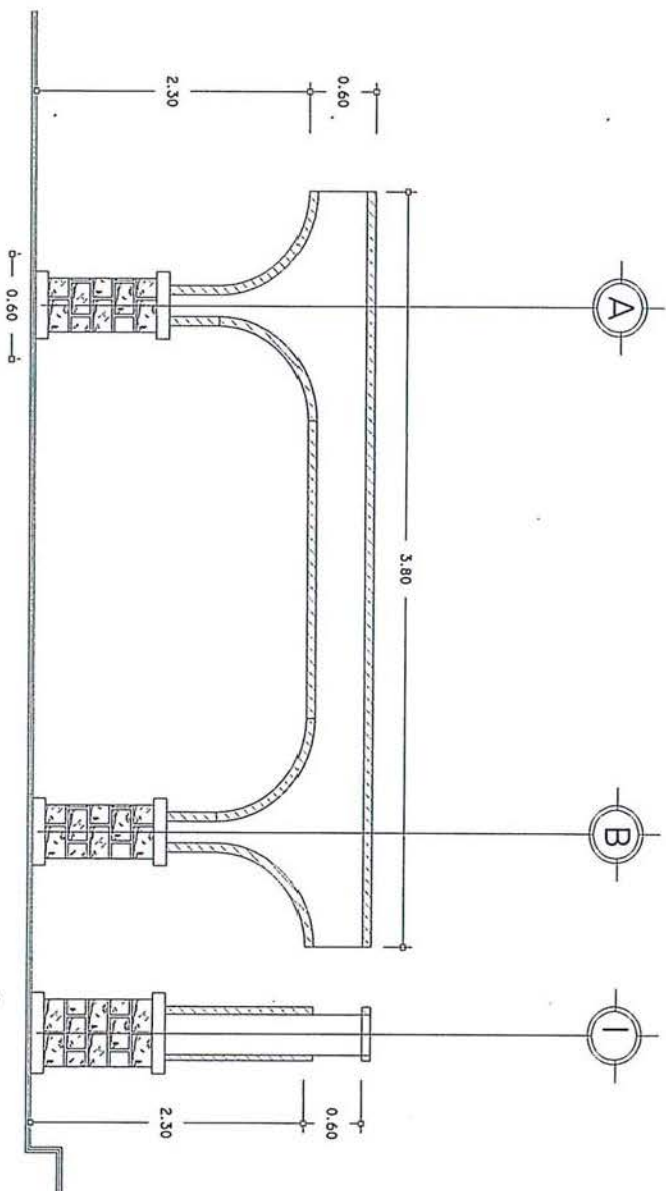



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPI/SC-Adm/D-0037-10

H04A17 DE: 22

COMUNIDAD:

CONSTRUCCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SANILUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: RECONSTRUCCION DE ARROYO ESTAMPADO CON CONCRETO DE FC= 200 KG/CM2 DE 0.18 MTS. DE ESPESOR

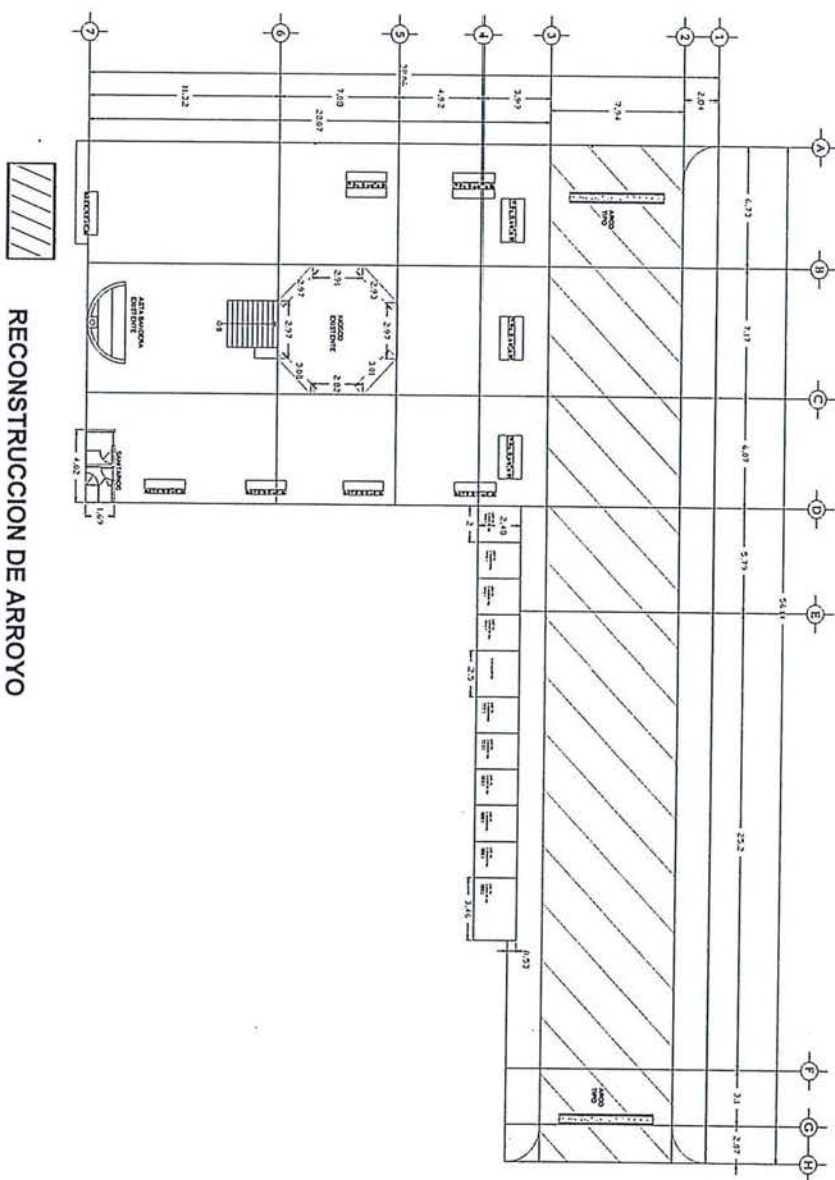

35



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPISC-Adm/O-0037-10

HOJA: 18 DE 22

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAVAYART

ENTRE: LAREDO Y SANLUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACIÓN


ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE LUIS DOMÍNGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO


TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO SOBRE ARROYO Y BANQUETAS

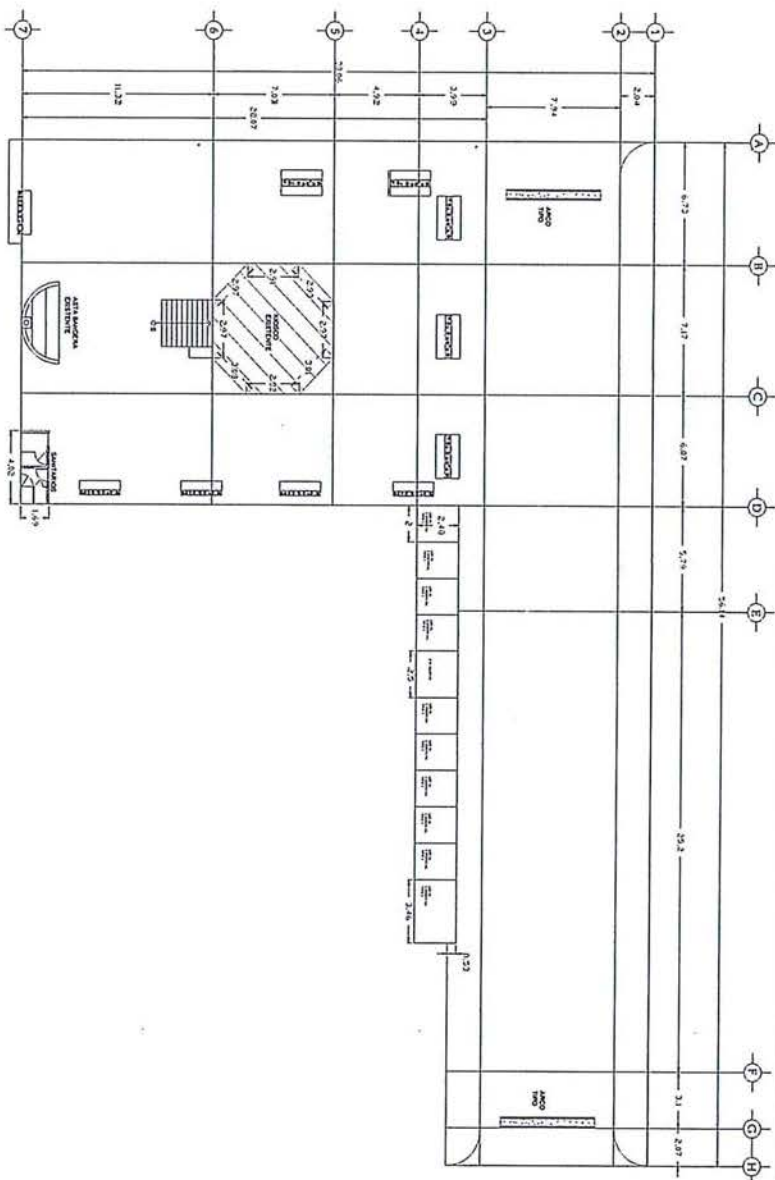

APLICACIÓN DE PINTURA

36



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
HOLA: 19 DE: 22


COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD:
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE RAFAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL SOBRE KIOSKO

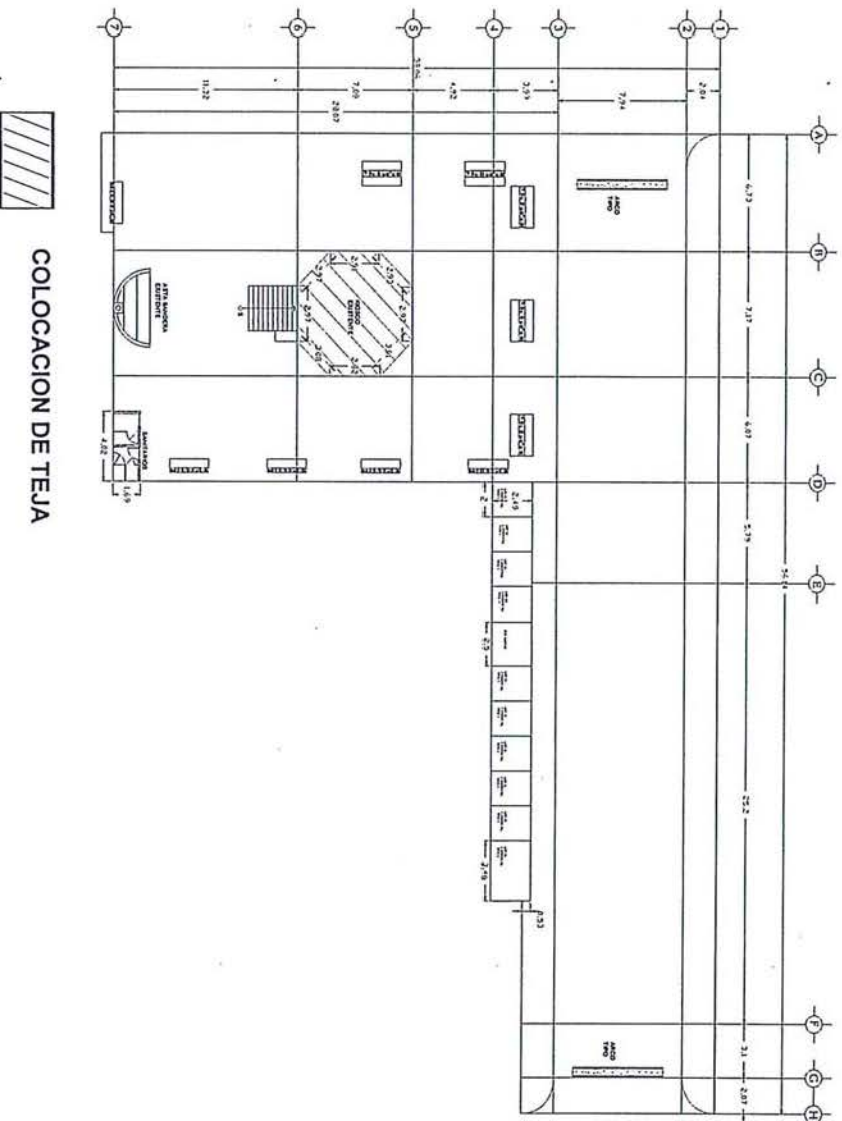



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
FECHA:	CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
HOLA: 20 DE: 22	
COMUNIDAD:	
CONSTRUCCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA JEFE DEL DSEPTO. DE OBRAS POR ADMON.	
SUPERVISOR TECNICO	
FIRMA:	
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA
DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $56.14 \times 7.94 = 445.75$
 $445.75 \times 0.10 = 44.57 \text{ M3}$

MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DEL
PRODUCTO DEL MISMO TERRENO
 $\Sigma = 130.40 \text{ M3}$

DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO
DE 0.10 MTS. DE ESPESOR

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

$2.04 \times 50.97 = 103.98$
 $3.99 \times 50.97 = 203.37$
 $23.32 \times 19.97 = 465.70$
 $773.05 \times 0.10 = 77.30 \text{ M3}$

$56.14 \times 7.94 = 445.75$
 $2.04 \times 50.97 = 103.98$
 $3.99 \times 50.97 = 203.37$
 $23.32 \times 19.97 = 465.70$
 $1,218.62 \text{ M2}$

DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO

RECONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO

$0.15 + 0.25/2 = 0.20 \times 0.35 \times 50.97 = 3.57$
 $0.15 + 0.25/2 = 0.20 \times 0.35 \times 50.97 = 3.57$
 $0.15 + 0.25/2 = 0.20 \times 0.35 \times 23.32 = 1.39$
 8.53 M3

EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ARCOS

$2.04 \times 50.97 = 103.98$
 $3.99 \times 50.97 = 203.37$
 $23.32 \times 19.97 = 465.70$
 $773.05 \times 0.10 = 77.30 \text{ M3}$

$1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 1.0 \times 4 = 4.0 \text{ M3}$

RETIRO DE ESCOMBRO

$\Sigma = 134.40 \text{ M3}$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
FECHA:	CLAVE: DGOPSC-Adm/O-0037-10
H.O.A.: 21 DE: 22	
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAVARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS POR ADMON.	
SUPERVISOR TECNICO	
FIRMA:	
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO
ESTAMPADO DE F'C= 200 KG/CM2 CON UN ESPESOR
DE 0.18 MTS.

56.14 X 7.94= 445.75 X 0.18= 80.23 M3

CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO DE F'C=
200 KG/CM2, ARMADOS CON 10 VARILLAS DE 3/8"
Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS.

0.60 X 0.60 X 0.80= 0.28 X 4 PZAS.= 1.12 M3

CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=
200 KG/CM2, ARMADOS CON 8 VARILLAS DE 3/8"
Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS.

0.60 X 0.60 X 1.20= 0.43 X 4 PZAS.= 1.72 M3

CONSTRUCCION DE TRABES DE CONCRETO DE F'C=
200 KG/CM2, ARMADOS CON 10 VARILLAS DE 3/8"
Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS.

0.60 X 0.60 X 3.8= 1.36 X 2 PZAS.= 2.73 M3

COLOCACION DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN
ARCOS

0.60 X 2.30= 1.38 X 16 PZAS.= 22.08

0.60 X 3.8= 2.28 X 4 PZAS.= 9.12

0.60 X 0.60 X 0.36 X 4 PZAS.= 1.44

32.64 M2

APLICACION DE PINTURA EN POLVO SOBRE
CONCRETO ESTAMPADO

56.14 X 7.94= 445.75

2.04 X 50.97= 103.98

3.99 X 50.97= 203.37

23.32 X 19.97= 465.70

1,218.80 M2 RENDIMIENTO DE 4.28 M2 X BULTO

COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL EN
KIOSCO

7.17 X 7.08= 50.76

50.76 M2 (1,269 PIEZAS DE TEJA)



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
FECHA:	CLAVE: DGOP/SC-AdmIO-0037-10
HORA: 22 DE: 22	
COMUNIDAD:	
CONSTRUCCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION:	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVILA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA JEFE DEL DSEPTO. DE OBRAS POR ADMON.	
SUPERVISOR TECNICO	
FIRMA:	
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

ACERO DE 3/8" PARA CONSTRUCCION DE DADOS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

10 VARILLAS DE 3/8" X 0.80=8.0 X 4 PIEZAS= 32 ML / 12= 2.66 PZAS DE 3/8"
32.0 ML X 0.557= 17.82 KG DE 3/8"

(0.60 + 0.60)/2= 2.40 X 4 ESTRIBOS= 9.60 X 4 PIEZAS= 38.40 ML
38.40 ML X 0.248= 9.52 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ACERO DE 3/8" PARA COLUMNAS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

8 VARILLAS DE 3/8" X 1.20= 9.60 X 4 PIEZAS= 38.40 ML / 12= 3.2 PZAS DE 3/8"
38.40 ML X 0.557= 21.38 KG DE 3/8"

(0.60 + 0.60)/2= 2.40 X 6 ESTRIBOS= 14.40 X 4 PIEZAS= 57.60 ML
57.60 ML X 0.248= 14.28 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ACERO DE 3/8" PARA TRABES CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

10 VARILLAS DE 3/8" X 3.80= 38.0 X 2 PIEZAS= 76.0 ML / 12= 6.33 PZAS DE 3/8"
76.0 ML X 0.557= 42.33 KG DE 3/8"

(0.60 + 0.60)/2= 2.40 X 19 ESTRIBOS= 45.60 X 2 PIEZAS= 91.200 ML
91.20 ML X 0.248= 22.61 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

TOTALES

VARILLAS DE 3/8" PZAS= 12.13

VARILLAS DE 3/8" KG= 81.53

ALAMBRO DE 1/4" KG= 46.41

35.0 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES Y TORZALES



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



PROYECTO DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA, ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOLLA: 1 DE: 2

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE RAFAEL GONZALEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON


SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

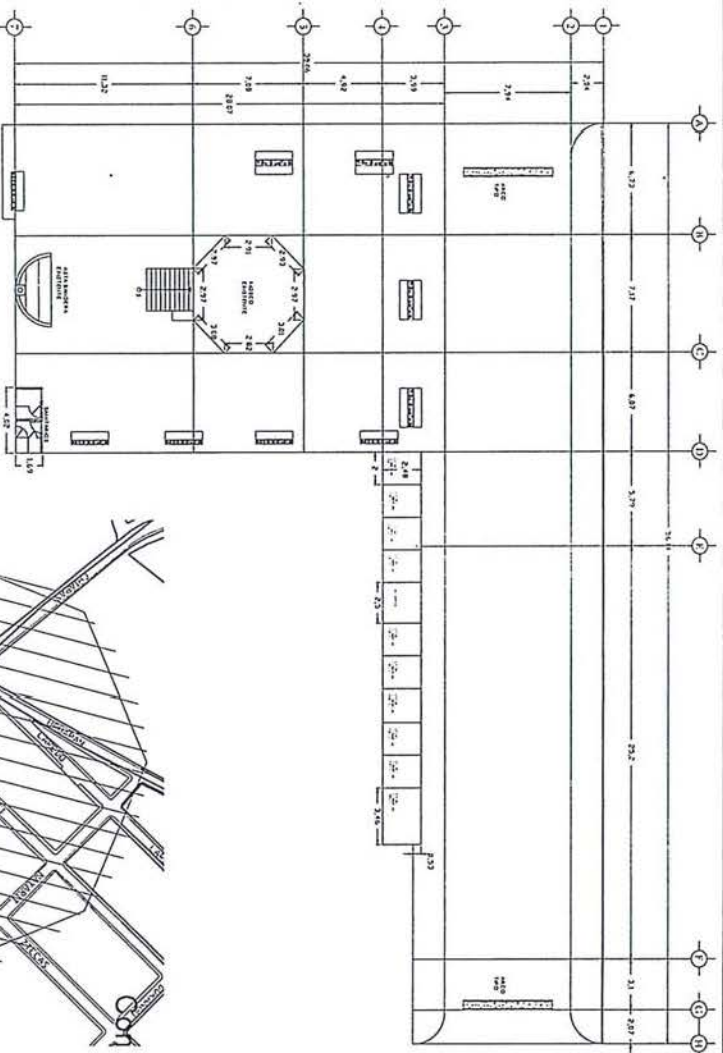

SIMBOLOGIA Y DATOS

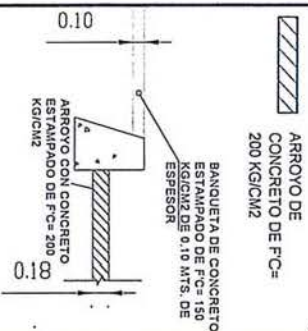



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



PROYECTO DE OBRA DE INICIO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOJA: 2 DE: 2

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACIÓN


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ISIDORO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

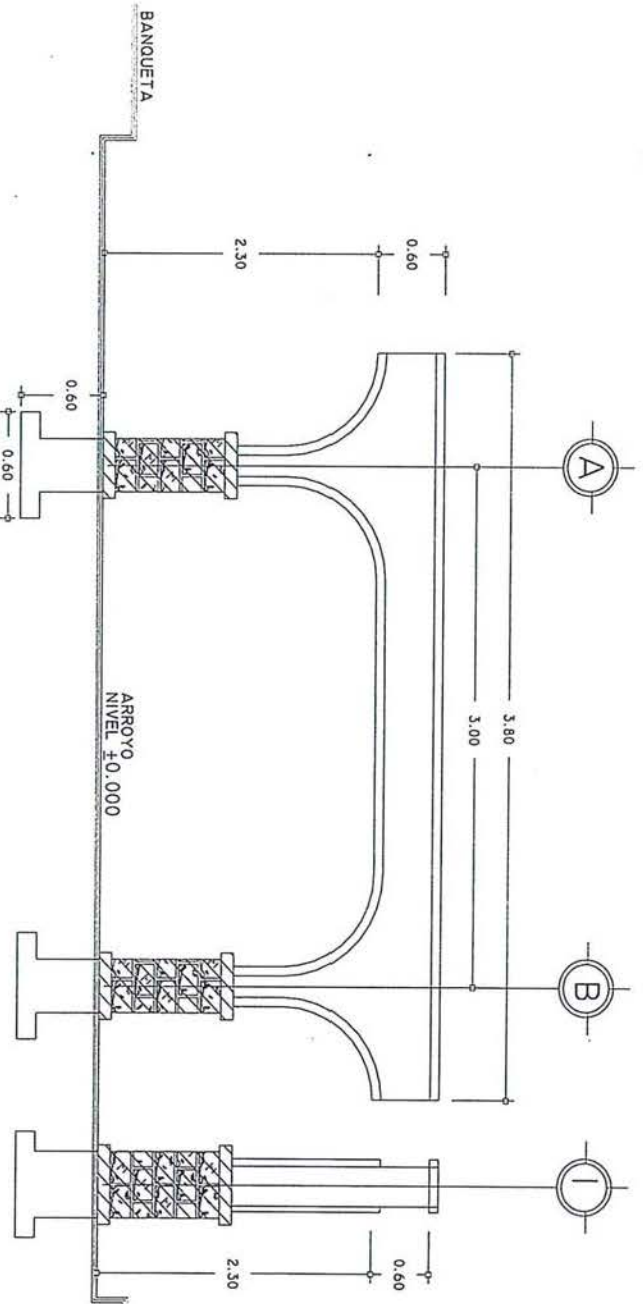



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE B.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS



CLAVE DE OBRA: DSGOP/SC-Adm/O-0037-10

COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (BICENTENARIO)

SUPERVISOR: TEC. JAVIER VAIGAS ESPINOSA

FECHA DE INICIO: 20 de Septiembre de 2010

FECHA DE TERMINO: 25 de Octubre de 2010

RECUSO: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PINI)

EJECUTADA CON MANO DE OBRA APORTADO POR: H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA

UBICACION: NAVARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS PORTOSI

AVANCE: 0%

CONSIDERADO EN EL IMPORTE DE MATERIALES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
CONCRETO	M3	77.30		
RETIRO DE ESCOMBRO	M3	134.4	\$51.75	\$6,955.20

TRABAJO PRELIMINARES

CONSIDERADO EN EL IMPORTE DE MANO DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
TRABAJO Y ERECCION	M2	1218.80	\$3.70	\$4,509.56
DEMOLICION	M3	130.40	\$53.49	\$6,975.10
EXCAVACION	M3	4.00	\$43.13	\$172.52
TRANSPORTE	M3	130.40	\$12.00	\$1,564.80

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS

MATERIALES				MANO DE OBRA				TOTAL POR CONCEPTO
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FACTORES POR UNA UNIDAD	INSUMOS	P.U.	IMPORTE POR MATERIAL	TOTAL MATERIALES	
CONCRETO DE F-C=150	M3	77.30	CEMENTO (TON) 0.2631 ARENA (M3) 0.55 GRAVA (M3) 0.65	20.3376 42.5150 50.2450	\$2,282.75 \$247.25 \$327.75	\$46,425.72 \$10,511.83 \$16,467.80	\$73,405.36	\$135,495.71
CONCRETO DE F-C=200	M3	85.80	CEMENTO (TON) 0.3125 ARENA (M3) 0.5046 GRAVA (M3) 0.5531	26.8125 43.2947 47.4560	\$2,282.75 \$247.25 \$327.75	\$61,206.23 \$10,704.61 \$15,553.70	\$87,464.54	\$146,282.02

SUB TOTAL MATERIALES \$160,869.90

SUBTOTAL MANO DE OBRA \$120,905.83

SUB TOTAL CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS \$281,775.73

NOTA: FACTORES PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL MATERIALES: \$167,825.10
TOTAL MANO DE OBRA: \$134,127.81
TOTAL: \$301,952.91

NOTA: LA BASE DE DATOS TRABAJA LAS CANTIDADES DE MATERIALES CON 4 DECIMALES, POR LO QUE LOS RESULTADOS VARIAN EN CENTAVOS, EL IMPORTE DEL RETIRO DE ESCOMBRO SE SUMA AL COSTO DEL MATERIAL, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS LOS EROGA EL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS



CLAVE DE OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10

COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (BICENTENARIO)

SUPERVISOR: TEC. JORGE CUEVAS ALVAREZ

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 20 de Septiembre de 2010

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 25 de Octubre de 2010

RECURSO : PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIMI)

OBRA EJECUTADA CON MANO DE OBRA APORTADO POR:

UBICACION: NAVARRIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

AVANCE: 0%

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE POR MATERIAL	TOTAL MATERIALES	TOTAL POR CONCEPTO
A D E F G						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE ROJO, PARA FONDO DE ARCOS	M2	32.64	\$173.82	\$5,673.48	\$5,673.48	\$5,673.48
ACEROS EN PERILLA EN FORMA DE BARRAS ESTANDBO	M2	39.176	\$122.19	\$4,794.82	\$4,794.82	\$4,794.82
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA EN TECIO DE MOSISO	M2	50.76	\$24.00	\$1,218.24	\$1,218.24	\$1,218.24
ACENO DE REFUERZO DE 3/8"	KG	81.53	\$17.64	\$1,438.73	\$1,438.73	\$1,438.73
ACENO DE REFUERZO DE 1/4"	KG	46.41	\$18.20	\$844.88	\$844.88	\$844.88
ALAMBRE RECOCIDO	KG	35.00	\$13.17	\$460.95	\$460.95	\$460.95
SUB TOTAL MATERIALES					\$44,431.10	\$44,431.10
TOTAL CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS						\$44,431.10

COSTOS TOTALES DE OBRA

TOTAL MATERIALES : \$212,256.20
TOTAL MANO DE OBRA : \$134,127.81
TOTAL : \$346,384.01



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRA POR ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE OBRA

PROGRAMA: FISM
INICIO

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACIÓN: PLAZA CONSTITUCION DE 1917, NAVARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

CONCEPTO: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

HOJA: 1 DE: 2

ZONA: ORIENTE



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
D-01	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS DE ESPESOR, QUE INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	44.57	\$53.49	\$2,384.05
D-02	DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	77.30	\$3.49	\$4,134.77
D-03	DEMOLICION DE GUARNICIONES CON MEDIOS MANUALES, QUE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.53	\$53.49	\$456.27
EX-01	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION DE ARCO, QUE INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.00	43.13	\$172.52
R-01	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA, BANQUETAS Y DE EXCAVACION, CON MEDIOS MANUALES Y HERRAMIENTA, QUE INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIONES, MANO DE OBRA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	134.40	\$51.75	\$6,955.20
M-01	MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE MATERIAL DEL MISMO TERRENO PUESTO EN OBRA, CON UN ESPESOR DE 0.05 MTPRODUCTOS, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL (TEPATATE), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	130.40	\$12.00	\$1,564.80
T-01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EJES DE REFERENCIA, HILOS, CLAVOS, CUÑAS DE MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,218.80	\$3.70	\$4,509.56
AL-01	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO DE F.C=150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS, QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	77.30	\$1,752.83	\$135,493.71
AL-02	RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO DE F.C=200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ASESORIA TECNICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	80.23	\$1,704.92	\$136,785.73



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRA POR ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE OBRA

PROGRAMA: FISM
INICIO

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACIÓN: PLAZA CONSTITUCION DE 1917, NAYARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

CONCEPTO: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

HOJA: 2 DE 2

ZONA: URBENITE



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PERIODO DE EJECUCION: 20-SEPTIEMBRE-2010 AL 25-OCTUBRE-2010					
AL-03	CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADOS CON 10 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS, QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO	M3	1.12	\$1,704.92	\$1,909.51
AL-04	ARMADOS CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS, QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO	M3	1.72	\$1,704.92	\$2,932.46
AL-05	CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADOS CON 10 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS, QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO	M3	2.73	\$1,704.92	\$4,654.43
AL-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A PLOMO PARA FORRAR ARCOS DE CONCRETO, QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SERA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M2	32.64	\$173.82	\$5,673.48
AL-07	APLICACION DE PINTURA EN POLVO SOBRE CONCRETO ESTAMPADO, PARA UN AREA DE 1,218.55 M2 QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SERA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	BULTOS	284.76	\$122.19	\$34,794.82
AL-08	SUMINISTRO Y APLICACION DE TEJA TIPO COLONIAL EN KIOSKO, QUE INCLUYE: ASESORIA TECNICA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SERA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M2	50.76	\$24.00	\$1,218.24
	ACERO (VARILLA DE 3/8")	KG	81.53	17.64	\$1,438.73
	ACERO (ALAMBRO DE 1/4")	KG	46.41	\$18.20	\$844.88
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	35.00	\$13.17	\$460.95
TOTAL					\$346,384.01

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de Obras

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obra por Administración

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

INICIO

PROGRAMA:

ZONA: ORIENTE

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: REMODELACION DE PLAZA CONSTITUCION 1917, NAVARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

HOJA: 1

DE: 3

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20-SEPTIEMBRE-2010 AL 25-OCTUBRE-2010

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA												
DEMOLICION DE BANQUETAS												
DEMOLICION DE GUARNICIONES												
EXCAVACION												
RETIRO DE ESCOMBRO												
MEJORAMIENTO DEL TERRENO												
TRAZO Y NIVELACION												

Elaboro: Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Javier Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración

OBSERVACIONES

EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES POR FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIAL POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y/O EFECTOS METEOROLOGICOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

INICIO

OBRA: DGOP/SC/Adm/O-0037-10

PROGRAMA: PIM

ZONA: ORIENTE

UBICACION: REMODELACION DE PLAZA CONSTITUCION 1917, NAVARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

HOJA: 2

DE: 3

CONCEPTO	PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20-SEPTIEMBRE-2010 AL 25-OCTUBRE-2010											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO DE F'C= 150 KG/CM2												
RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO DE F'C=200 KG/CM2												
CONSTRUCCION DE DADOS DE F'C= 200 KG/CM2												
CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE F'C= 200 KG/CM2												
CONSTRUCCION DE TRABE DE F'C= 200 KG/CM2												
COLOCACION DE TABIQUE ROJO RECOCIDO												
APLICACION DE PINTURA EN POLVO SOBRE CONCRETO												

Elaboro: Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Isidro Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por
Administración

OBSERVACIONES

EL PROGRAMA QUEDA SUETO A MODIFICACIONES POR FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIAL POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y/O EFECTOS METEOROLOGICOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

INICIO

OBRA: DGO/ISC-Adm/O-0037-10

PROGRAMA:

ZONA: ORIENTE

UBICACION: REMODELACION DE PLAZA CONSTITUCION 1917, NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

HOJA: 3

DE: 3

CONCEPTO	PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20-SEPTIEMBRE-2010 AL 25-OCTUBRE-2010											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL EN KIOSKO												
ARMADO DE ACERO CON VARILLA DE 3/8", 1/2" Y ANILLOS DE ALAMBRO DE 1/4" PARA CONSTRUCCION DE ARCOS												

Elaboro: Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Ismael Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración

OBSERVACIONES

EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES POR FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIAL POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y/O EFECTOS METEOROLOGICOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES

INICIO



OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

PROGRAMA: PIM

ZONA: ORIENTE

UBICACION: REMODELACION DE PLAZA CONSTITUCION 1917, NAVARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

HOJA: 1

DE: 2

CONCEPTO	PERIODO DE SUMINISTRO DE MATERIALES: AÑO 2010											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CEMENTO												
ARENA												
GRAVA												
TEPETATE												
PINTURA EN POLVO												
VARILLA DE 3/8", 1/2", ALAMBRE RECOCIDO Y ALAMBRO DE 1/4"												

Elaboro: 
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por
Administración

OBSERVACIONES

EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES POR FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIAL POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y/O EFECTOS METEOROLOGICOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10 PROGRAMA: PIM

UBICACION: REMODELACION DE PLAZA CONSTITUCION 1917, NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

ZONA: ORIENTE

HOJA: 2 DE: 2

CONCEPTO	PERIODO DE SUMINISTRO DE MATERIALES: AÑO 2010											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TEJA TIPO COLONIAL												
TABIQUE ROJO RECOCIDO												

Elaboro: Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martinez Davalos
Subdirector de Construcción


Ing. Jose-Israel Dominguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración

OBSERVACIONES
EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES POR FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIAL POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y/O EFECTOS METEOROLOGICOS



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALTILLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO INICIO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA CALLE DONDE SE ESTARA TRABAJANDO EN LA
RECONSTRUCCION DEL ARROYO CON CONCRETO HECHO EN OBRA
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 1 DE 5

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Lázaro
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



62



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



REPORTE FOTOGRAFICO INICIO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA CALLE DONDE SE ESTARA TRABAJANDO EN LA
RECONSTRUCCION DEL ARROYO CON CONCRETO HECHO EN OBRA
OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 2 DES

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



REPORTE FOTOGRAFICO INICIO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA CALLE DONDE SE ESTARA TRABAJANDO EN LA
RECONSTRUCCION DE BANQUETAS
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 3 DE 5


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Román Zavaleta
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO INICIO

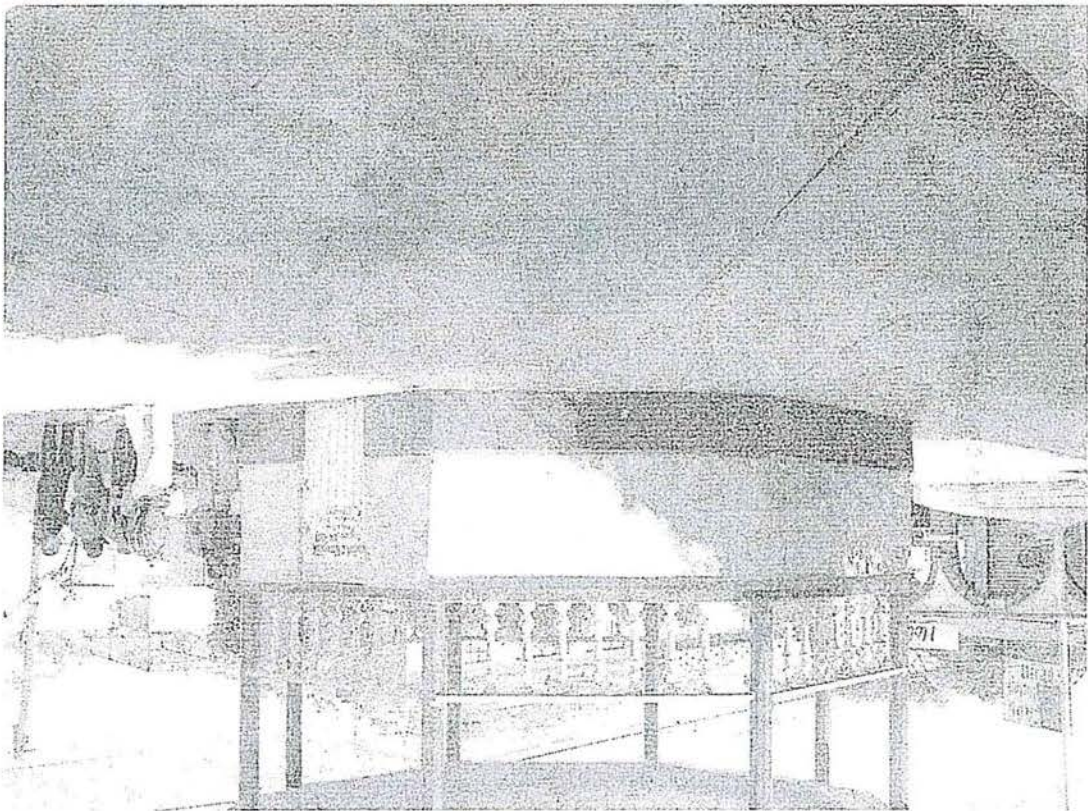

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO EL AREA FRENTE AL KIOSKO DONDE SE ESTARA TRABAJANDO
EN LA RECONSTRUCCION DE BANQUETAS
OBRA: DGOPI/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 4 DE 5

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Ramirez Davalos
Subdireccion de Construccion


Ing. Jose Ismael Dominguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administracion



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



REPORTE FOTOGRAFICO INICIO

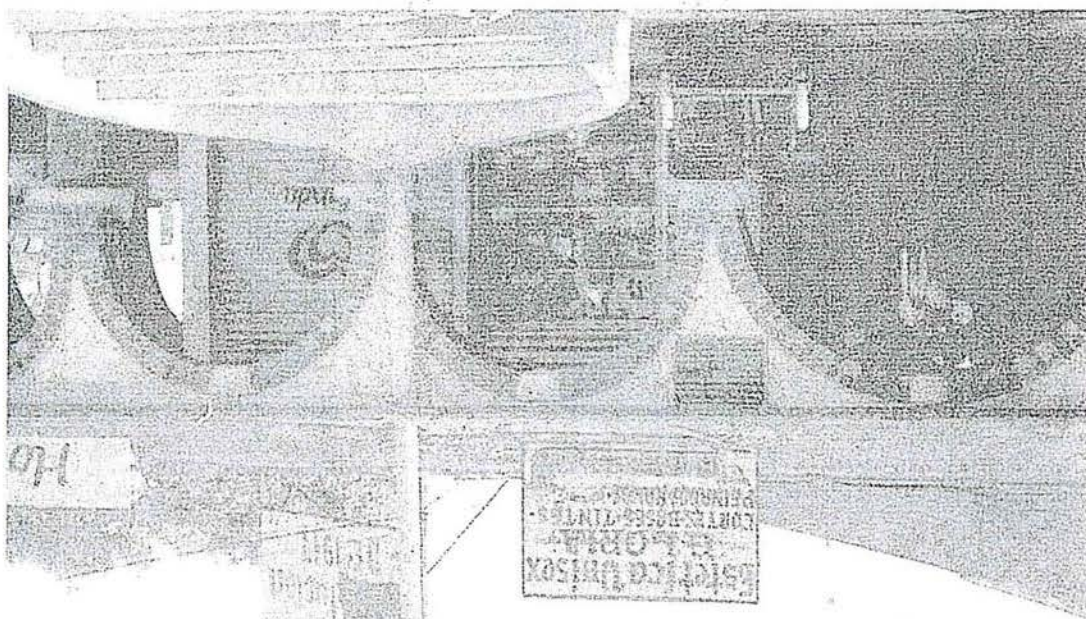

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO EL AREA DEL MERCADO DONDE SE COLOCARA PARTE DE LA
TEJA TIPO COLONIAL
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 5 DE 5

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. Ismael Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración

No. DE OBRA		DGOP/SC-Adm/O-0037-10	UBICACION		NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI	FECHA	20-Sep-10	NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACION DE PLAZA CIVICA		COLONIA:	CONSTITUCION DE 1917	
ZONA		ORIENTE		NOTA No.		1						
CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA CON LA RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, ESPESOR DE 0.18 MT, RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150, KG/CM2, CONSTRUCCION DE DADOS, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" PARA ARCOS Y COLOCACION DE TEJA SOBRE KIOSKO CON UNA UBICACION DE CALLE NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI, COLONIA CONSTITUCION DE 1917, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, DONDE EL MUNICIPIO APORTARA LA MANO DE OBRA EN SU TOTALIDAD, HERRAMIENTA, NECESARIA Y CIMBRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO ARENA, GRAVA Y EL ACERO NECESARIO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN UN PERIODO DE 36 DIAS NATURALES SE ASIENTA EN LA BITACORA QUE LA PLANTILLA PARA EL ESTAMPADO DEL CONCRETO SERA PROPORCIONADA POR EL C. SANTIAGO LABRA PRESIDENTE DEL COPACI DE ESTA COLONIA, ASI COMO ALGUNOS MATERIALES FALTANTES PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA.												
CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DEL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI), TENIENDO FACULTAD PARA REALIZAR CUALQUIER ANOTACION AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:												
C.MARIO MONTIEL AVILA. CONTRALOR SOCIAL A.												
C. ESTEBAN JUAN PEREZ ROSAS. CONTRALOR SOCIAL B.												
C. ROSARIO JOSEFINA GUTIERREZ ALMANZAN. CONTRALOR SOCIAL C.												
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA												
SUPERVISOR DE LA ZONA												
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA												
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION												
RESPONSABLE DE LA OBRA												
ING MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS												
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION												
DETALLE CONSTRUCTIVO												

BITACORA DE OBRA

89

DE ALTA CONSTRUCCION

Se realiza la supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde el día de hoy se inician los trabajos en cuestión de la demolición de las banquetas con la máquina Retroexcavadora JM-059 del Operador Mario Atila Montero, indicándole cual framo se están trabajando y así mismo se le pide al operador de la máquina que todo el escombros se deposite sobre la calle de haredo para posteriormente sea retirado por otro lado se toman algunas fotografías de todos estos trabajos elaborados el día de hoy.

COLONIA:	Constitución de 1917
UBICACION	Barrio Potosí
	Mayatit/haredo y San
NO. DE OBRA	360P/SC-Adm/0-0037-10
ZONA	Oriente
FECHA	23-Septiembre-2010
NOTA NO:	02
FRENTE	3-1

No. DE OBRA		D60P/SC-Adm/0-0037-10	
UBICACION		Nayarit/Haro y San. Luis Potosi	
COLONIA:		Constitución de 1917	
ZONA	Arce	FECHA	24-Septiembre-2010
NOTA No:		03	

Se lleva a cabo visita técnica a la obra arriba mencionada, con la finalidad de chequear los trabajos del retiro del escombro producto de la demolición de Banquetes, por parte de la maquina Retroexcavadora con numero econo- mico DM-059 del operador Mario Avila Montero y con apoyo de los camiones DM-011 del operador Julian Chavar Suarez, DM-012 del operador Apolinar Maya Zúñiga, el DM-021 del operador Angel Alvarado Sanchez y el DM-029 del operador Juan Carmelo Barron Mangel, los cuales retiran un aproximado de 24.0 M3 de escombro, así mismo se le pide al operador de la maquina que continúe demoliendo lo faltante de banquetes.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

RESPONSABLE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

[Redacted]

[Redacted]

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

[Redacted]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

los niveles están marcados.

termina de demoler comienza con la nivelación del terreno ya que

así mismo se le da la indicación al Maestro Albañil de que en cuanto

2. Ayudantes en el área donde no puede entrar la maquinaria

que se están elaborando por parte de 1 Maestro Albañil y

para chequear los trabajos de demolición con medios manuales

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada,

COLONIA: Constitución de 1917

Luis Potosí

UBICACION: Magarita/Laredo y San

No. DE OBRA: D60P/SC-Adm/0-0037-10

NOTA No:

04

FECHA

27-Septiembre-2010

ZONA

Opiente

FRENTE

D-1

BIACORRA DE OBRA

92

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA
Contralor Social G

[Handwritten signature]

DM-024 del operador Juan Carmelo Barron Rangel.

Zuniga, DM-011 del operador John Chaves Suarez y el

y los camiones de volteo DM-012 del operador Apollinar Mayra

con la retroexcavadora DM-059 del operador Maria Ayila Montero

producto de la demolición de banquetas con medios mecánicos

del kiosko, por otro lado son retirados 78.0 M3 de escombros

de obras por administración, en el tramo (area) alrededor

1 Maestro Albanil y 3 Ayudantes personal del departamento

nivelación del terreno que se está elaborando por parte de

menionada, lugar donde se puede observar los trabajos de la

Se lleva acabo supervisión técnica a la obra arriba

COLONIA: Constitución de 1917

Luis Potosí

UBICACION: Magarita / Barrio y San

No. DE OBRA: DGO P/SC-Adm/0-0037-10

NOTA No: 05

FECHA:

28 Septiembre - 2020

ZONA

Oriente

FRENTE

D.1

BITACORA DE OBRA



BITACORA DE OBRA

NO. DE OBRA	2608/5C-Adm/0-0037-10
UBICACION	Agartit / Laredo y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitución de 1917
ZONA	Oriente
FRENTE	D-1
FECHA	29 Septiembre - 2010
NOTA No:	06

Se realiza visita técnica al lugar de la obra arriba mencionada donde se les da la indicación a los trabajadores del departamento de obras por administración 2 Maestros Albañiles y 5 Ayudantes de demoler las banquetas que están sobre la calle de Agartit, ya que por parte de algunos vecinos estaban brindando el apoyo a los trabajadores Frente al Centro Comunitario, así como de retirar las banquetas que están sobre estas banquetas, por otro lado se marca sobre la carpeta asfáltica el área de los huecos que se deberán de realizar en cuestión de la excavación que sera de (1.0 x 1.0 Mts) y así para la construcción de los dados y así de replantar los arcos que están programados.

[Signature]

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA
Contralor Social B

DETALLE CONSTRUCTIVO

[Signature]

NO. DE OBRA	D60P/SC-ADM/0-0037-10	ZONA	Oriente	FRENTE	3-1
UBICACION	Nagait/Haredo y San Luis Potosi	FECHA	30-Septiembre-2010		
COLONIA:	Constitucion de 1917	NOTA No.:	07		

Se lleva acabo supervisión tecnica a la obra

arriba señalada donde se pueden observar los trabajos

de nivelacion del terreno y así como el corte de la carpeta

asfáltica con una cortadora del H. Ayuntamiento para la

excavacion de los 4 bucos de los arcos, así mismo se

homan fotografias de los trabajos elaborados por parte

de los trabajadores del H. Ayuntamiento 2 Maestros Albañiles

y 5 Agudantes, así mismo se checan los niveles del

terreno y la preparacion de este para programar

algunos materiales y comenzar con el cobo de banquetas.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

RESPONSABLE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde el día de hoy son entregados algunos materiales como son: 8 piezas de varilla de $\frac{3}{8}$ ", 4 piezas de varilla de $\frac{1}{2}$ ", 30 kilos de Alambra de $\frac{1}{4}$ " y 15.0 kilos de Alambre Recocido y 6.0 M3 de Grava en el camión DM-027 del operador José Mario Cuevas Galindo, así como 12.0 M3 de Arena y 6.0 M3 de Grava en el camión DM-026 del operador Roberto Cano Sierra, ya que estos materiales se utilizarán para la construcción de 2 Arcos y para comenzar con el colado de algunos tramos de banquetas, haciendo la adalación al C. Santiago Labrada, Presidente del COPACI de esta colonia que el concreto no llegará la aplicación de pintura en polvo ya que este material no fue conseguido por el, y que el estampado del concreto se

NO. DE OBRA	DG0815C-Adm/0-0037-10
UBICACION	Magari/Arado y San Luis Potosí
COLONIA:	Constitución de 1917
ZONA	Oriente
FECHA	01-October-2010
NOTA No:	08
FRENTE	D-1

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

del 20 %

Realizar con la planilla que nos fue proporcionada por el
señor Santiago, por otro lado se toman algunas fotografías
donde se puede apreciar los trabajos que hasta el día
de hoy se han elaborado en esta obra, dando un avance

COLONIA:

Constitución de 1917
Luis Patosi

UBICACION

Mayarí / Carretera y San

No. DE OBRA

D60815C-Adm/0.0037-10

NOTA No:

FECHA

01-Octubre-2010

ZONA

Oriente FRENTE D-1

[Handwritten signature]

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

[Handwritten signature]

Albanillo y S. Ayudantes.

de los arcos, realizando estos trabajos 2 Maestros
empesar con la habilitación del acero para la construcción
se comienza a cortar la varilla que se tiene en obra para
de la planilla, así mismo se les da la indicación de que
por administración en secciones de 0.83 mts que es la medida
elaborándose con trabajadores del departamento de obras
150 kg/cm², con un espesor de 0.10 mts, los cuales están
del colado de las banquetas con concreto hecho en obra de f.c.
pueden apreciar los trabajos que se están realizando en cuestión
Se lleva acabo visita técnica al lugar de la obra, donde se


No. DE OBRA D60P15C-Adm/0-0033-10
UBICACION Mayarit/Karedo y San
Luis Potosí
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente FRENTE D-1
FECHA 02-04-2010
NOTA No: 09

NO. DE OBRA	D60P/5C-Adm/0-0037-10
UBICACION	Magari / Maredo y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitucion de 1917
ZONA	Orente
FECHA	04-October-2010
NOTA No:	10
FRENTE	D-1

Se realiza supervision tecnica al lugar de la obra arriba senalada, donde se puede apreciar que se continuan los trabajos del colado con trompo de las banquetas con concreto hecha en obra (estampado), por parte de los trabajadores del H. Ayuntamiento 2 Maestros albaniles y 6 Ayudantes, asi mismo se toman algunas fotografias donde se pueden apreciar estos trabajos, por otro lado de la indicacion a los trabajadores de que todo el acero que se esta habilitando para los arcos se quede guardado dentro del centro comunitario.

RESPONSABLE DE OBRA	TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA	





EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SE REUNEN LOS C.C. SANTIAGO LABRADA ORTA Y ROSARIO GUTIÉRREZ ALMANZA INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD CONSTITUCIÓN DE 1917, ASÍ COMO, ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA E ING. FELIPE JACOME ORTIZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EL LIC. JUAN CARLOS PÉREZ SAAVEDRA SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

QUE DERIVADO DEL ATRASO QUE EXISTE EN LA OBRA DENOMINADA BICENTENARIO QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA "CONSTITUCIÓN DE 1917", LA CUAL CONSISTE EN LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA MISMA, EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MANIFIESTA SU INCONFORMIDAD Y SOLICITA QUE SE CONCLUYA DICHA OBRA, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE AGREGADOS. POR LO QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS INDICA QUE LA OBRA YA ESTÁ EN UN 90% DE AVANCE, FALTANDO SOLAMENTE LAS TEJAS DEL MERCADO Y KIOSCO, POR LO QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- 1.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SE COMPROMETE A REINTEGRAR LOS CARROS DE ARENA QUE RESULTEN DEL CALCULO DE GENERADORES, COMENZANDO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL PRESENTE CON LA ENTREGA DE DOS CAMIONES DE ARENA PARA QUE SE CONTINUE CON LOS TRABAJOS Y EN LA MISMA SEMANA REINTEGRAR EL RESTO QUE RESULTE DE DICHO CALCULO, QUE TENTATIVAMENTE SERIAN OCHO CARROS Y CUATRO METROS MAS EN TOTAL.
- 2.- LA COLOCACIÓN DE LA TEJA DEL MERCADO Y EL KIOSCO SERIA A PARTIR DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, CON UN TIEMPO LIMITE DE QUINCE DIAS A PARTIR DE LA FECHA PARA SU CULMINACIÓN.
- 3.- QUEDA PENDIENTE LA CULMINACIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO DE LO LOCALES QUE POR CAUSAS DE UNA CIMBRA NO SE REALIZO EN SU MOMENTO, POR LO QUE AL MOMENTO QUE SE RETIRE DICHA CIMBRA SE LLEVARA A CABO.
- 4.- EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, SE ENTREGARA UN INFORME TECNICO DE LA OBRA AL DIPUTADO PABLO BASAÑEZ DEL DISTRITO 37, PARA QUE SEA CUANTIFICADO Y REINTEGRADO EL CEMENTO QUE SE UTILIZO EN LA REMODELACION DE LA PLAZA CÍVICA DE ESTA COMUNIDAD.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

SANTIAGO LABRADA ORTA

ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ SAAVEDRA

ING. FELIPE JACOME ORTIZ

NO. DE OBRA	DGP/SC-Adm/0-0037-10
UBICACION	Magarita / Mareo y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitucion de 1917
ZONA	Oriente
FECHA	05-October-2010
NOTA NO:	11
FRENTE	D-1

Se llevo acabo visita tecnica a la obra arriba mencionada, donde el dia de hoy son entregados 10.0 m³ de Arena y 9.0 m³ de Grava en los camiones de volteo con numero economico DM-062 del operador Facundo Diaz Chaparro y en el volteo DM-021 del operador Ivan Camilo Barron, respectivamente. Por otro lado se puede apreciar que ya se tiene el armado de las zapatas para poder derplantar las columnas de los arcos que conste de 12 varillos de 3/8" de 0.85 mts a 0.10 mts, por lo cual el mismo dia de hoy se revelan la plantilla de cimentacion en los 2 primeras huecos por parte de la Maestra Albaril y 3 Ayudantes.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	RESPONSABLE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA	



[Handwritten signature]

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada para chequear los avances que se tienen en los trabajos los cuales son de un 30%, estos se están ejecutando en el área del Kiosko, por parte de los trabajadores del H. Ayuntamiento 2 Maestros Albañiles y 6 Ayudantes en erección del colado de banquetas con concreto hecho en obra estampado de $P=150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.10 Mts de espesor.

COLONIA: Constitución de 1917

Luis Potosí

Nagant/Marido y San

No. DE OBRA D60P/SC-Adm/0003-10

NOTA No.:

12

FECHA

06-October-2010

ZONA

Oriente

FRENTE

D-1

[Handwritten marks]

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

[Handwritten signature]

Se lleva a cabo visita técnica al lugar de la obra arriba mencionada para darle los niveles que se estaban utilizando para la reconstrucción del arroyo vehicular, llegando al acuerdo con el presidente del consejo el C. Santiago habrada de que no se de molera la carpeta asfáltica y que sobre este mismo terreno se tendiera el tepalcate necesario para la nivelación y preparación del terreno para poder cobar, por otro lado se observa que por parte de los trabajadores del presidente del consejo tomarán algunas varillas de $\frac{3}{8}$ " y de $\frac{1}{2}$ " para realizar el armado de unas cadenas que operaran para la cimentación de algunos locales que se construirán al margen de esta obra.

No. DE OBRA D608/SC-Adm/6-m33-10
UBICACION Magart/Laredo y San Luis Potosí
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente
FECHA 07-October-2010
NOTA No: 13

FRENTE D-1

NO. DE OBRA	UGOP/SC-Adm/0-0033-10
UBICACION	Wagait/Laredo y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitucion de 1917
ZONA	Oriente
FECHA	08-04-2010
NOTA No:	14
FRENTE	D-1

Se realiza supervisión técnica al lugar de la obra arriba señalado para llevar acabo las indicaciones correspondientes para la nivelación del terreno con el topógrafo que fue suministrado a esta obra. Nota (Topógrafo se trajo de algunas otras obras donde se está recuperando este material), el cual es fendido en el area donde se estaba realizando el calado del arroyo con concreto hecho en obra de $P_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ estampado con un espesor de 0.18 Mts.

Todos estos trabajos se están elaborando con personal de la cuadrilla del departamento de obras por administración 2 Maestros Albaniles y 4 Ayudantes.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	RESPONSABLE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA	Control Social

No. DE OBRA	D60P15C-Adm/0-0037-10
UBICACION	Algarit/Arredy y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitucion de 1917
ZONA	Orientale
FECHA	09-02-febr-2010
NOTA No:	15

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada donde se chequean los trabajos elaborados en cuestión del colado de algunos tramos de arroyo con concreto hecho en obra de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, estampado con un espesor de 0.18 mts, así mismo se toman algunas fotografías de los trabajos que hasta el día de hoy se han elaborado en esta obra con los 2 Maestros Albanel y 6 Aprendices, integrantes de la cuadrilla del departamento de obras por administración.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA
Contrator Social C.

NO. DE OBRA	6609/SC-ADM/6-6037-40
UBICACION	Municipio / Muro de y San Luis Potosí
COLONIA:	Constitución de 1917
ZONA	Opiente
FECHA	11-October-2010
NOTA No:	16
FRENTE	D-1

Se realiza supervisión técnica al lugar de la obra arriba mencionada, donde el día de hoy se chequean los avances que se tienen con respecto a los trabajos elaborados por los integrantes de la cuadrilla del departamento de obras por administración.

2 Maestros Albañiles y 4 Ayudantes, observándose que se está colando parte de la banquetas faltantes con concreto de $P=150 \text{ kg/cm}^2$ estampado con un espesor de 0.10 mts con el cemento que fue aportado por el Diputado Pablo Basanéz, por otro lado se toman algunas fotografías llegando a un avance del 40%, así mismo son entregados 200 kg de Alambre Recocido, 30.0 kilos de Alambra de $\frac{1}{8}$, 7 varillas de $\frac{1}{2}$, 9.0 varillas de $\frac{3}{8}$ en el camión DM-024 del operador Juan Carmelo Barrón, 7.0 m3 de Grava en el camión DM-026 del operador Roberto Cano, 8.0 m3 de Arena y 7.0 m3 de Grava en el camión DM-012 del operador Apolinar Mejía.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
RESPONSABLE DE OBRA

Controlador Social

No. DE OBRA	760P/SC-Adm/0-0037-10
UBICACION	Magari / Maredo y San Luis Potosi
COLONIA:	Constitución de 1917
ZONA	Oriente
FECHA	12-October-2010
NOTA NO:	17

Se lleva a cabo visita técnica a la obra arriba mencionada, con la finalidad de verificar el armado de las columnas armadas con acero de $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " y alambra de $\frac{1}{4}$ " con una altura de 2.17 mts, llevando a cabo estos trabajos el personal de la cuadrilla del departamento de obras por administración y Maestro Albaril y 2 Ayudantes, así mismo se puede apreciar que se continúa con el trabajo del colado de las banquetas y se prepara parte del terreno para colar el día de mañana el arroyo.

RESPONSABLE DE OBRA	TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
Contralor Social	SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

[Redacted]

Contralor Social

RESPONSABLE DE OBRA

[Redacted]

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

Se realiza supervisión técnica al lugar de la obra arriba mencionada, donde el día de hoy se puede apreciar que se están elaborando los trabajos del colado del arroyo con concreto hecho en obra de $f' = 200 \text{ Kg/cm}^2$, con un espesor de 0.18 Mts, así mismo se toman algunas fotografías donde se pueden observar estos trabajos e la hora dos por la cuadrilla del departamento de obras por administrarse 2 Maestros Albañiles y 6 Ayudantes.

NO. DE OBRA: DGOP/SC-ADM/0-0033-70
UBICACION: Magant / Barco y San Luis Potosí
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA: Oriente
FECHA: 13-0ctubre-2010
NOTA No.: 18

BITACORA DE OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

Controlador Social B
RESPONSABLE DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

[Redacted]

[Redacted]

[Handwritten signature]

Hernández, Encargado de la oficina en Zona Oriental.
La autorización para llevar a cabo este ajuste al C. Jesus Reyes
por lo cual se le hace saber al C. Santiago habiéndole que se pida
cuenta con un Cargo para la posesión del Smb de esta Iglesia,
de ser 3.29 Mts, esto debido a las festividades parroquiales ya que
arco (columnas) ya que se tiene considerada de 2.17 Mts y esta debiera
del Copaci de esta colonia que se debiera de ajustar la altura del
con arillos de $\frac{1}{4}$ " comentándonos el C. Santiago habiendo, Presidente
el armado de las columnas con Suerillas de $\frac{3}{8}$ " y Suerillas de $\frac{1}{2}$ "
cien 2 Maestras Albariles y 6 Aguadentes, los cuales están elaborando
encuentra trabajando personal del departamento de obras por administración.
Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde se

NO. DE OBRA	D608/SC-Adm/0-0037-10
UBICACION	Manantial/Laredo y San Luis Potosí
COLONIA:	Constifloración de 1917
FECHA	14-October-2010
NOTA NO:	19
ZONA	Oriente
FRENTE	D-1

ELABORADO POR OBRA

110

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

SUPERVISOR DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE OBRA

Contralor Social B

[Redacted area]

[Redacted area]

de obra del 45%.

así mismo se forman algunas bobogafías y se da un avance poco más de varilla de $\frac{3}{8}$ " y así poder realizar este trabajo, una altura de 3.29 Mts para lo cual se les proporcionará un

6 Ayudantes de que modifiquen el armado de las columnas a Finalidad de darle la indicación a los 2 Maestros Albañiles y a los Se lleva acero uiste técnica a la obra arriba mencionada con la

COLONIA:

Construcción de 19/7

UBICACION

Luis Potosí
Margarit / Lurda y San

No. DE OBRA

D60P/SC-Adm/0-0037-10

ZONA

Oriente

FRENTE

D-1

FECHA

15-Abril-2010

NOTA No:

20

BITACORA DE OBRA

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

No. DE OBRA		D60P/SC-Adm/0-0033-10	
UBICACION		Nogait/Karado y San Luis Potosi	
COLONIA:		Constitución de 1917	
ZONA		Oriente	
FECHA		16-October-2010	
NOTA No:		21	

Se lleva acabo visita técnica al lugar de la obra arriba mencionada, donde se verifican los trabajos del colado del arroyo con concreto hecho en obra de $f'c=200\text{ kg/cm}^2$ estampado por parte de los trabajadores del H. Ayuntamiento, 2 Maestros Albañiles y 6 Ayudantes los cuales se han encargado de realizar todos los trabajos programados en esta obra, así mismo se toman algunas fotografías de todos estos, por otro lado con entregadas algunas materias les como son: Svarillas de $\frac{3}{8}$ ", 20.0 kg de Alambre Recocido en el camión de volteo DM-027 del operador Jose Mario Cuevas Galindo, 12.0 m³ de Arena y 12.0 m³ de Grava en el camión DM-014 del operador Julian Chavez Suarez.

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE OBRA
Control Social C

ELABORA DE OBRA

1/2

RESPONSABLE DE OBRA



Trabajo 2 Maestros Albaniles y 4 Aguaceros los

Siendo el ftramo nivelado de 50 m2, realizando este

Constitución de 1917

hals Post

~~Nagarit/Harede y San~~

D608/5C-ADM/00037-10

~~18-Oct/10-2010~~

FRONT

D-1

BITACORA DE OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

Se realiza la supervisión técnica a la obra arriba mencionada para chequear los trabajos que se están efectuando con los materiales que fueron suministrados el pasado día sábado; observándose que se continúan los tramos de arroyo colándose con concreto hecho en obra estampado de $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, con los trabajadores del H. Ayuntamiento (Gueadilla), por otro lado se les comen a los trabajadores de que nivelan el último tramo faltante y así tener toda la obra terminada en cuestión de trazo y nivelación del terreno, así mismo se hace la entrega de 12.0 m³ de Arena en el camión de volteo DM 021 del operador Angel Alvarado Sanchez y 12.0 m³ de Grava en el camión DM-026 del operador Roberto Cano Sierra H. Trabajando en la obra 2 meses ~~Anteriores~~ y 6 Ayudantes.

COLONIA:	Constitución de 1917
UBICACION	Magarit / Laredo y San Luis Potosí
No. DE OBRA	D60P/SC-Adm/a-0037-70
ZONA	Oriente
FECHA	16-October-2010
NOTA No:	22
FRENTE	1.1

ELABORADA POR

114

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

[Redacted signature]
RESPONSABLE DE OBRA
Contrator Social C.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

Se lleva acabo visita tecnica al lugar de la obra con la finalidad de chequear los avances de los trabajos que cuentan con un 65%, con respecto a la reconstrucción de banquetas con concreto estampado hecho en obra de 150kg/m² asi mismo se aprecia al personal de la cuadrilla de este departamento 2 Maestros Albariles y 4 Ayudantes realizando el colado de algunos tramo de arroyo.

NO. DE OBRA D60P15C-Adm/0-0037-10
UBICACION Nayarit/Laredo y Son Luis Potosi
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente
FECHA 19-October-2010
NOTA No: 23

ELABORACION DE OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

[Redacted signature]
RESPONSABLE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

[Redacted signature]
RESPONSABLE DE OBRA

[Handwritten signature]

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada donde se puede apreciar que se continúan con los trabajos del colado del arroyo con concreto estampado hecho a obra de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, por parte de los trabajadores de la cuadrilla de este departamento 2 Maestros Albañiles y 6 Ayudantes, por otro lado se toman algunas fotografías de todos los trabajos que hasta el día de hoy se han podido realizar en esta obra.

COLONIA: Constitución de 1917
UBICACION: Magarita/Lurdo y San Luis Potosí
No. DE OBRA: D608/SC-Adm/0-0033-70

NOTA No: 24
FECHA: 20-October-2010
ZONA: Oriente
FRENTE: D-1

ELABORADA POR OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

[Redacted]

Contrata Social C

RESPONSABLE DE OBRA

[Redacted]

SUPERVISOR DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

[Handwritten signature]

de diámetro de 1/4"

armado con varillas de 3/8" y varillas de 1/4" con anillos

realizadas en esta obra, donde se puede apreciar el

arco, tomando fotografías de todos estos trabajos

pado, así como el armado de la Trabe faltante del segundo

carrage con concreto hecho en obra de $P_c = 200 \text{ kg/m}^2$, están

Albaniles y 6 Ayudantes, en cuestión del calado del

de la cuadrilla de este departamento 2 Maestros

checan los trabajos elaborados por los trabajadores

Se lleva acabo visita técnica a la obra donde se

COLONIA: Constitución de 1917

San Luis Potosí

Algarit/Laredo y

No. DE OBRA D60P/SC-Adm/0-0037-10

NOTA No:

25

FECHA

24. Octubre - 2010

ZONA

Oriente

FRENTE

D-1

BITAOPRA DE OBRA

117

No. DE OBRA 1609/SC-Adm/0-0037-70
 UBICACION Magarit / Marado y San Luis Potosi
 COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente FRENTE D-1
 FECHA 22-October-2020
 NOTA No: 26

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde el día de hoy se comienza a

trabajar en la colocación de la Teja Tipo Colonial sobre el area del Riocho, por parte de los trabajadores de la cuadrilla de este departamento y Maestro Albañil

y 3 Ayudantes, así mismo se toman algunas fotografías donde se puede apreciar estos trabajos, así mismo se da un avance del 75% con respecto a lo que se tiene programado en esta obra haciendo la entrega de

6.0 M3 de Grava en el camión D180 del operador Miguel Cano Negro, 5.0 M3 de Grava en el camión D122 del operador Mario Cuevas Galindo, 10.0 M3 de Grava en el camión D14

del operador Julian Chavez Suarez
 TEC-JAVIER VARGAS ESPINOSA
 SUPERVISOR DE OBRA
 RESPONSABLE DE OBRA
 Contralor Social

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

[Handwritten signature]

Faltantes

5.0 piezas de varilla de 3/8" en el camion DH-011 del
operador Julian Chavez Suarez y 0:250 toneladas de
Cemento en este mismo camión, ya que con estos
materiales se continuara colando parte del arroyo

COLONIA:

Constitución de 1917

UBICACION

Magisterio/Laredo y San Luis Potosi

No. DE OBRA

DG08/SC-Adm/00037-10

NOTA No.:

FECHA

22-October-2010

ZONA

Oriente FRENTE D-1

DETALLE CONSTRUCTIVO

No. DE OBRA D609/5-C-Adm/0-0037-70
 UBICACION Algodón/Laredo y San Luis Potosí
 COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente
 FECHA 25-Octubre-2070
 NOTA No.: 27

Se lleva a cabo visita técnica a la obra arriba mencionada con la finalidad de chequear los trabajos de la colocación de la teja en el kiosko, así como el estado de la frabe del arco, con concreto de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ por parte de los trabajadores de la cuadrilla del departamento de obras por administración

2 Maestros Albañiles y 6 Ayudantes, tomando algunas fotografías de todos estos trabajos.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
 SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

Contralor Social C.

121

NO. DE OBRA DGOP/SC-ADM/0-0037-10
UBICACION Mayorit/Laredo y San Luis Potosi
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente
FECHA 26-October-2010
NOTA NO: 28

FRENTE D-1

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde se le da la indicación al personal de la cuadrilla y Agudantes de este departamento de obras por administración de retirar toda la madera que se utilizo para cimbras en la construcción de los arcos y en la elaboración del arqueo, así mismo son suministrados algunos materiales para continuar con el colado del arqueo.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

Contralor Social

NO. DE OBRA	DG0P/5C-Adm6-0037-10
UBICACION	Magant/Laredo y San Luis Potosi
COLONIA:	Construcción de 1917
ZONA	Oriente
FECHA	27-October-2020
NOTA No:	29
FRENTE	D1

Sr. Llevo acabo visita técnica al lugar de la obra
arriba señalada para chequear los trabajos de la
colocación de la teja sobre el kiosko por parte de los
trabajadores de la cuadrilla de este departamento
I Maestro Albarril y 3 Ayudantes, así mismo se da
un avance del 80% y se toman algunas fotografías
de estos trabajos.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

Constru las Social C

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

Se realiza supervisión técnica a la obra arriba mencionada, donde el día de hoy son entregados 6.0 m³ de arena en el camión DM los del operador Aurelio Diaz Chaparr con la finalidad de que con este material se continúen los trabajos de la colocación de la Teja sobre el mercado así mismo se da un avance del 85 %, realizan de estos trabajos / Maestros Albanel y 2 Aguadantes.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE OBRA
Contralor Social B

[Redacted signature]

[Redacted signature]

NO. DE OBRA	D60P/5C-Adm/0-0037-10
UBICACION	Miguel Alemán y San Luis Potosí
COLONIA:	Constitución de 1917
FECHA	29-October-2010
NOTA No:	30
ZONA	Oriente
FRENTE	D-4

BITACORA DE OBRA

193

194

Nº. DE OBRA D608/5C-Adm/0-0033-10
 UBICACION Lagarita/Moredos San Luis Potosi
 COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente FRENTES D-1
 FECHA 03- Noviembre - 2010
 NOTA Nº: 31

Se lleva a cabo visita técnica a la obra arriba mencionada donde se continúan realizando los trabajos de la colocación de Teja por parte de los trabajadores de la cuadrilla de obra pública y Maestro Albaril y 2 Ayudantes, así mismo se toman algunas fotografías de todos estos trabajos, por otro lado se le comento al presidente del COPACI de esta colonia el C. Santiago Habrada que ya se va a terminar el cemento y no se podrán continuar los trabajos.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
 SUPERVISOR DE OBRA

CONTRALOR SOCIAL B
 RESPONSABLE DE OBRA

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	RESPONSABLE DE OBRA
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Redacted]</i>
SUPERVISOR DE OBRA	Contador Social B

Estando presentes en el lugar de la obra, arriba mencionada conjuntamente con el presidente del caporal el C. Santiago habrada, se le hace de su conocimiento que apartir del día de hoy se detendran los trabajos debido a la falta de materiales, como tambien esta persona que ha estado lo posible para conseguir el material y así concluir los trabajos programados en esta obra, quedandose ya un 90% de avance.

NO. DE OBRA	UBICACION	COLONIA:
D608/5C-Adm/0-0037-10	Magariñ/Karedo y San Luis Potosi	Constitución de 1917
ZONA	FECHA	NOTA No.:
Grande	05. Noviembre - 2010	32
FRENTE		
JY		

BIEN POR LA OBRA

125

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE OBRA
Contrab Social B

[Redacted]

[Redacted]

Se realiza visita técnica al lugar de la obra, arriba mencionado
nada donde se platica con el C. Santiago Irujo Presidente
del Corral de esta colonia, con la finalidad de saber
si ya se cuenta con los materiales faltantes para
seguir trabajando, haciéndonos saber que para el día
15 de Diciembre de este año se le estarán entregando
algunos materiales, así mismo nos entregó una copia
de la petición del material faltante dirigida al
Diputado local el C. Pablo Bazariz García.

No. DE OBRA D60P05C-Adm lo-0037-10
UBICACION Magart/Kareby San
Luis Potosí
COLONIA: Constitución de 1917

ZONA Oriente
FECHA 23- Noviembre -2010
NOTA No: 33

BITACORA DE OBRA

TLALNEPANTLA DE BAZ, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2010

C. PABLO BAZAÑEZ GARCIA
DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO XXXVII

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA USTED UN AFECTUOSO SALUDO DEL C. SANTIAGO IVAN LABRADA ORTA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COL. CONSTITUCION DE 1917.

ASI MISMO ME PERMITO SOLICITARLE SU APOYO CON EL CEMENTO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DEL BICENTENARIO, LA CUAL CONSTA DE LA AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA Y CONSTITUIDA EN NUESTRA LOCALIDAD COMO PLAZA 5 DE FEBRERO, OBRA QUE SERA COMPARTIDA CON EL LIC. ARTURO UGALDE MENESES, POR ESTE MOTIVO A TRAVEZ DE ESTE MEDIO HAGO LA SOLICITUD DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA PODER TERMINAR LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO ESTAN INCONCLUSOS POR FALTA DE EL CEMENTO, AL NO HABER SIDO ENTREGADO A TIEMPO PARA LA INAUGURACION EL 15 DE SEP. O EL 20 DE NOV. ESPERAMOS COMPRENDIA LA URGENCIA DE LA SOLICITUD DE ESTE OFICIO PARA PODER TERMINAR ESTA OBRA A LA BREVEDAD POSIBLE, LA CANTIDAD DE CEMENTO REQUERIDO EN BASE A REPORTE TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, ES DE 9.800 TONS. NUEVE TONELADAS 800 KG.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU ATENCION PRESTADA, AGRADECIENDO SU PARTICIPACION Y SU APOYO EN LA OBRA DEL BICENTENARIO RESALTANDO QUE POSTERIORMENTE LE HAREMOS LLEGAR UN OFICIO DE AGADECIMIENTO.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE COPACI, PERIODO 2010-2012

Recibo
24/10/2010

[Handwritten signature]

DETALLE CONSTRUCTIVO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

RESPONSABLE DE OBRA
Contralor Social B



[Handwritten signature]

a realizarse en esta obra.

Fecha de por terminada al 100% de todo lo programado
los materiales entregados en esta obra, por lo cual con este
fisco de todo los trabajos y así poder hacer la comprobación de
el día de hoy, por otro lado se lleva acabo el levantamiento
se tomar algunas fotografías de estos trabajos elaborados
trabajos 3 Maestros Albañiles y 9 Ayudantes por lo cual
como la colocación de la teja sobre el mercado, realizando estos
lo cual se continúa con el colado del tramo de bodega, así
camión de volteo DM-011 del operador Julian Chavez Suarez, por
día de hoy con entregados 6.0 m3 de Arena con code AC-218 en el
Se realiza supervisión técnica a la obra, se menciona, donde el

No. DE OBRA 3609/Sc-Adm/0-0037-10
UBICACION Magarita/Barreda y San
Luis Potosí
COLONIA: Construcción de 1917

NOTA No.: 34
FECHA 15-Diciembre-2010
ZONA Oriente
FRENTE D-1

ELABORADA POR OBRA

128



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

RESUMEN DE OBRA

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGOP/SC-	
ADM/O-0037-10	
HOLA: 1 DE: 18	
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARGO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON.	
FIRMA	
TEC.	

- 1.- DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $\Sigma = 61.25 \text{ M}^3$
- 2.- DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR
 $\Sigma = 80.10 \text{ M}^3$
- 3.- EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE DADOS PARA ARCOS
 $\Sigma = 4.0 \text{ M}^3$
- 4.- RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACION
 $\Sigma = 145.35 \text{ M}^3$
- 5.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
 $\Sigma = 1,413.65 \text{ M}^3$
- 6.- RECONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR.
 $\Sigma = 80.10 \text{ M}^3$
- 7.- RECONSTRUCCION DE ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 DE 0.18 MTS DE ESPESOR.
 $\Sigma = 110.26 \text{ M}^3$
- 8.- CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DE DADOS.
 $\Sigma = 1.37 \text{ M}^3$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

RESUMEN DE OBRA

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGC/ISC-	
ADM/O-0037-10	
H.O.A: 2 DE 18	
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5.547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADYON.	
FIRMA:	
TEC.	

- 9.- CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DECOLUMNAS.
 $\Sigma = 6.44 \text{ M}^3$
- 10.- CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DE TRABES.
 $\Sigma = 1.79 \text{ M}^3$
- 11.- COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL SOBRE KIOSKO Y MERCADO.
 $\Sigma = 159.60 \text{ M}^2$
- ACERO DE 3/8" , 1/2" , 1/4" Y ALMBRE RECOCIDO
- VARILLA DE 3/8" 122.41 KG
VARILLA DE 1/2" 194.32 KG
ALAMBRE 1/4" 211.44 KG
ALAMBRE RECOCIDO 55.00 KG



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

SIMBOLOGIA Y DATOS

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPISC-
ADM/O-00023

HOJA: 3 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADJON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

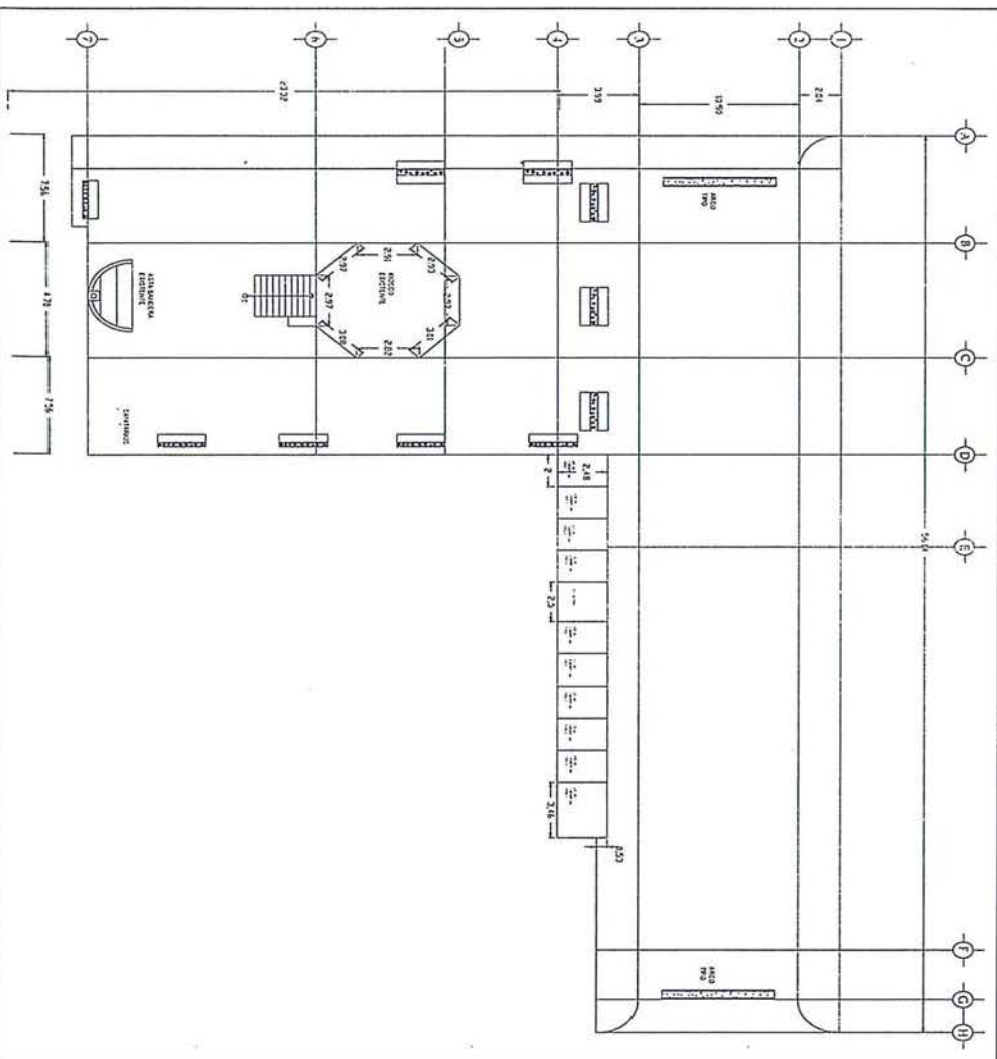


ARROYO DE
CONCRETO DE F'c=

200 KG/CM2

BANQUETA DE CONCRETO
ESTAMPADO DE F'c= 150
KG/CM2

ARROYO CON CONCRETO
ESTAMPADO DE F'c= 200
KG/CM2

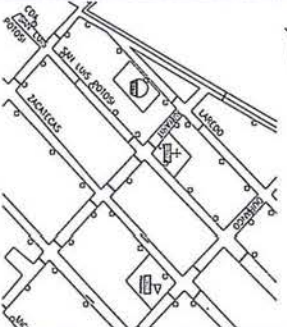

3



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM


DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOPISC-Adm/O-0037-10
HOJA: 4 DE: 18

COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAVARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI
DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE ROBERTO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADJON

SUPERVISOR TÉCNICO
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

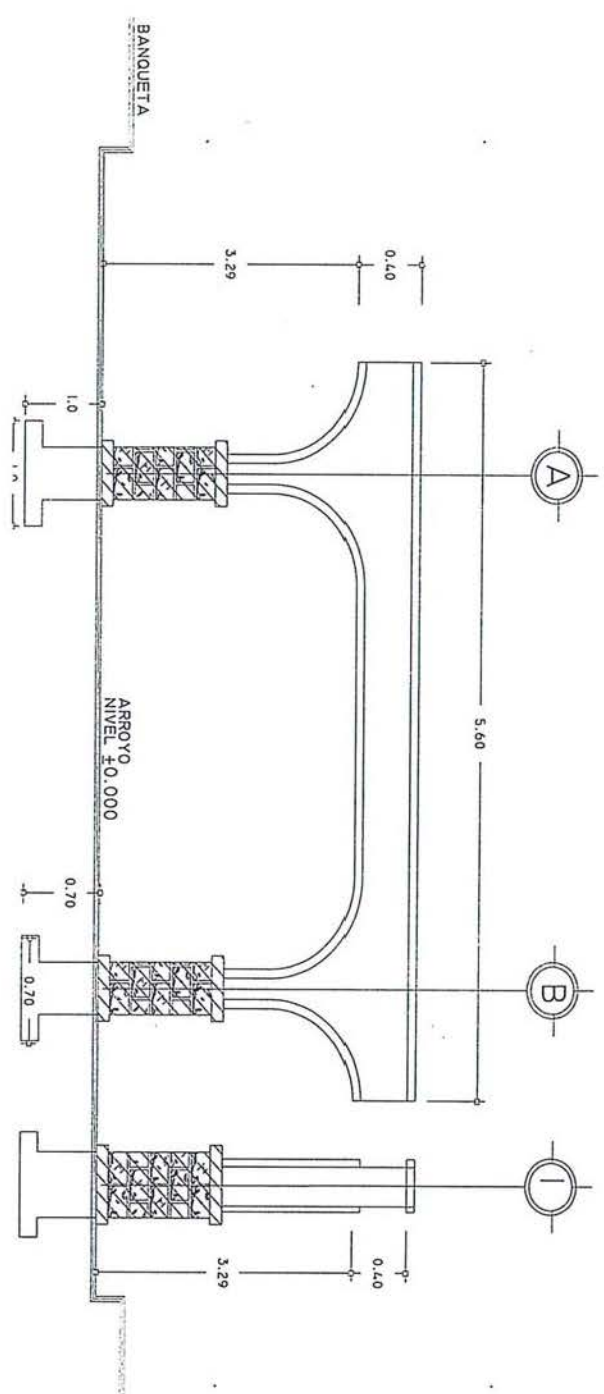



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-ADM/O-0037-10

HOLAS 5 DE: 16

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ROBERTO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

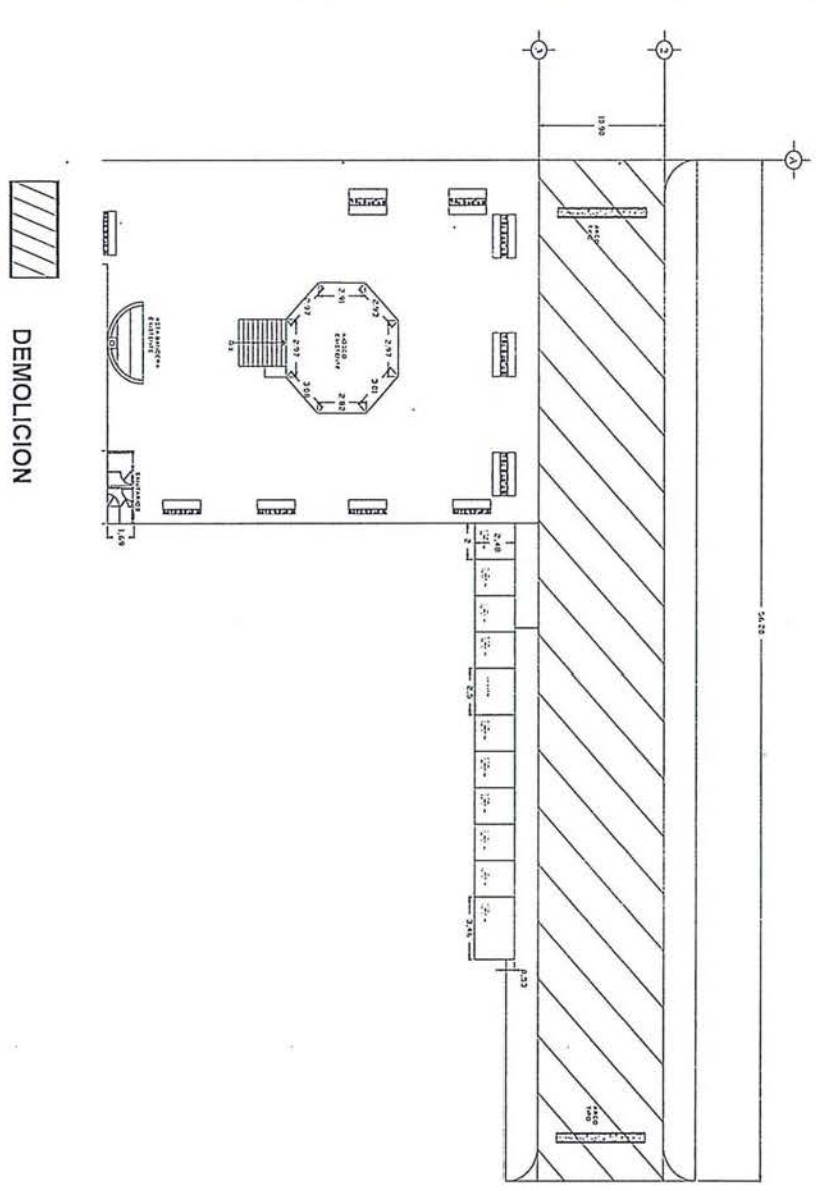



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TEMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DOGOP/SC-Adm/O-0037-10	
HOJA: 6 DE 18	


COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE ROBERTO DOMINGUEZ ZAVALA JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS ESPESOR

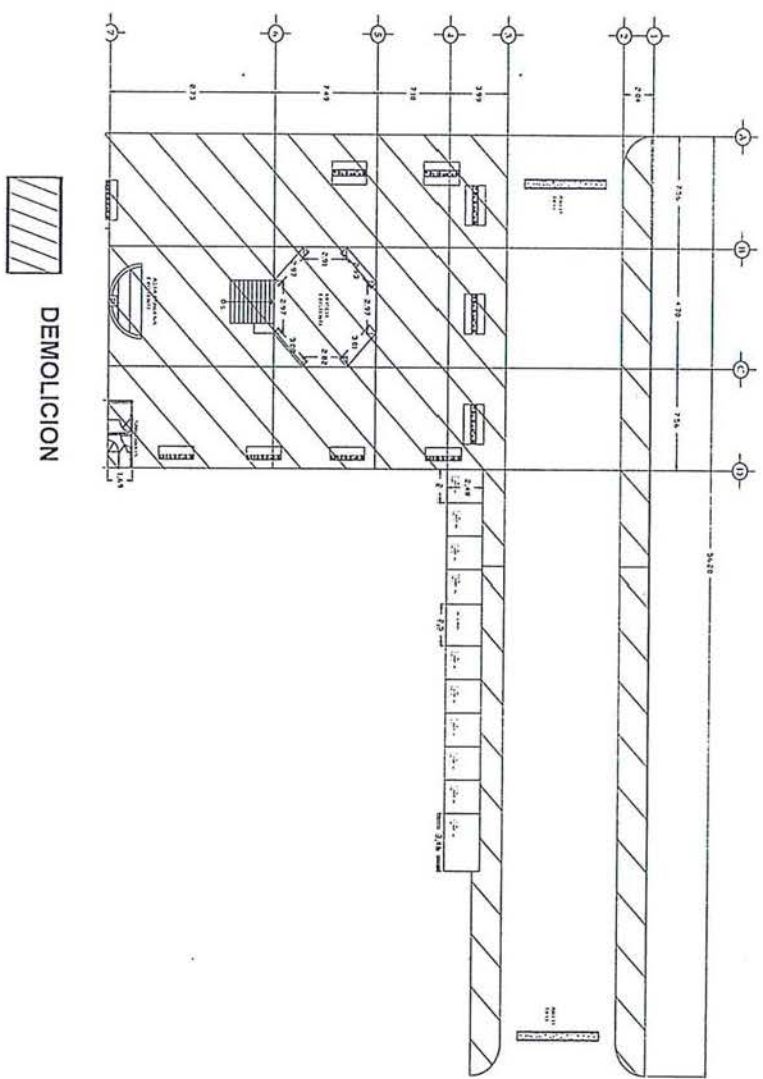



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: EXCAVACION PARA COLOCACION DE ARCOS

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOJA: 7 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSEPH ELIZABETH ZAVALLA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON


SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA



EXCAVACION

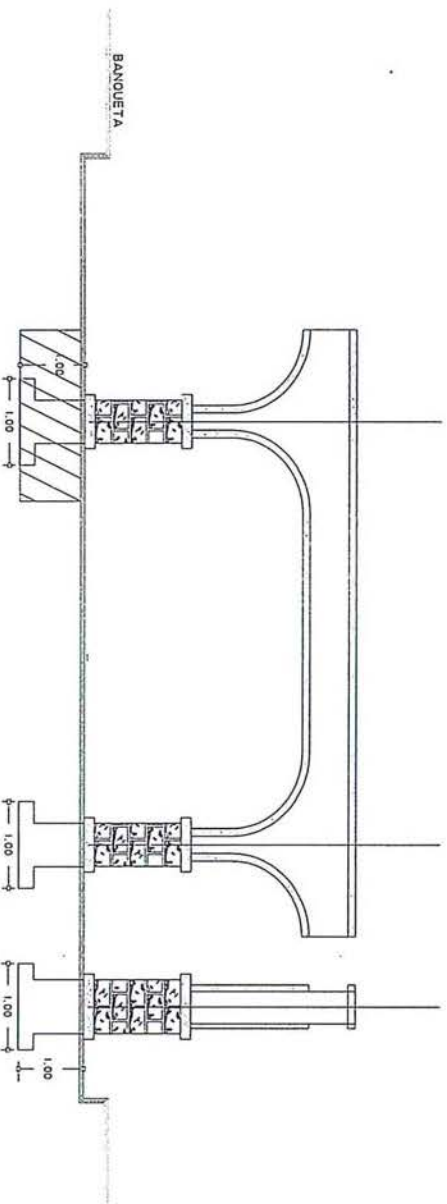



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/ISC-Admin/O-0037-10

HOJA: 8 DE: 16

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA

JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMIN


SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE ARROYO, BANQUETA Y EXCAVACION

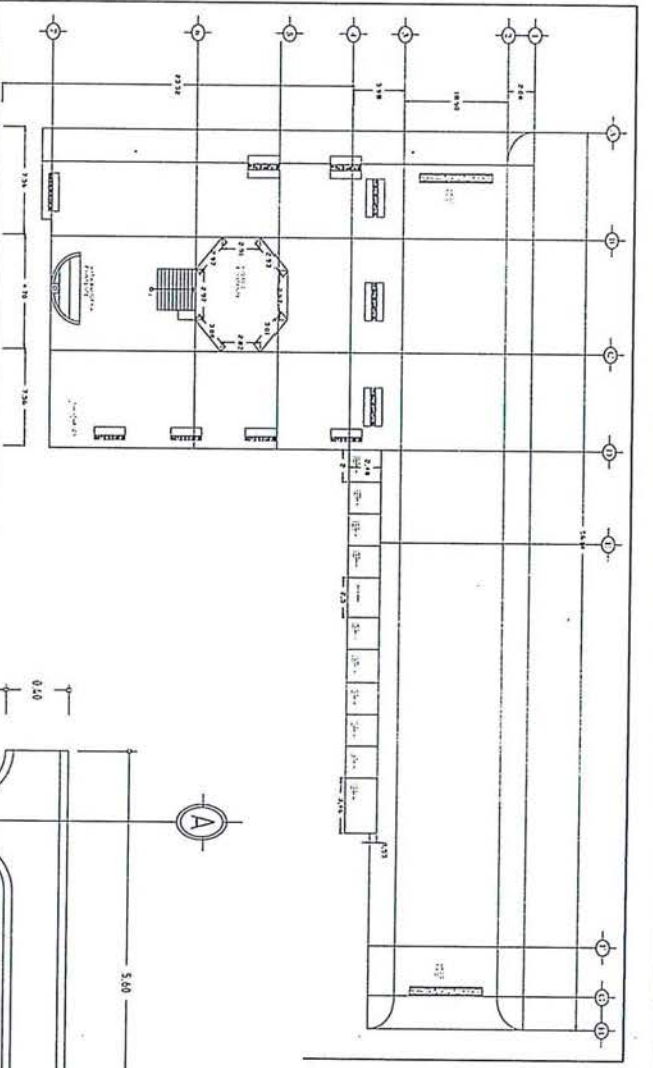

RETIRO DE ESCOMBRO

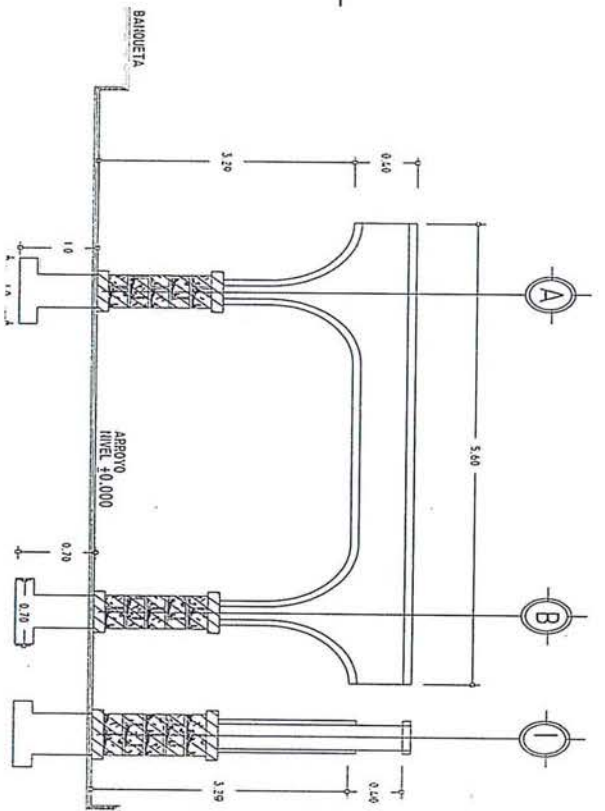



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

TLALNEPANTLA, ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOLA: 9 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIAOA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIAOA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSÉ ISRAEL GONZALEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

TRAZO Y NIVELACION

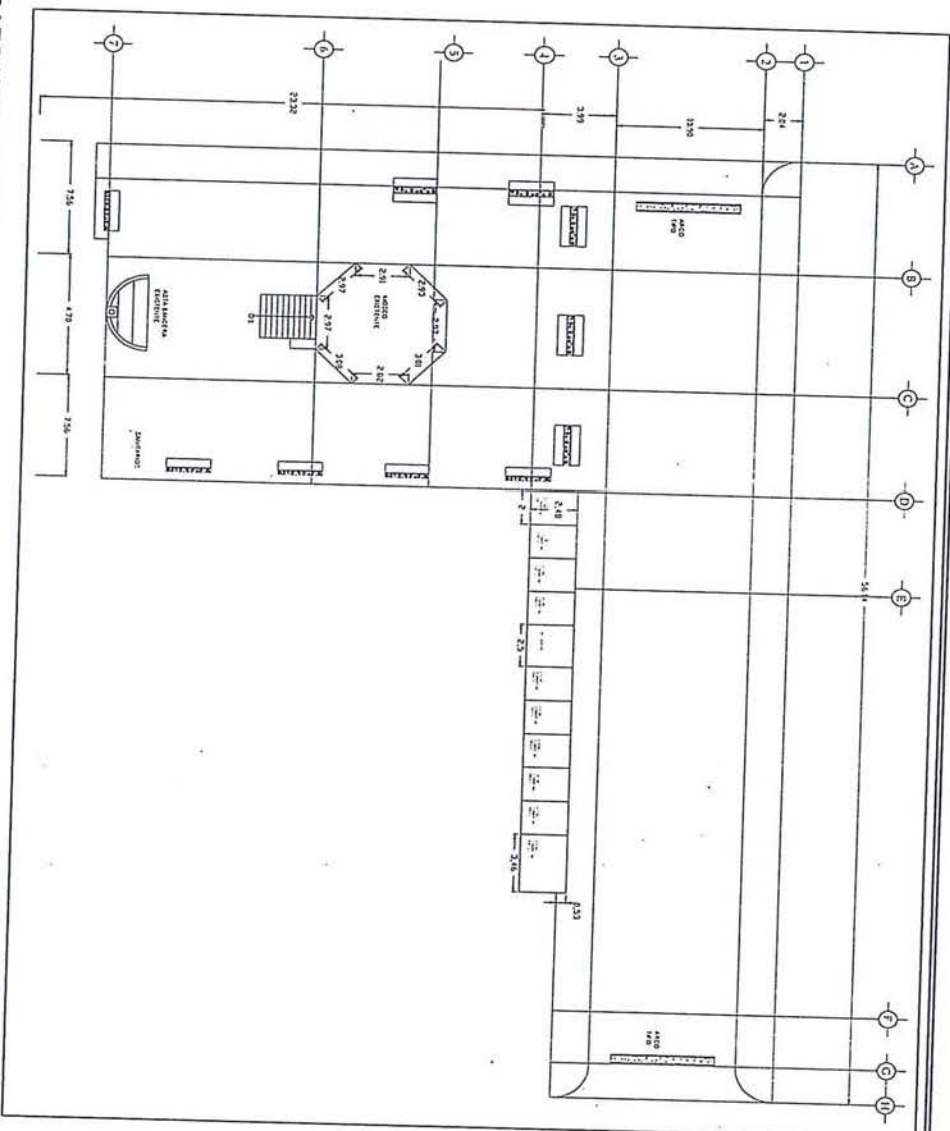



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



ENERADOR DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: RECONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS ESPESOR

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOJA: 10 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSÉ GUILLERMO DOMÍNGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TÉCNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

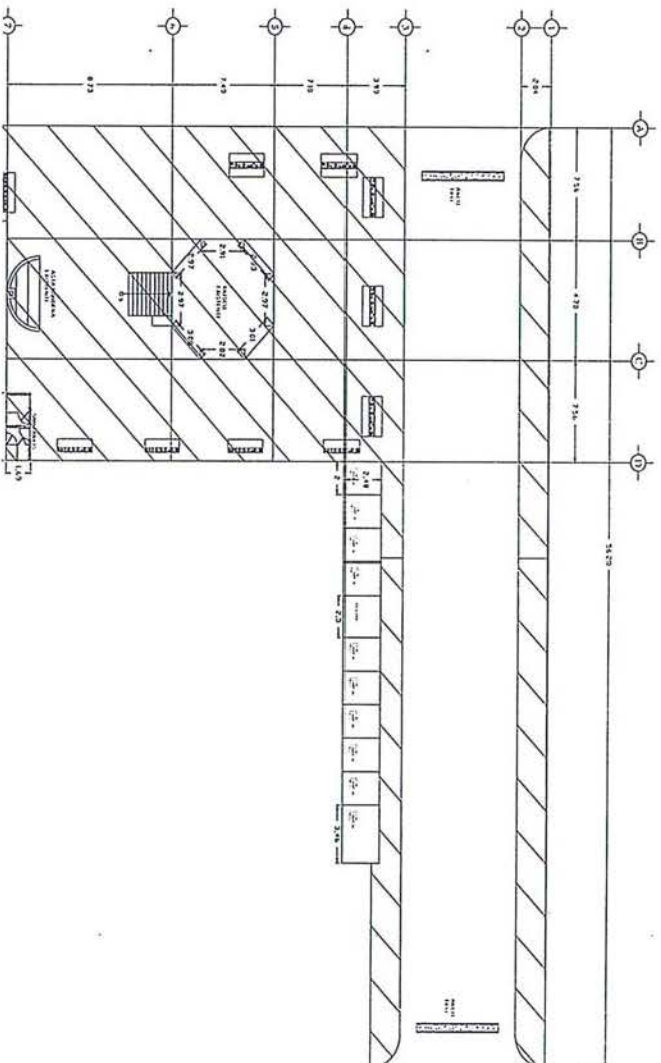

RECONSTRUCCION DE BANQUETA

158



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOPISC-Adm/O-0037-10

HOLA: 11 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION


ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE IGNACIO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2"

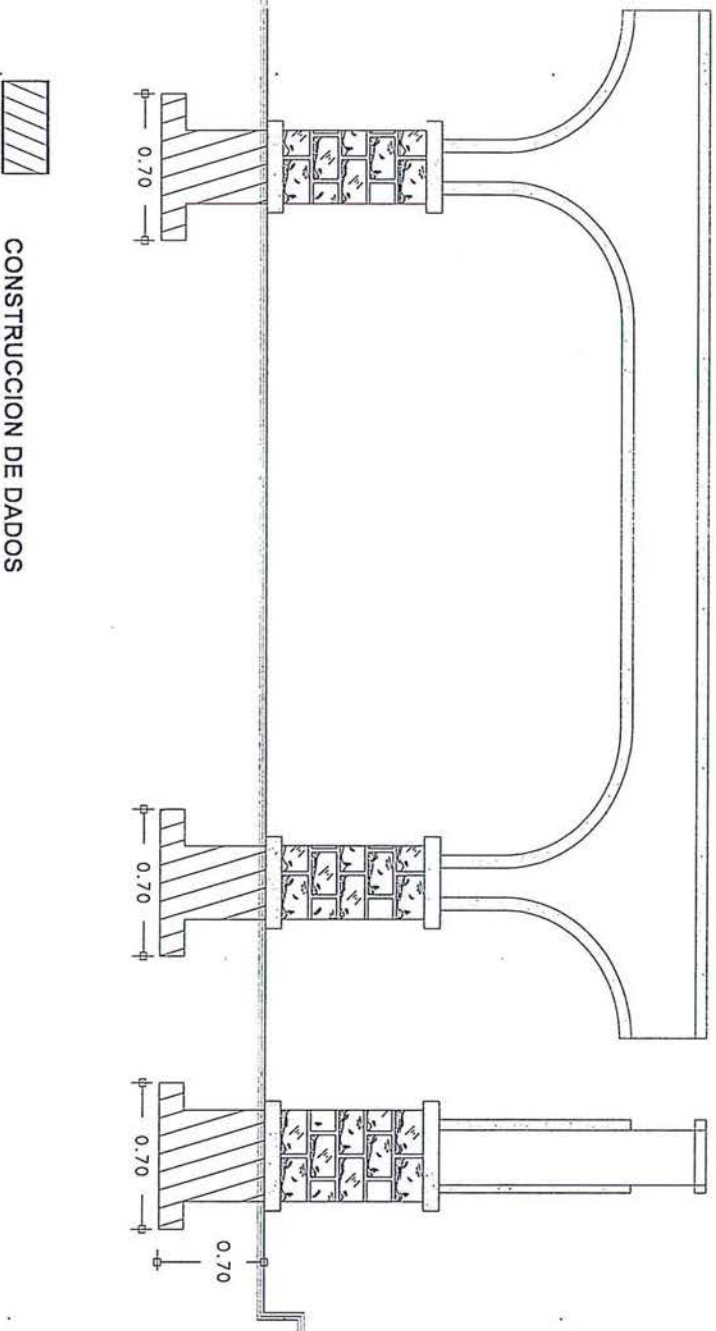

135



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA, ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
HOJA: 12 DE: 18


COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACION: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE ERNESTO DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2"

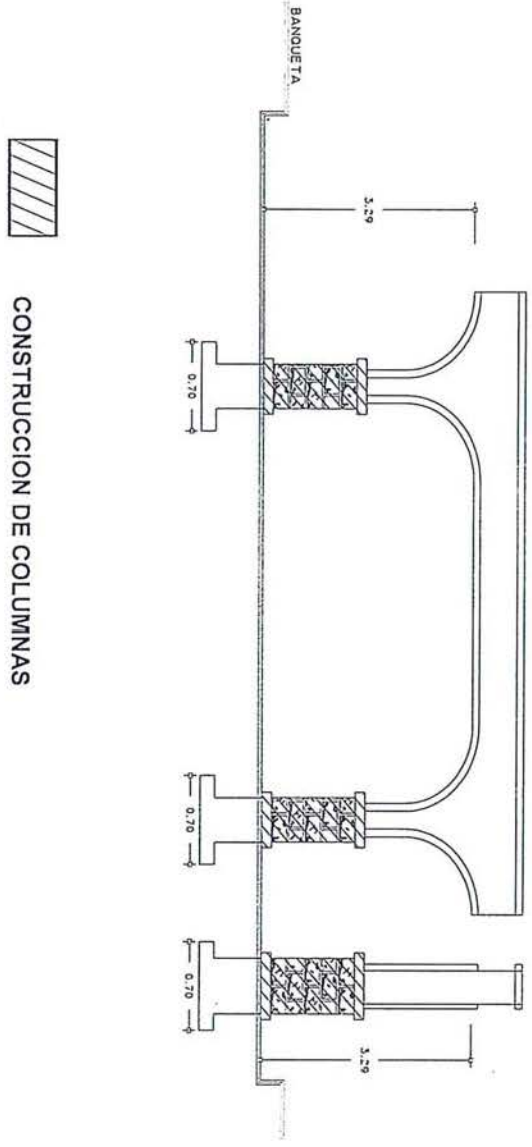

CONSTRUCCION DE COLUMNAS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA
CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
HOJA: 13 DE: 18

COMUNIDAD:
CONSTITUCION DE 1917
UBICACIÓN: NAYARIT
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS
POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACIÓN

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. JOSE ISRAEL DOMINQUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON


SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRABES DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2"



CONSTRUCCION DE TRABES

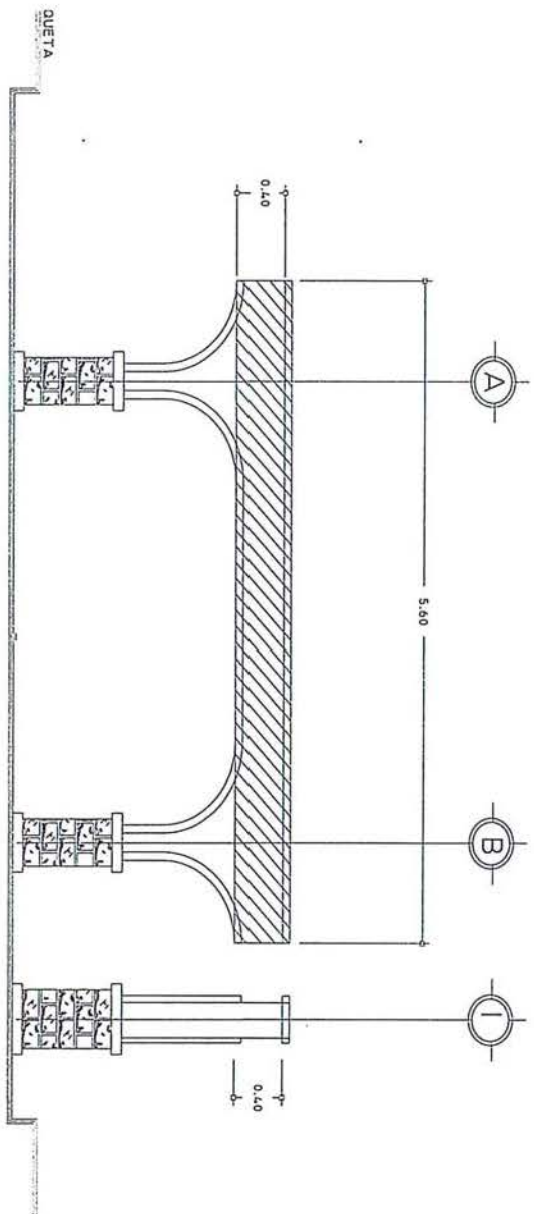



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

HOJA: 14 DE: 18

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAVARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547

AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION


ING. JOSE GABRIEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

DESCRIPCION: RECONSTRUCCION DE ARROYO ESTAMPADO CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 0.18 MTS. DE ESPESOR

RECONSTRUCCION DE ARROYO

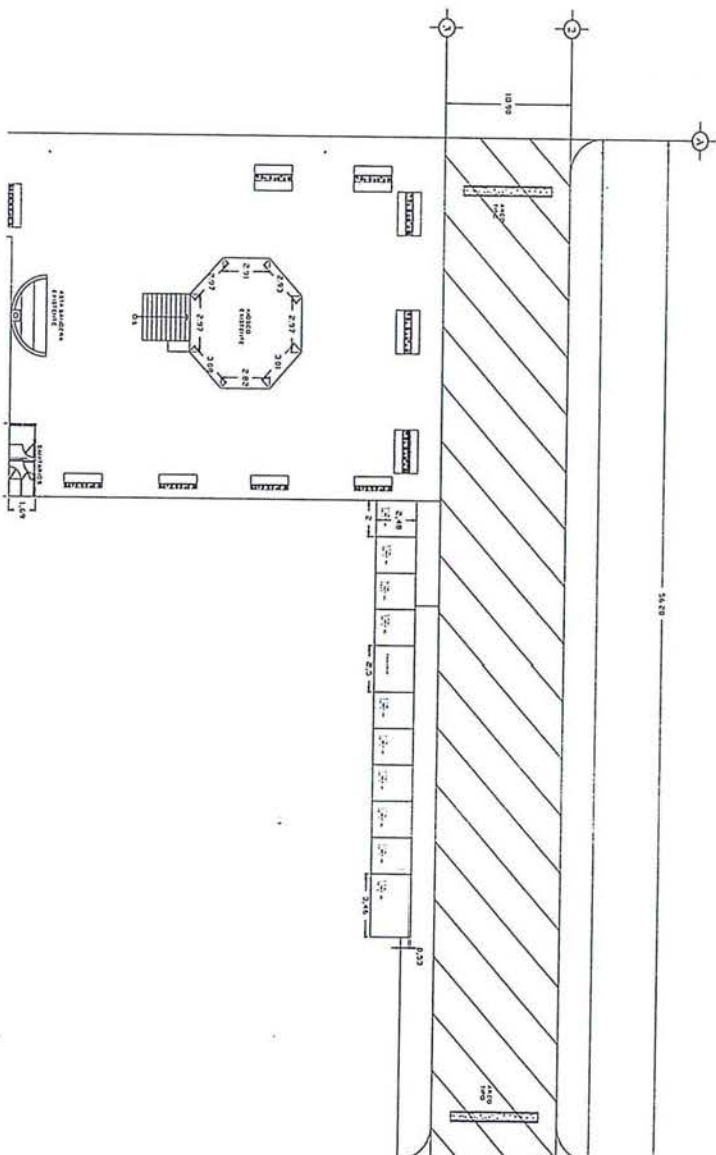

14/10/10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO		DESCRIPCION: COLOCACION DE TEJA EN KIOSKO Y MERCADO	
TLALNEPANTLA: ORIENTE			
PROGRAMA: PIM			
DATOS DE LA OBRA			
CLAVE: DGOP/SC-Adm/O-0037-10			
HOJA: 15 DE: 18			
COMUNIDAD:			
CONSTITUCION DE 1917			
UBICACIÓN: NAVARIT			
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS			
POTOSI			
DATOS DE LA COMUNIDAD			
POB. BENEFICADA DIRECTAMENTE: 1000			
POB. BENEFICADA INDIRECTAMENTE: 5,547			
AUTORIZACIÓN			
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DANALOS SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION			
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON			
SUPERVISOR TÉCNICO			
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA			

243



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGOP/SC-	
ADWO: 0037-10	
FOLIA: 16 DE: 18	
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1003	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON.	
FIRMA:	
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

1.- DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR

$$\begin{aligned} 19.82 \times 23.32 &= 462.20 \\ 2.04 \times 56.20 &= 114.64 \\ 3.99 \times 56.20 &= 224.23 \\ \hline \Sigma &= 801.07 \text{ M}^2 \times 0.10 = 80.10 \text{ M}^3 \end{aligned}$$

2.- DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS DE ESPESOR

$$10.90 \times 56.20 = 612.58 \text{ M}^2 \times 0.10 = 61.25 \text{ M}^3$$

3.- EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE DADOS

$$1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 1.0 \times 4 \text{ PIEZAS} = 4.0 \text{ M}^3$$

4.- RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION

$$\begin{aligned} 19.82 \times 23.32 &= 462.20 \times 0.10 = 46.22 \\ 2.04 \times 56.20 &= 114.64 \times 0.10 = 11.46 \\ 3.99 \times 56.20 &= 224.23 \times 0.10 = 22.42 \\ 10.90 \times 56.20 &= 612.58 \times 0.10 = 61.25 \\ 1.0 \times 1.0 \times 1.0 &= 1.0 \times 4 = 4.0 \\ \hline \Sigma &= 145.35 \text{ M}^3 \end{aligned}$$

6.- RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR

$$\begin{aligned} 19.82 \times 23.32 &= 462.20 \\ 2.04 \times 56.20 &= 114.64 \\ 3.99 \times 56.20 &= 224.23 \\ \hline \Sigma &= 801.07 \text{ M}^2 \times 0.10 = 80.10 \text{ M}^3 \end{aligned}$$

5.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

$$\begin{aligned} 19.82 \times 23.32 &= 462.20 \\ 2.04 \times 56.20 &= 114.64 \\ 3.99 \times 56.20 &= 224.23 \\ 10.90 \times 56.20 &= 612.58 \\ \hline \Sigma &= 1,413.65 \text{ M}^2 \end{aligned}$$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGOP/SC-	ADM/O-0037-10
H.O.A: 17	DE: 18
COMUNIDAD:	
CONSTITUCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOYINQUEZ ZAVALA JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS POR ADMON.	
FIRMA:	
TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

- 7.- CONSTRUCCION DE DADOS PARA ARCOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.70 X 0.70 MTS
 $0.70 \times 0.70 \times 0.70 = 0.34 \times 4 \text{ PIEZAS} = 1.37 \text{ M3}$
- 8.- CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA ARCOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.70 X 0.70 MTS
 $0.70 \times 0.70 \times 3.29 = 1.61 \times 4 \text{ PIEZAS} = 6.44 \text{ M3}$
- 9.- CONSTRUCCION DE TRABES PARA ARCOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 MTS
 $0.40 \times 0.40 \times 5.60 = 0.89 \times 2 \text{ PIEZAS} = 1.79 \text{ M3}$
 $\Sigma = \text{CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 } 9.60 \text{ M3}$
- 10.-RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2
CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS.
 $10.90 \times 56.20 = 612.58 \text{ M2} \times 0.18 = 110.26 \text{ M3}$
- ACERO DE 3/8" PARA CONSTRUCCION DE DADOS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS
- 5 VARILLAS DE 3/8" X 0.70 = 3.5 X 4 PIEZAS = 14 ML / 12 = 1.16 PZAS DE 3/8"
 $14 \text{ ML} \times 0.557 = 7.79 \text{ KG DE } 3/8"$
 $(0.60 + 0.60)2 = 2.40 \times 4 \text{ ESTRIBOS} = 9.60 \times 4 \text{ PZAS} = 38.40 \text{ ML}$
 $38.40 \text{ ML} \times 0.248 = 9.52 \text{ KG DE ALAMBRO DE } 1/4"$
- ACERO DE 3/8" PARA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS
- 5 VARILLAS DE 3/8" X 3.29 = 16.45 X 4 PIEZAS = 65.80 ML / 12 = 5.48 PZAS DE 3/8"
 $65.80 \text{ ML} \times 0.557 = 36.65 \text{ KG DE } 3/8"$
 $(0.60 + 0.60)2 = 2.40 \times 17 \text{ ESTRIBOS} = 40.80 \times 4 \text{ PZAS} = 163.20 \text{ ML}$
 $163.20 \text{ ML} \times 0.248 = 40.47 \text{ KG DE ALAMBRO DE } 1/4"$
- ACERO DE 3/8" PARA CONSTRUCCION DE TRABES CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS
- 5 VARILLAS DE 3/8" X 5.60 = 28.0 X 2 PIEZAS = 56.0 ML / 12 = 4.66 PZAS DE 3/8"
 $56.0 \text{ ML} \times 0.557 = 31.19 \text{ KG DE } 3/8"$



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



GENERADOR DE OBRA DE TERMINO

TLALNEPANTLA: ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA	
CLAVE: DGOP/SC-	
ADM/O-0037-10	
HOJA: 18 DE: 18	
COMUNIDAD:	
CONSTRUCCION DE 1917	
UBICACION: NAYARIT	
ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS	
POTOSI	
DATOS DE LA COMUNIDAD	
POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000	
POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547	
AUTORIZACION	
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ	
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	
ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA	
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMIN.	
FIRMA:	
TEC. JAVIER BARRAGAN ESPINOSA	

NUMEROS GENERADORES

(0.40 + 0.40)2 = 1.60 X 28 ESTRIBOS = 44.8 X 2 PZAS = 89.60 ML
89.60 ML X 0.248 = 22.22 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ACERO DE 1/2" PARA CONSTRUCCION DE DADOS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

5 VARILLAS DE 1/2" X 0.70 = 3.5 X 4 PIEZAS = 14 ML / 12 = 1.16 PZAS DE 1/2"
14 ML X 0.996 = 13.94 KG DE 1/2"
(0.60 + 0.60)2 = 2.40 X 4 ESTRIBOS = 9.60 X 4 PZAS = 38.40 ML
38.40 ML X 0.248 = 9.52 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ACERO DE 1/2" PARA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

5 VARILLAS DE 1/2" X 3.29 = 16.45 X 4 PIEZAS = 65.80 ML / 12 = 5.48 PZAS DE 1/2"
65.80 ML X 0.996 = 65.53 KG DE 1/2"
(0.60 + 0.60)2 = 2.40 X 17 ESTRIBOS = 40.80 X 4 PZAS = 163.20 ML
163.2 ML X 0.248 = 40.47 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ACERO DE 1/2" PARA CONSTRUCCION DE TRABES CON ANILLOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS

5 VARILLAS DE 1/2" X 5.60 = 28.0 X 2 PIEZAS = 56.0 ML / 12 = 4.66 PZAS DE 1/2"
56.0 ML X 0.557 = 31.19 KG DE 3/8"
(0.40 + 0.40)2 = 1.60 X 28 ESTRIBOS = 44.8 X 2 PZAS = 89.60 ML
89.60 ML X 0.996 = 89.24 KG DE ALAMBRO DE 1/4"

ARMADO DE ABULTADOS ENTRE COLUMNAS CON ACERO DE 3/8"

10 VARILLAS DE 3/8" X 0.70 = 7.0 X 3 PZAS = 21 X 4 COLUMNAS = 84 ML / 12 = 7 PIEZAS DE 3/8"
84.0 ML X 0.557 = 46.78 KG DE 3/8"

10 VARILLAS DE 1/2" X 0.70 = 7.0 X 3 PZAS = 21 X 4 COLUMNAS = 84 ML / 12 = 7 PIEZAS DE 1/2"
84.0 ML X 0.996 = 83.66 KG DE 3/8"

VARILLA DE 1/2" 18.30 PZAS 194.32 KG DE 1/2"
VARILLA DE 3/8" 18.30 PZAS 122.41 KG DE 3/8"
ALAMBRO DE 1/4" 211.44 KG
ALAMBRE RECOCIDO 55.0 KG

25



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



PROYECTO DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

SIMBOLOGIA Y DATOS

TLALNEPANTLA, ORIENTE
PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC-

ADMIO-00023

FOLIA: 1 DE 2

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACIÓN: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

FOTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE REYES DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

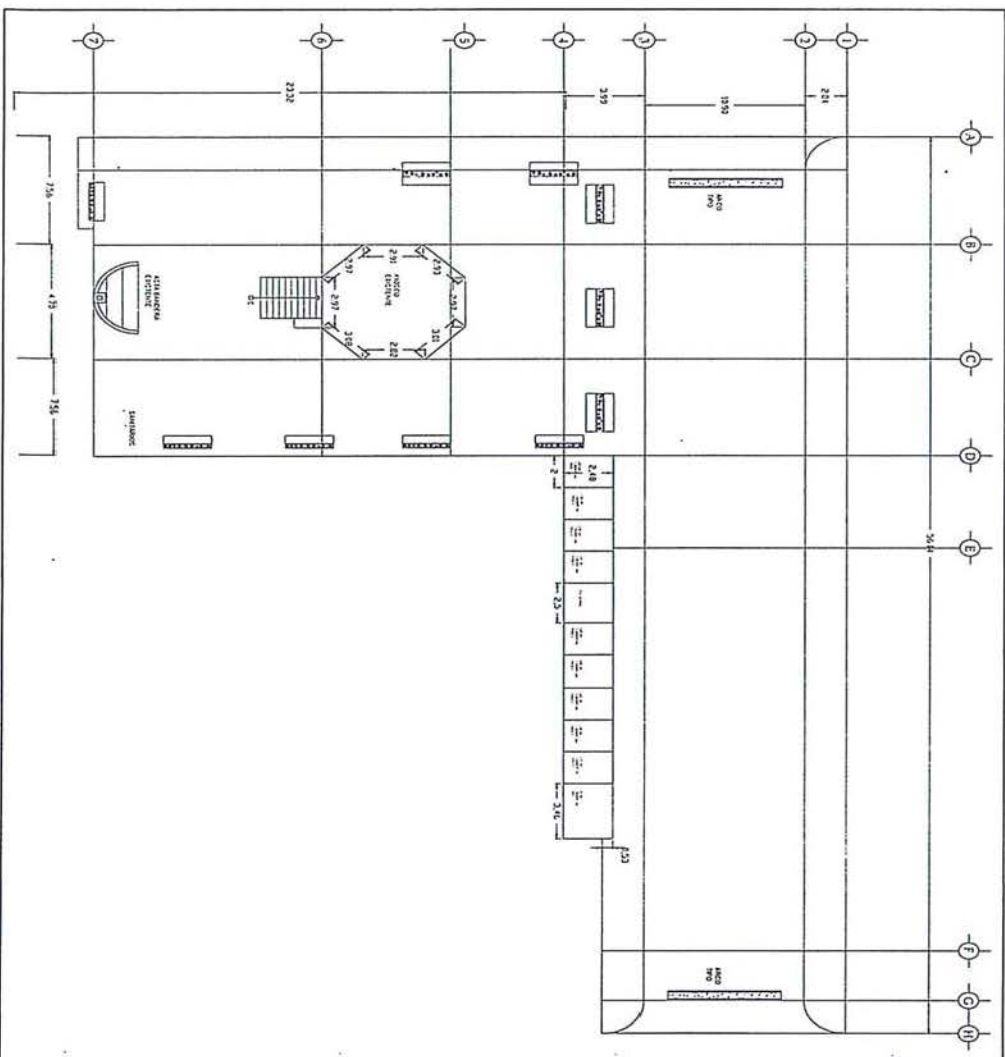



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



PROYECTO DE OBRA DE TERMINO

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

TLALNEPANTLA: ORIENTE

PROGRAMA: PIM

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: DGOP/SC- Adm/O-0037-10

HOJA: 2 DE: 2

COMUNIDAD:

CONSTITUCION DE 1917

UBICACION: NAYARIT

ENTRE: LAREDO Y SAN LUIS

POTOSI

DATOS DE LA COMUNIDAD

POB. BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 1000

POB. BENEFICIADA INDIRECTAMENTE: 5,547


AUTORIZACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS POR ADMON

SUPERVISOR TECNICO

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA

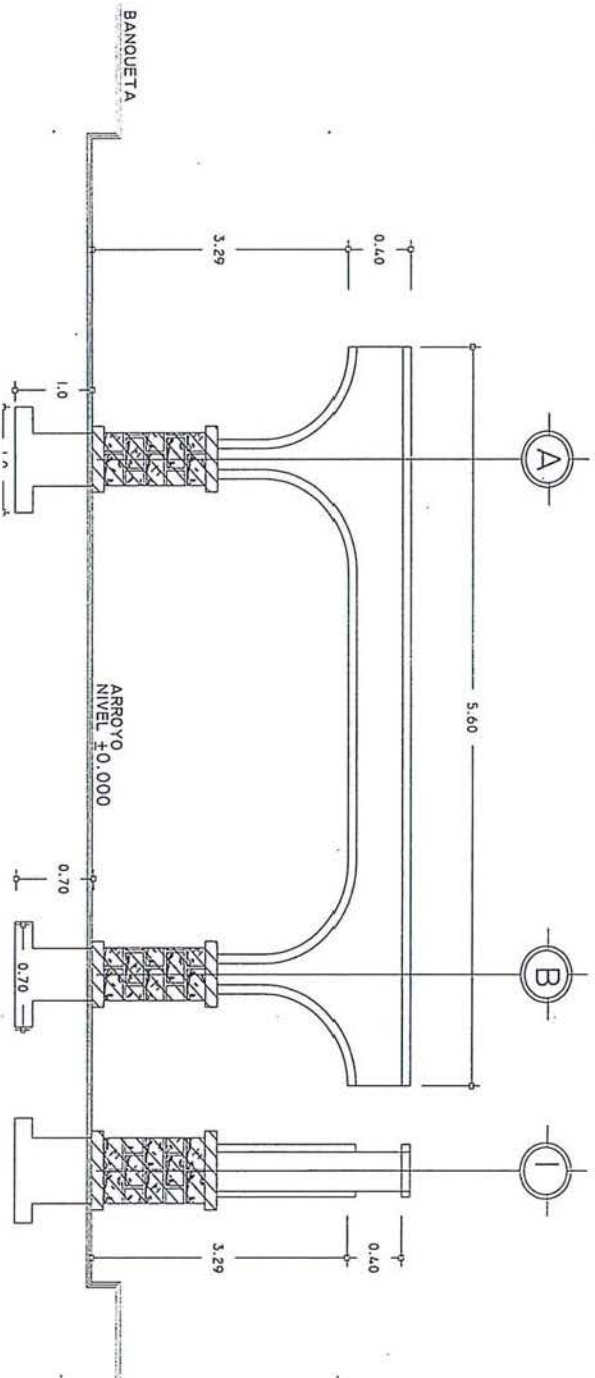

8/11



DEPARTAMENTO DE OBRA POR ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

2009
2012
Municipio de compromisos
TIA NEPANTLA DE BAZ

PRESUPUESTO DE OBRA
TERMINO

PROGRAMA: PIM

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: PLAZA CONSTITUCION DE 1917, NAYARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

CONCEPTO: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

HOJA: 1 DE: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PERIODO DE EJECUCION: 20-SEPTIEMBRE-2010 AL 25-OCTUBRE-2010					
D-01	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.10 MTS DE ESPESOR, QUE INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	61.25	\$53.49	\$3,276.26
D-02	DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	80.10	\$53.49	\$4,284.54
EX-01	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION DE ARCO, QUE INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	4.00	\$43.13	\$172.52
R-01	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA, BANQUETAS Y DE EXCAVACION, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, QUE INCLUYE: MAQUINA, CAMIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	145.35	\$51.75	\$7,521.86
T-01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EJES DE REFERENCIA, HILOS, CLAVOS, CUÑAS DE MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M2	1,413.65	\$3.70	\$5,230.50
AL-01	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS, QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, ASESORIA TECNICA, SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA Y GRAVA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	80.10	\$1,752.83	\$140,401.68
AL-02	RECONSTRUCCION DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO DE F'C=200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA Y GRAVA), ASESORIA TECNICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	110.26	\$1,704.92	\$187,984.47
AL-03	CON VARILLAS DE 3/8", VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS, QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y ACERO) FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	1.37	\$1,704.92	\$2,335.74
AL-04	CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADOS CON VARILLAS DE 3/8", VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS, QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y ACERO) FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	6.44	\$1,704.92	\$10,979.68

Handwritten signature



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRA POR ADMINISTRACION



PRESUPUESTO DE OBRA

PROGRAMA: PIM

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: PLAZA CONSTITUCION DE 1917, NAYARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y LAREDO

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

CONCEPTO: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (PLAZA BICENTENARIO)

HOJA: 2 DE: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------	---------

AL-05	CONSTRUCCION DE TABE DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADOS CON 10 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS. QUE INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y ACERO) FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M3	1.79	\$1,704.92	\$3,051.80
AL-08	COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL EN KIOSKO Y MERCADO, QUE INCLUYE: ASESORIA TECNICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	M2	159.60	\$24.00	\$3,830.40
	ACERO (VARILLA DE 3/8")	KG	122.41	17.64	\$2,159.31
	ACERO (VARILLA DE 1/2")	KG	194.32	\$18.20	\$3,536.62
	ACERO (ALAMBRO DE 1/4")	KG	211.44	\$18.20	\$3,848.20
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	55.00	\$13.17	\$724.35
	TOTAL				\$379,337.93

Supervisor de Obras
Ing. Javier Vargas Espinosa

Jefe de Departamento de Obra por Administración
Ing. José Israel Domínguez Zavala

Subdirector de Construcción
Ing. Marco Antonio Martínez Davalos



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

TLALNEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos



NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HO. A 1 DE

Ing. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Montañez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO
DE LA DEMOLICION DE BANQUETAS
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 2 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirección de Construcción


Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

2012
TLANEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

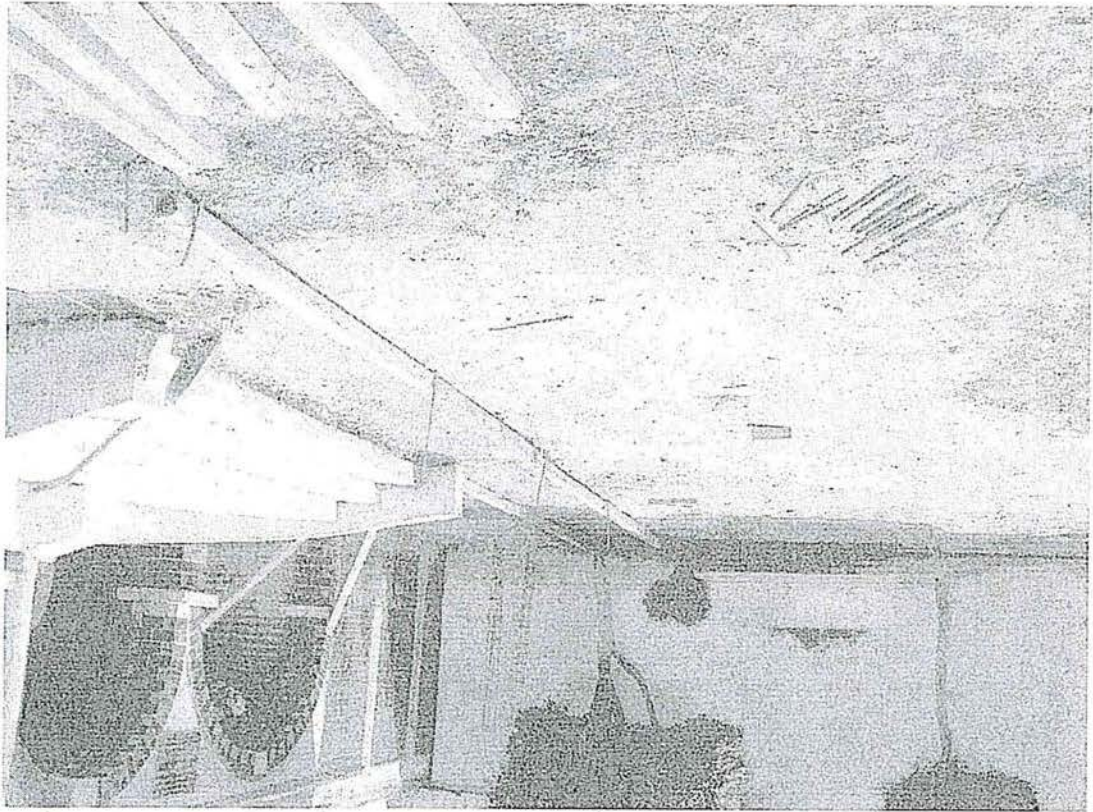

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 5 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Lombrínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
151

TLAXCALA
2009
Municipio de compromisos

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

NAYARIT ESQUINA LAREDO



REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 4 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

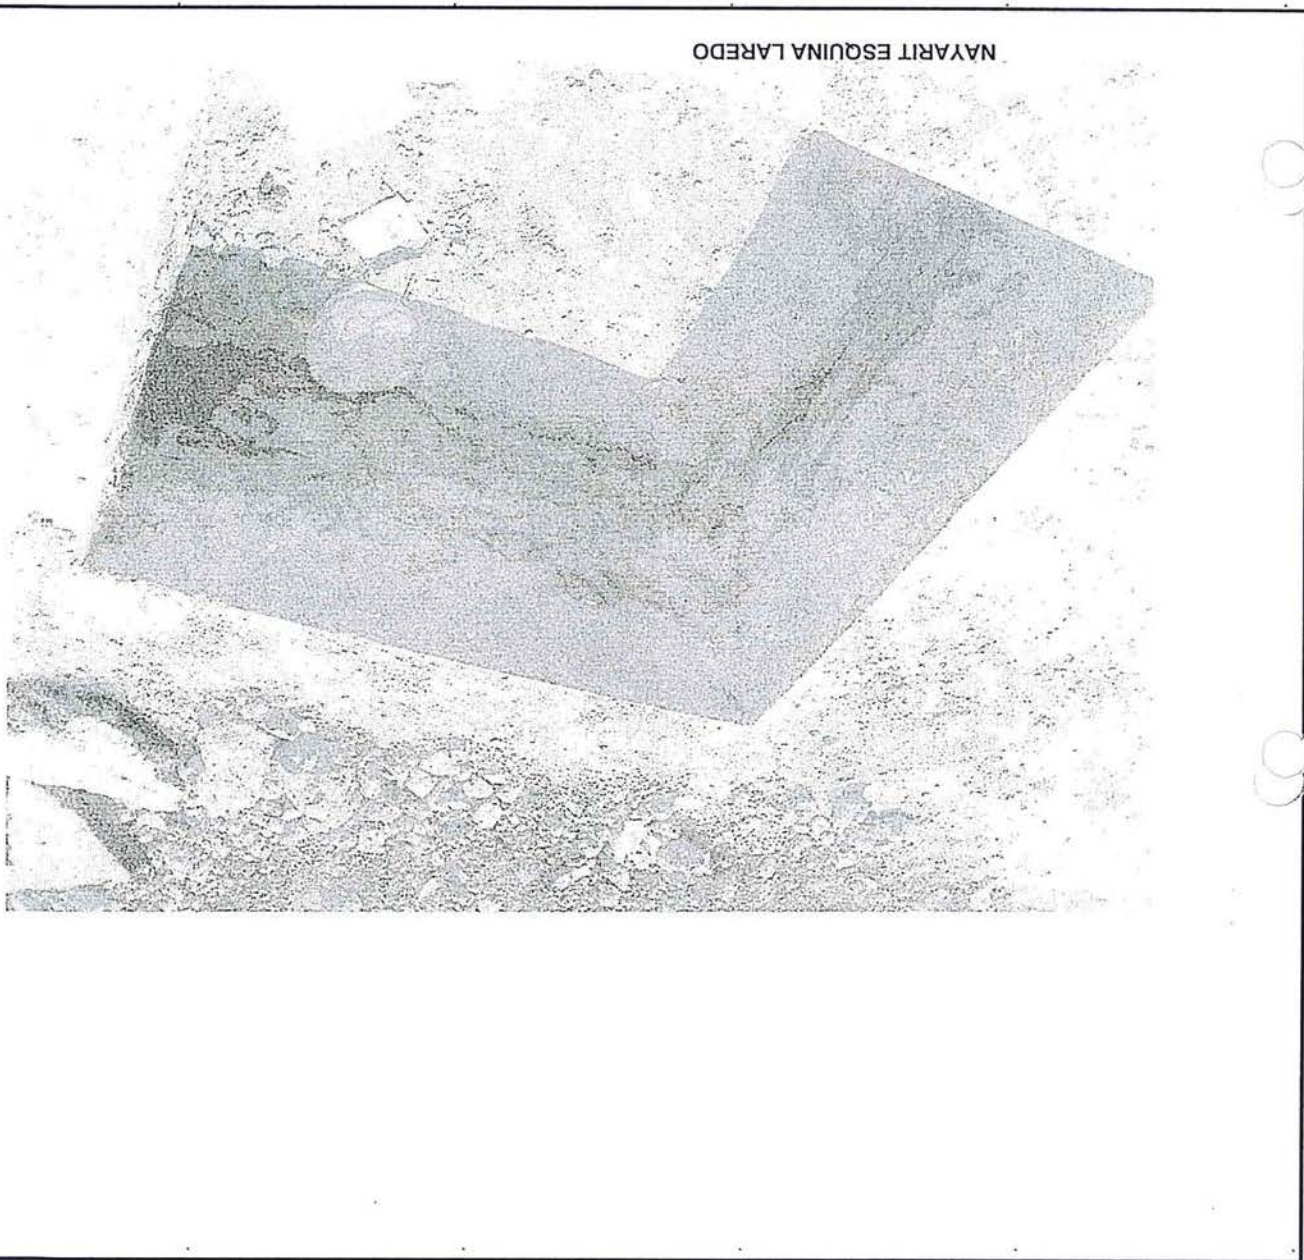

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE LA EXCAVACION DE LOS HUECOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS ARCOS QUE SE COLOCARAN EN LA ENTRADA DE LA CALLE
OBRA: DGOPI/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTRUCCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 5 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Bermúdez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DEL COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'c= 200 KG/CM2, PARA LAS COLUMNAS ARMADAS DE ACERO Y DARLE FORMA A LOS ARCOS
OBRA: DGO/ISC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 6 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Ismael Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
154

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

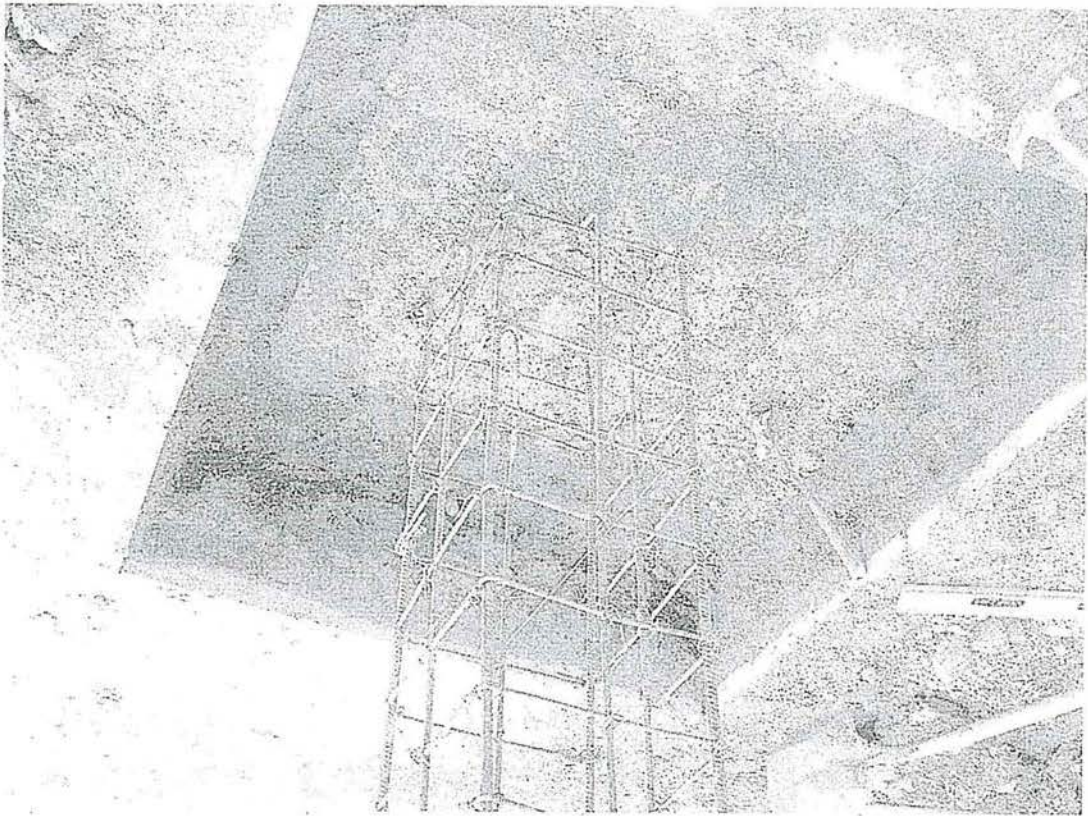

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN EN LA FOTO PARTE DEL ARMADO DE LAS COLUMNAS CON VARILLAS DE 3/8" Y DE 1/2" PARA LAS COLUMNAS DE LOS ARCOS
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 7 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción


Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
158



REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

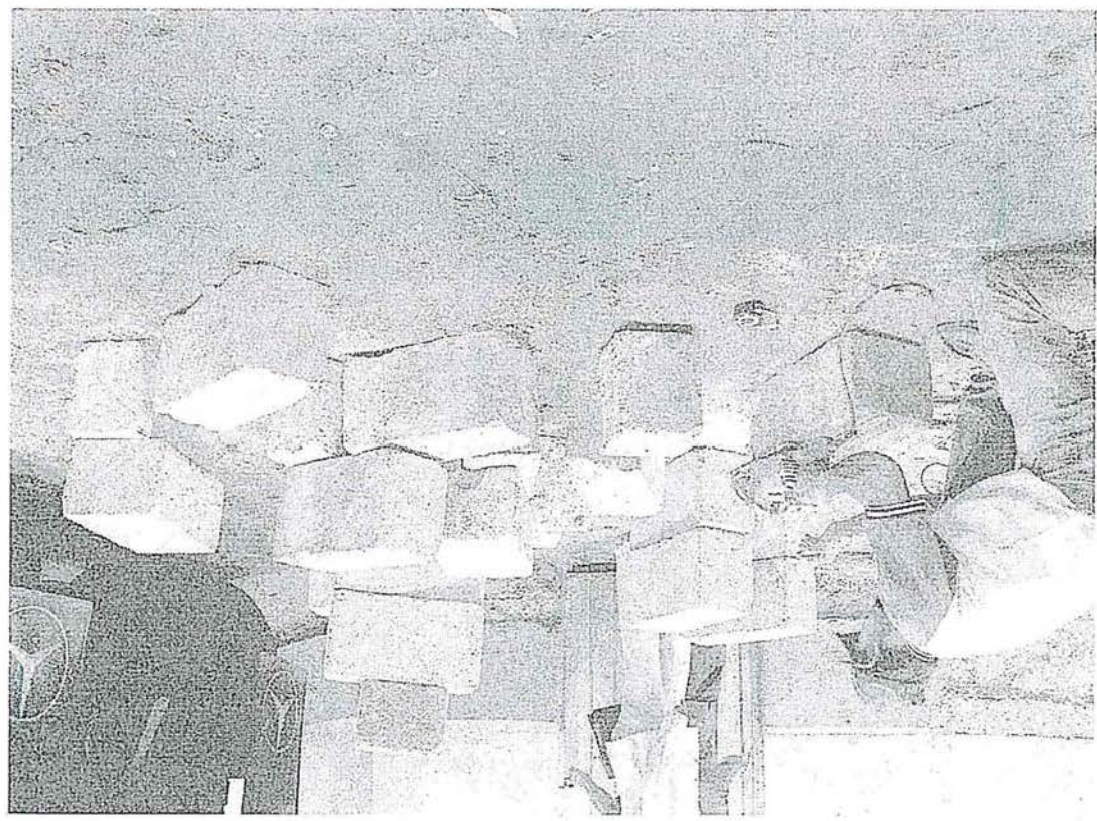

NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVAN EN LA FOTO EL CORTE DEL BLOCK QUE SE UTILIZARAN PARA FORRAR
LAS COLUMNAS DE LOS ARCOS
OBRA: DGOPI/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HQJA DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
154

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DEL FORRADO DE LAS COLUMNAS

CON BLOCK

OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 9 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

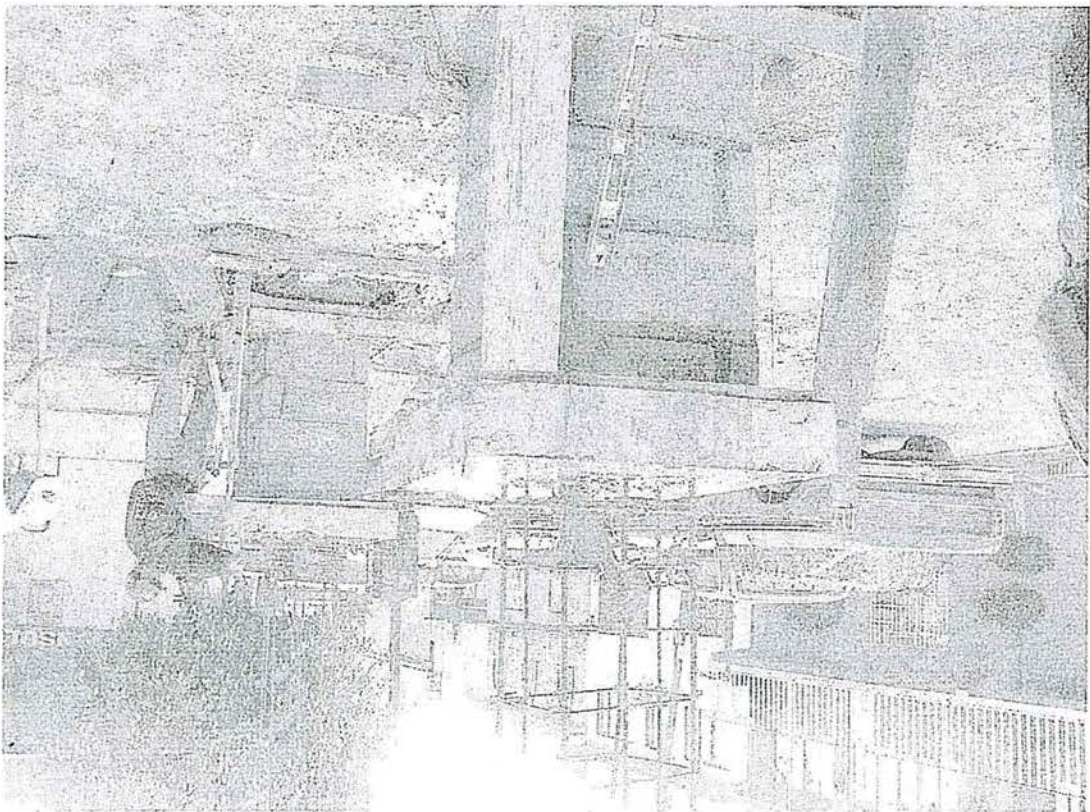

NAVAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DEL FORRADO DE LAS COLUMNAS

CON BLOCK

OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10

UBICACIÓN: NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA : CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 10 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DEL FORRADO DE LAS COLUMNAS
CON TABIQUE ROJO RECOCIDO
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 14 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
168

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

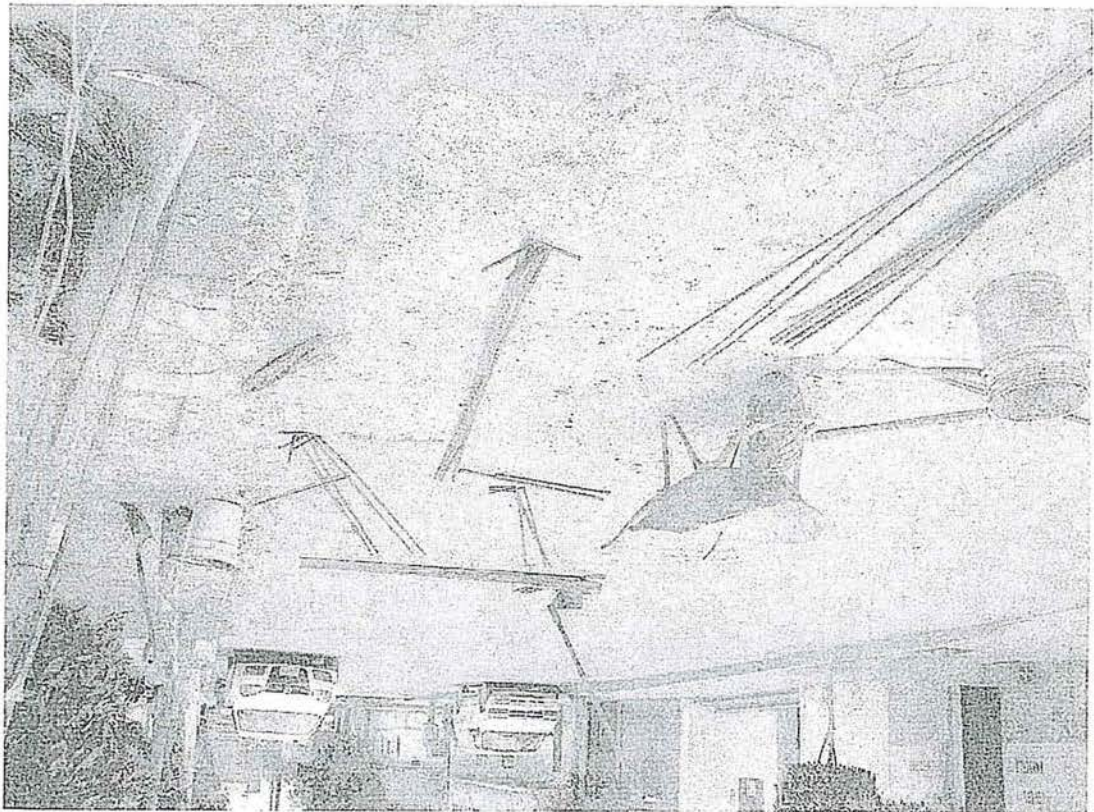

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN CUESTION
DEL CORTE DEL ACERO DE 3/8", 1/2" PARA EL ARMADO DE LAS TRABES DE LOS ARCOS
OBRA: DGO/ISC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 12 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

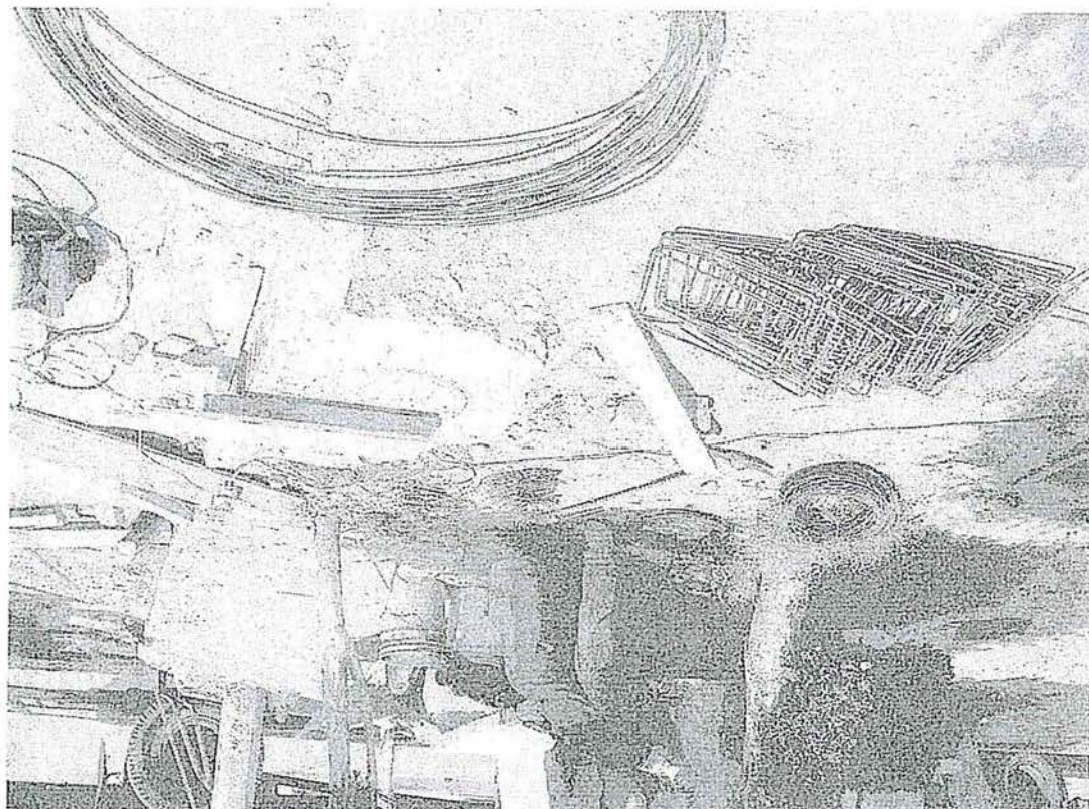

NAVAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN CUESTION
DEL CORTE DE LA VARILLA DE 3/8", 1/2" PARA EL ARMADO DE LAS TRABES DE LOS ARCOS
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 13 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración




DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
167



REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

NAYARIT ESQUINA LAREDO

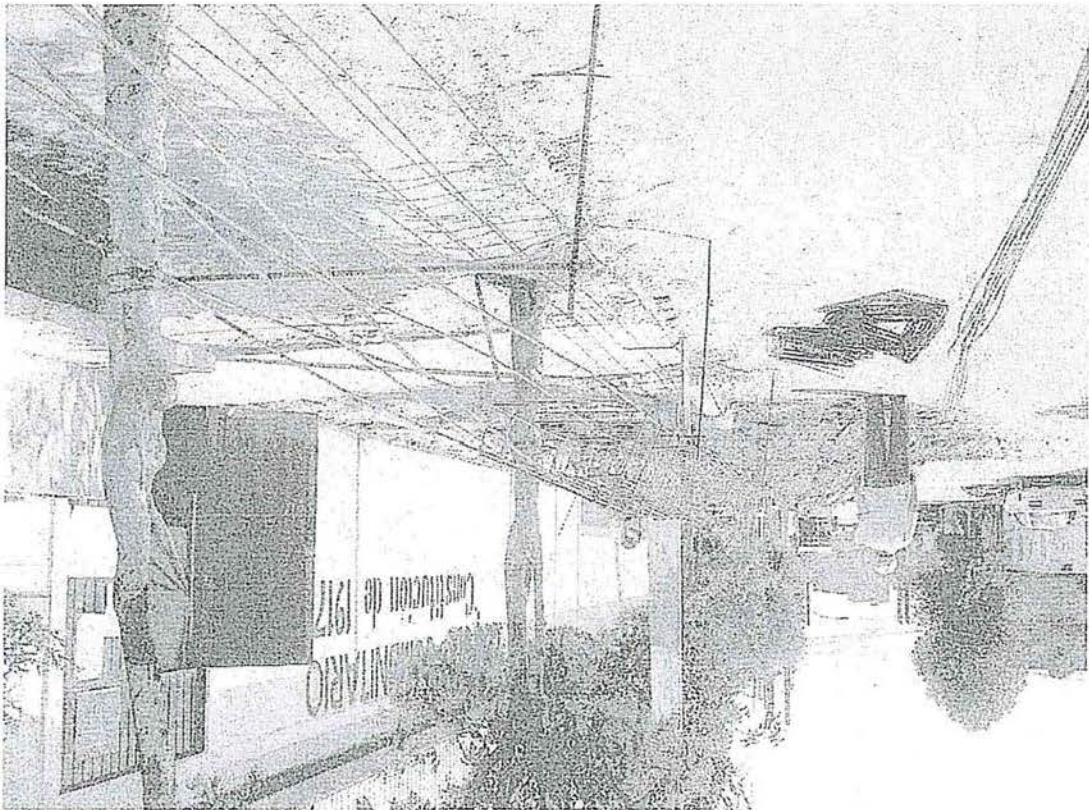

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN CUESTION
DEL CORTE DE LA VARILLA DE 3/8", 1/2" PARA EL ARMADO DE LAS TRABES DE LOS ARCOS
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 14 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. Jose Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

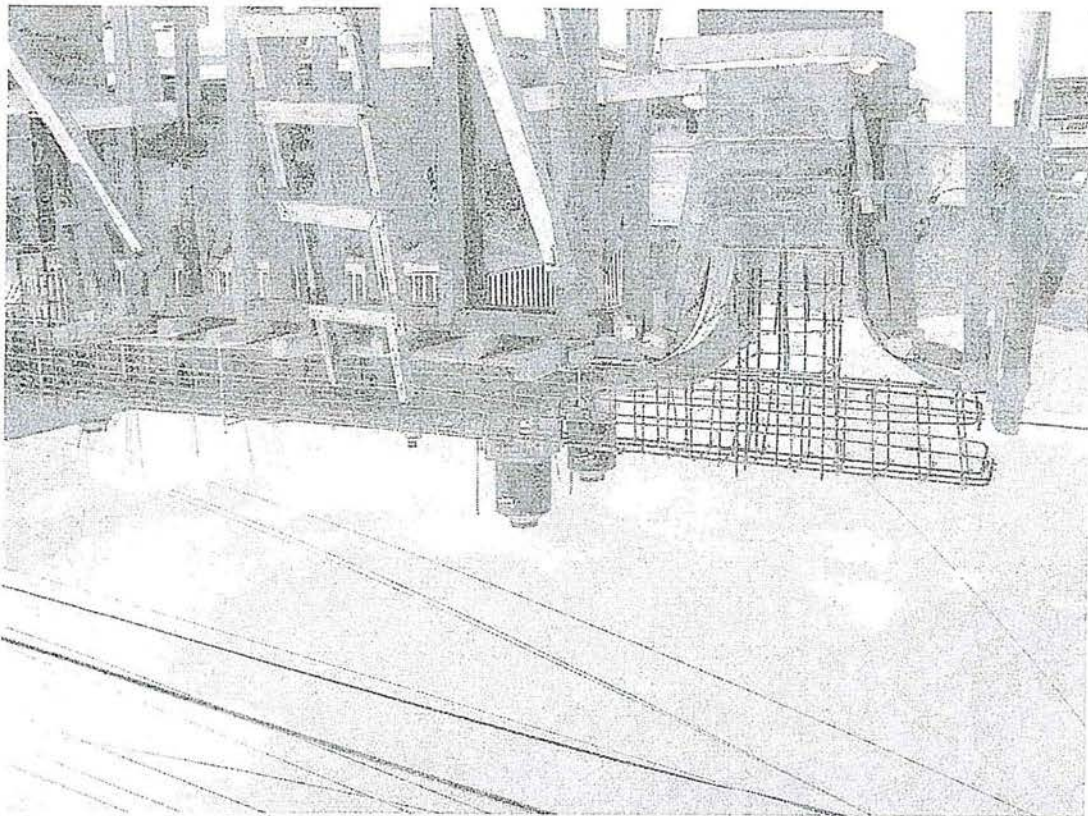

NAVAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA COLOCACION Y CIMBRADO DE LA TRABE PARA EL COLADO

DE LOS ARCOS

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 15 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israél Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración

[Handwritten signature]

Arco Antonio Martínez Davila
Subdirector de Construcción



Ing. José Israel Domínguez

A black and white photograph showing the interior of a large, open container or warehouse. The space is filled with numerous wooden crates or pallets stacked in rows, creating a grid-like pattern. The lighting is bright, and the structure appears to be made of metal or concrete.

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA COLOCACION Y CIMBRADO DE LA TRABE PARA EL COLADO
DE LOS ARCOS
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA


991





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

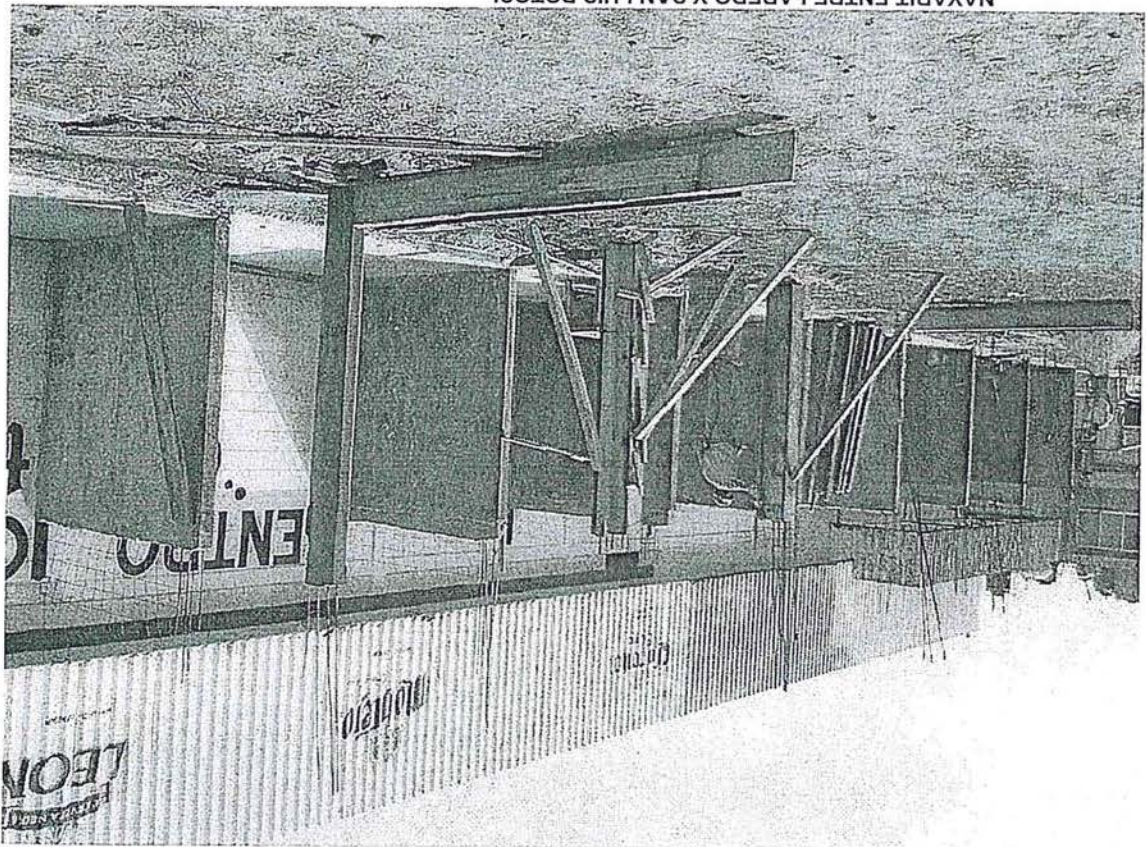

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSEJO DONDE SE UTILIZO MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 7 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirección de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSEJO DONDE SE UTILIZO MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 10 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

169
Municipio de compromisos
2009
2012
TLALNEPANTLA DE BAZ

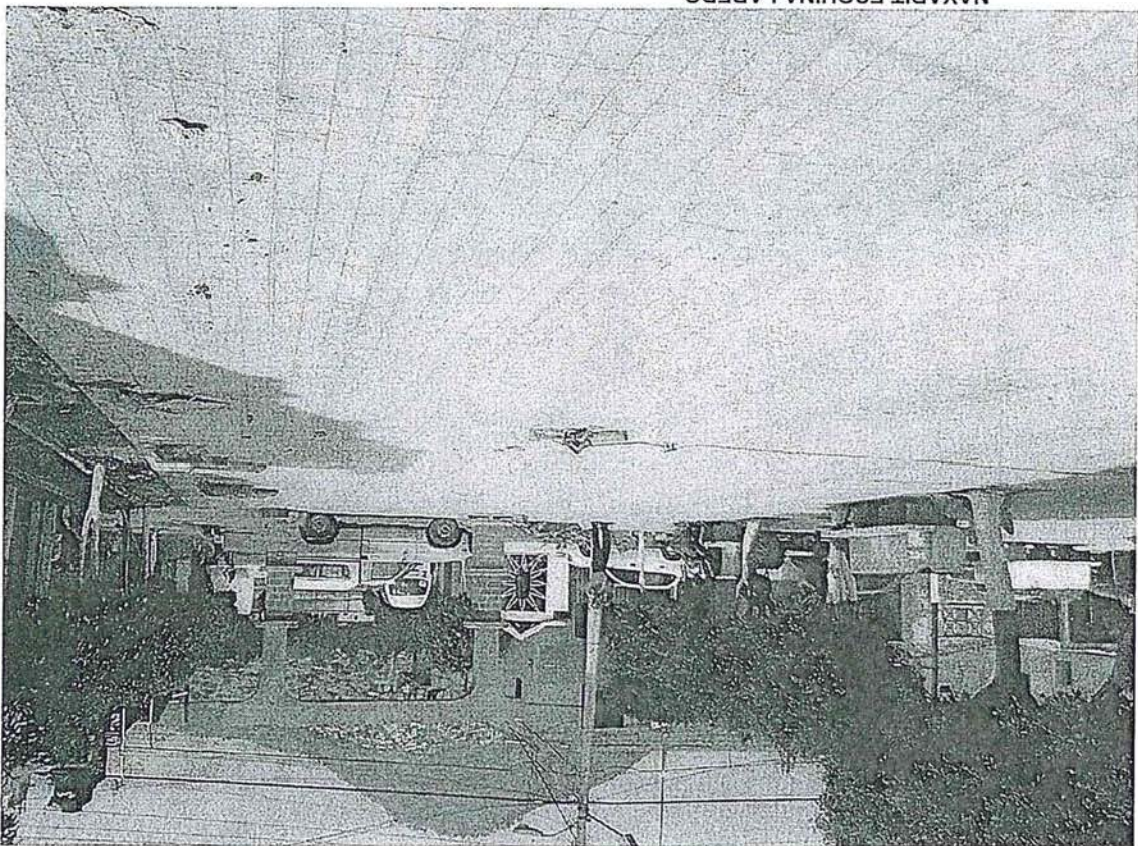

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO PARTE DE LOS TRABAJOS DEL COLADO DEL ARROYO CON

CONCRETO ESTAMPADO

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTRUCCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 14 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
136



REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO



NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAS

OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTITUCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 20 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

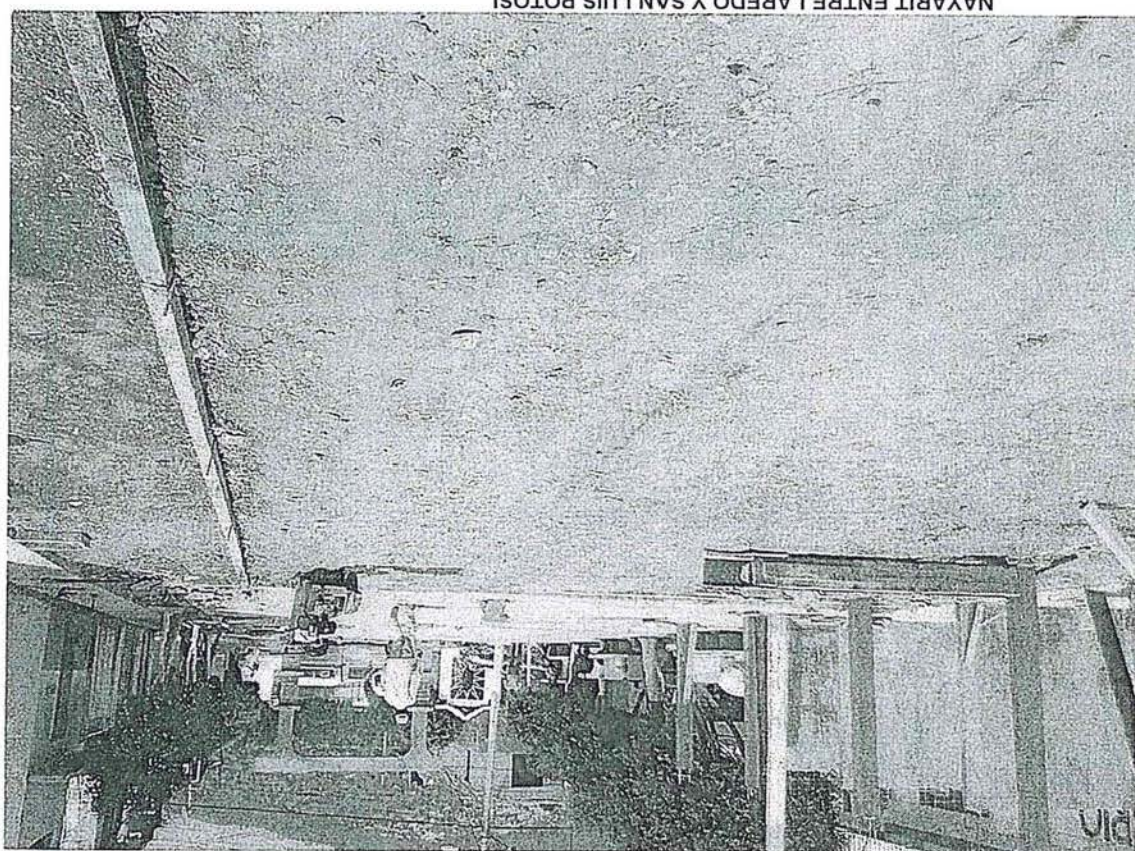

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

OBRA: DGO/ISC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 21 DE

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
172

REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

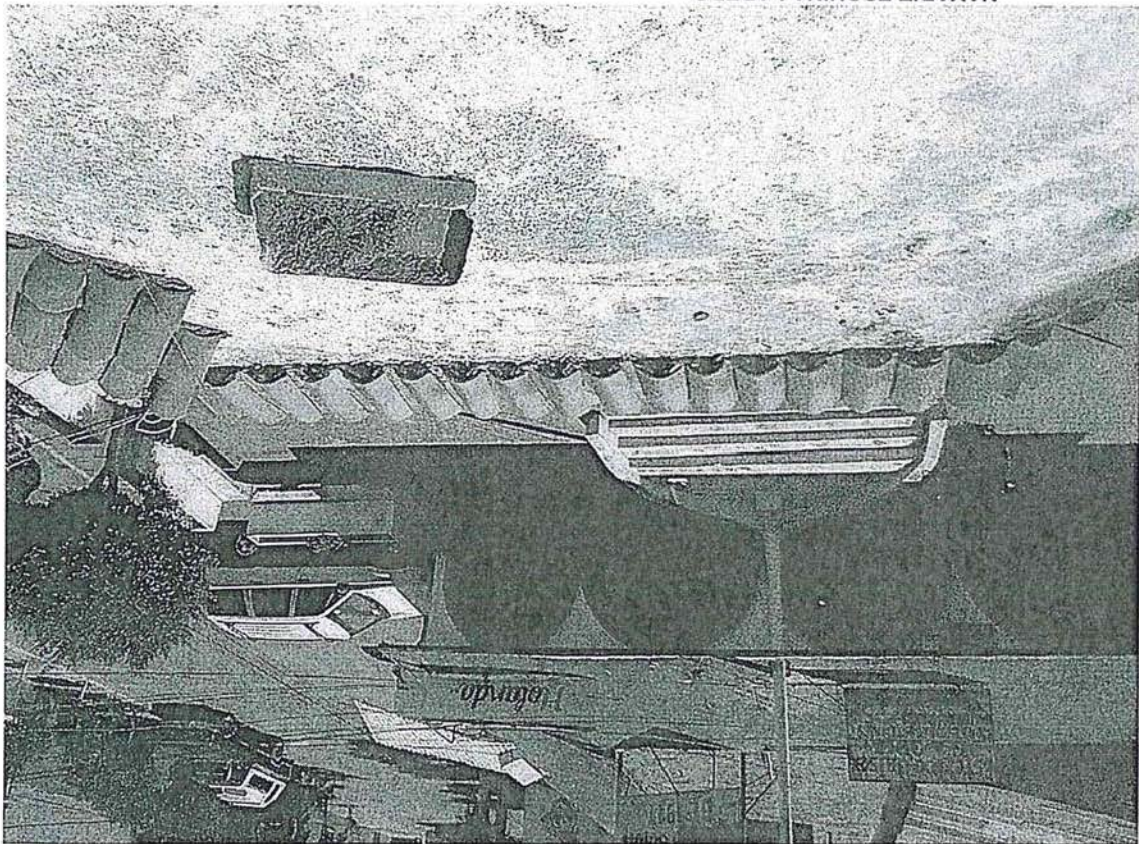

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA COLOCACION DE LA TEJA
TIPO COLONIAL SOBRE KIOSKO
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 22 DE


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Cevallos
Subdirector de Construcción

Ing. José Isidoro Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO PROCESO

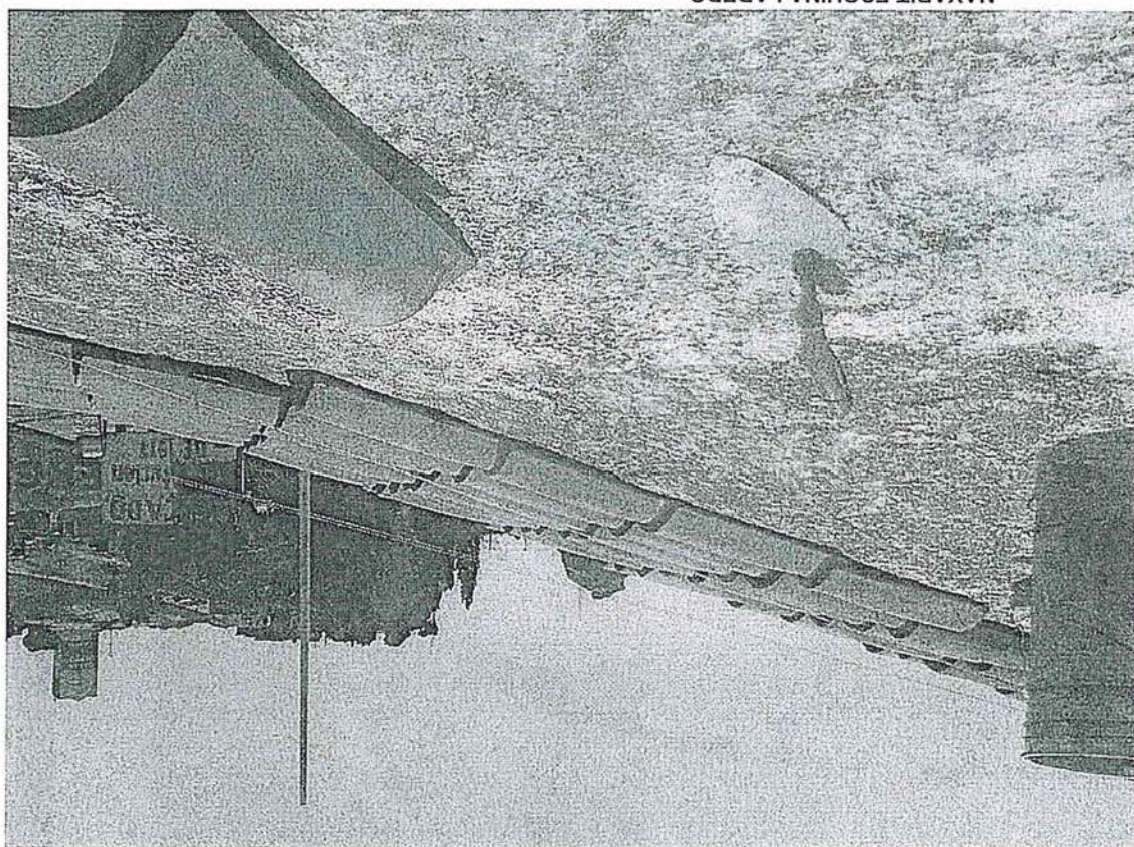

NAYARIT ESQUINA LAREDO

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA COLOCACION DE LA TEJA
TIPO COLONIAL SOBRE KIOSKO
OBRA: DGO/ISC-Adm/O-0037-10
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 2 DE 3

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. Jose Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO TERMINO

2009
TLANEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos

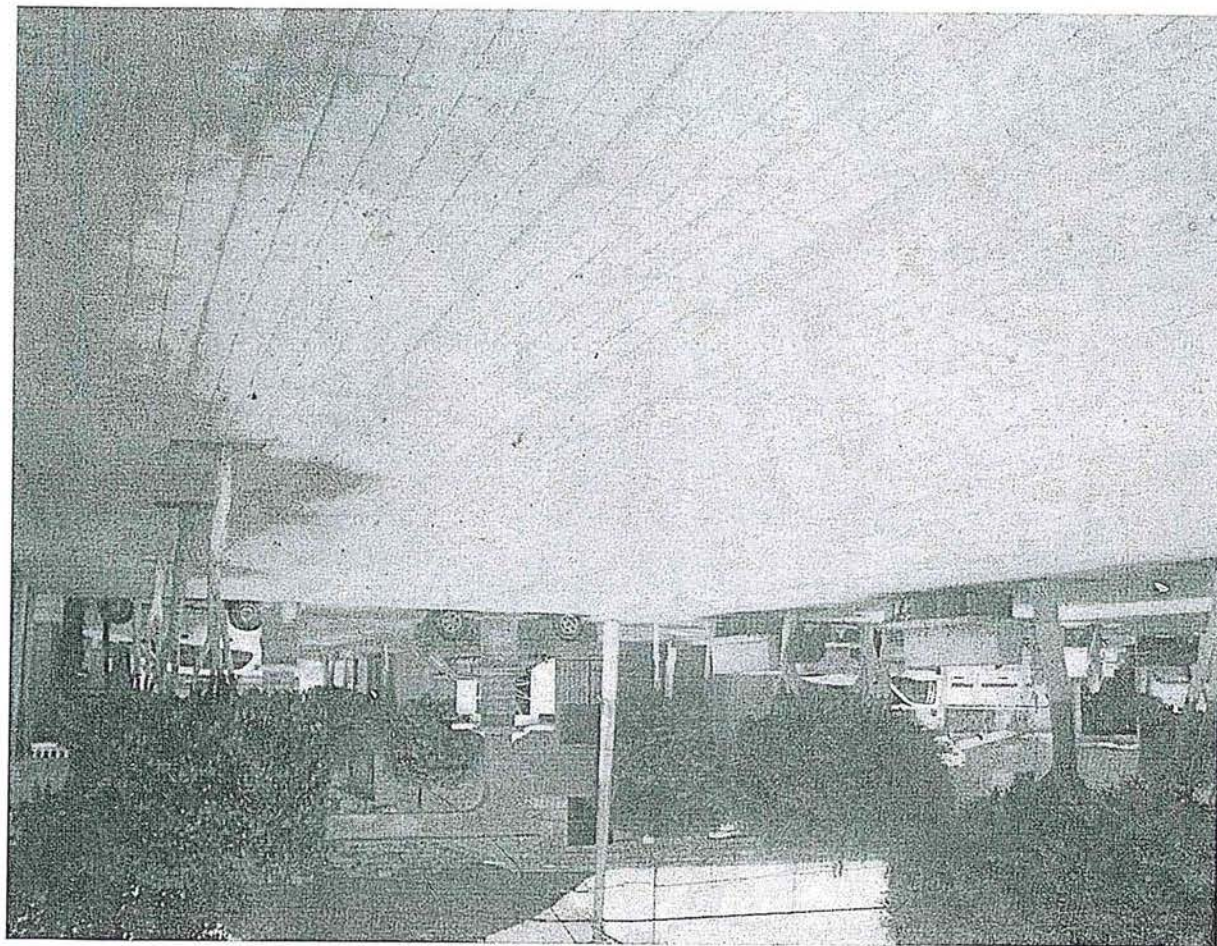

NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL COLADO CON CONCRETO HECHO EN
OBRA ESTAMPADO PARA REMODELACION DE PLAZA CIVICA
OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAVAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HJJA: 24 DE:


Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Ismael Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO TERMINO

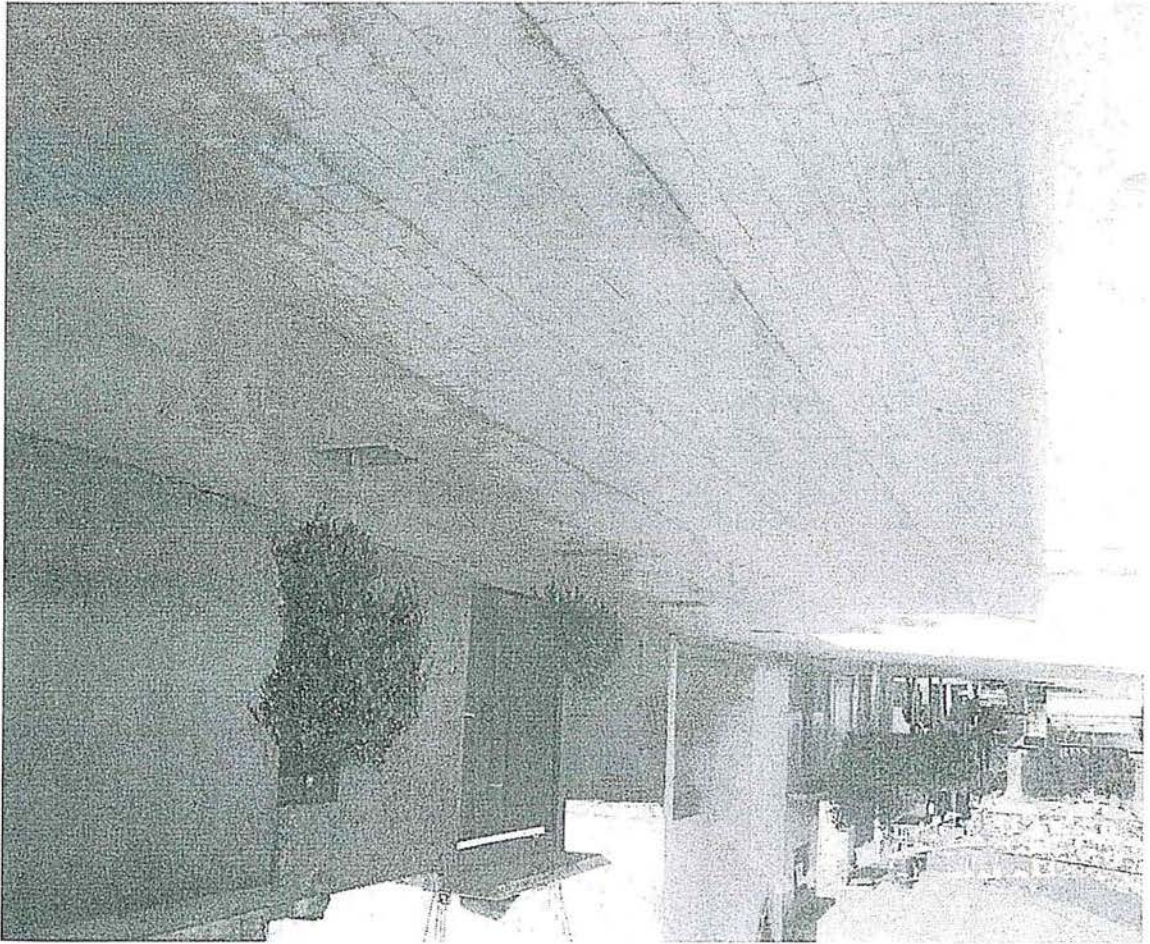

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL COLADO CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DEL ARROYO ESTAMPADO PARA REMODELACION DE PLAZA CIVICA
OBRA: DGOP/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTRUCCION DE 1917
DESCRIPCION : REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 25 DE:

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO TERMINO



NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL COLADO CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE BANQUETAS ESTAMPADO PARA REMODELACION DE PLAZA CIVICA
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA : CONSTITUCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA: 26 DE:

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martinez Davalos
Subdirector de Construccion

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO TERMINO

2009
2012
MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos

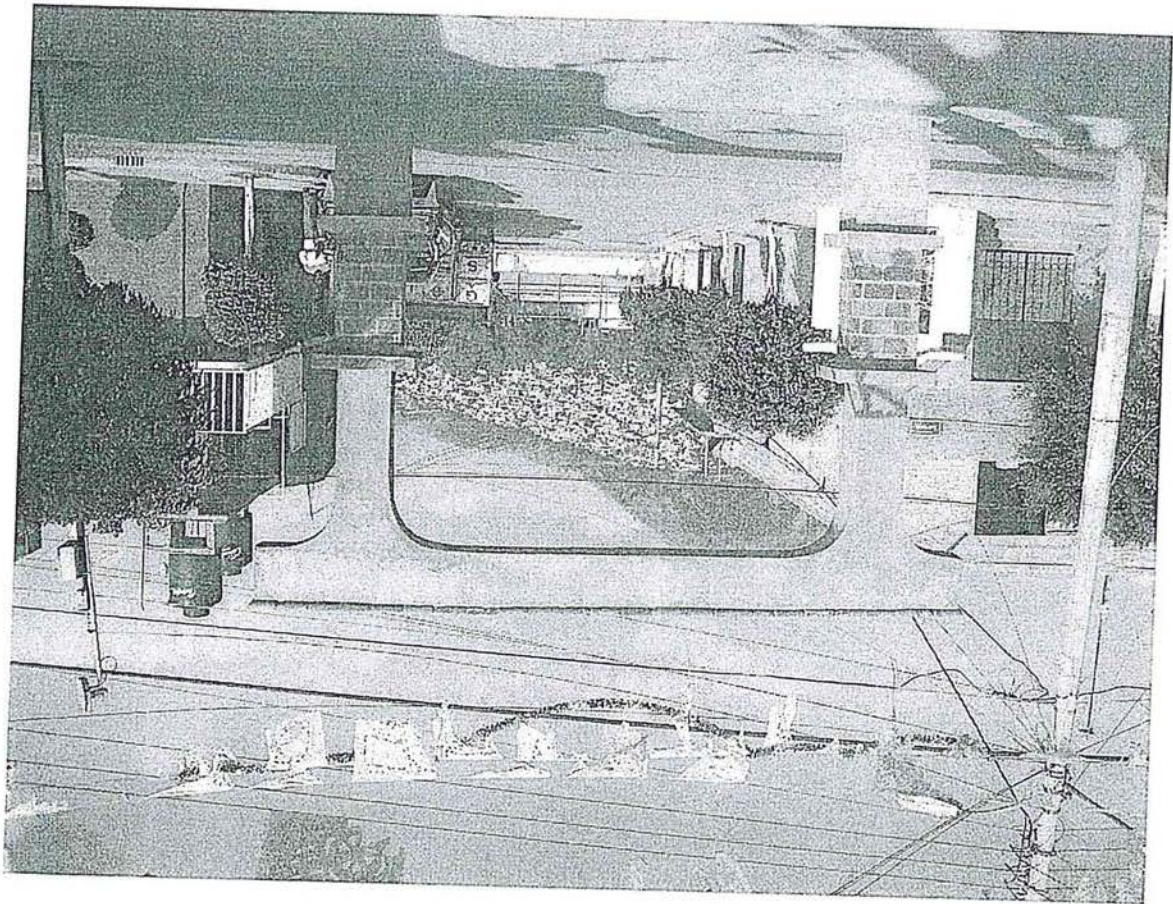

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA CONSTRUCCION

DE LOS ARCOS

OBRA: DGP/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CONSTRUCCION DE 1917

DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA 27 DE:

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra


Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavaia
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALTILLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REPORTE FOTOGRAFICO TERMINO

TLAXCALTILLA DE BAZ
Municipio de compromisos
2009 2012

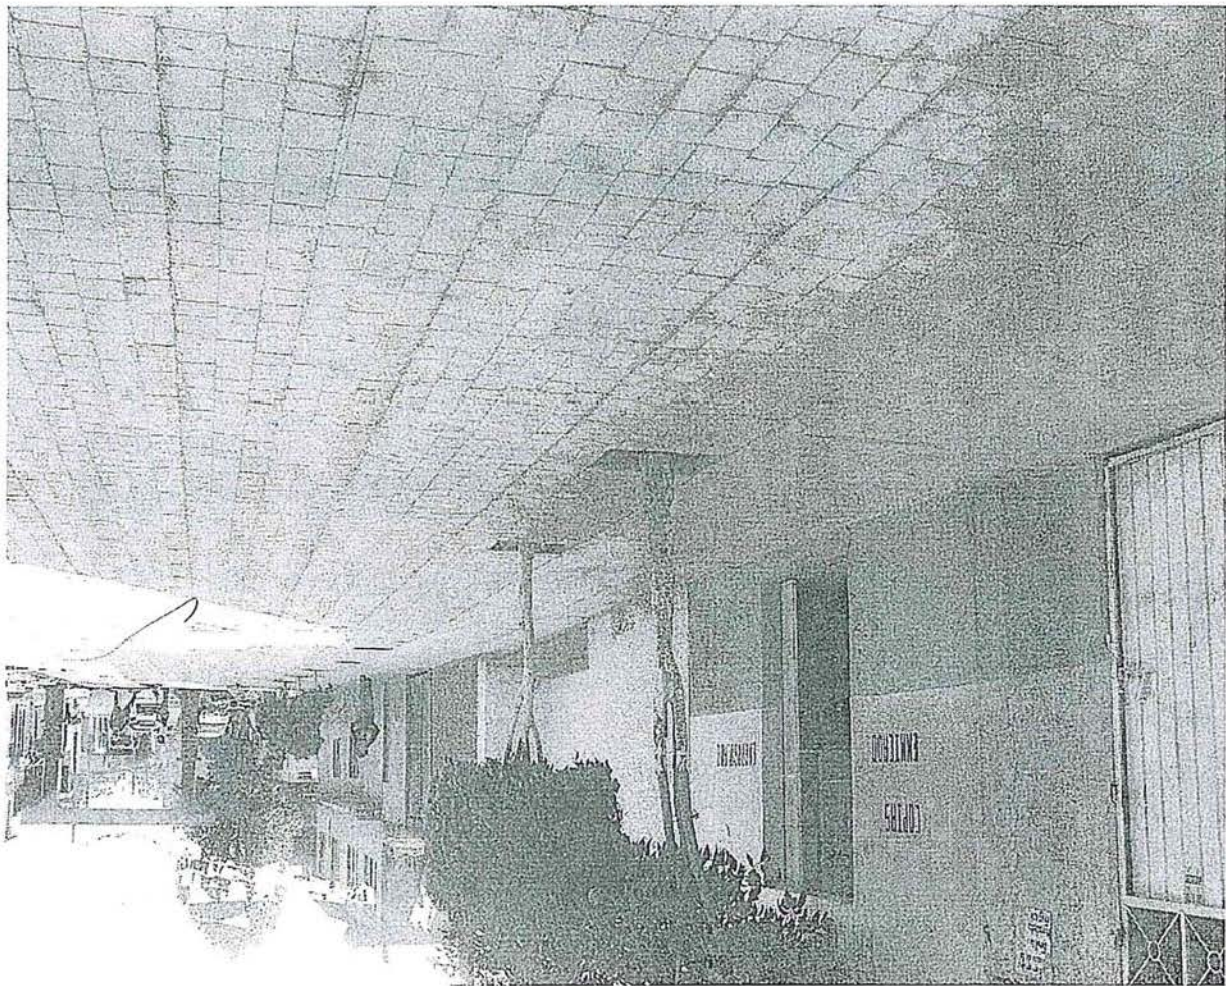

NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI

REFERENCIA DE FOTO: SE OBSERVA EN LA FOTO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL COLADO CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DEL ARROYO ESTAMPADO PARA REDODELACION DE PLAZA CIVICA
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COLONIA: CONSTRUCCION DE 1917
DESCRIPCION: REMODELACION DE PLAZA CIVICA

HOJA: 28 DE:

Tec. Javier Vargas Espinosa
Supervisor de obra

Ing. Marco Antonio Martínez Davalos
Subdirector de construcción

Ing. José Israel Domínguez Zavala
Jefe de Departamento de Obras por Administración



H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalnepantla de Baz

2009 - 2012

Dirección General de Obras Públicas.
Subdirección de Construcción.

"2011, Año del Caudillo Vicente Guerrero".

, a 17 de febrero de 2011.

DGOP/SC/297/11

C. Mauro Montiel Ávila
Contralor Social "A"
Calle Laredo núm. 17
Colonia Constitución de 1917
Teléfono: 5829-45-69

A través del presente, le extendiendo una cordial invitación a efecto de llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos realizados con recurso "PIM", de la obra "Remodelación de Plaza Cívica (Bicentenario)" en Nayarit entre Laredo y San Luis Potosí, colonia Constitución de 1917 de este Municipio, registrada con el número de clave DGOP/SC-Adm/O-0037-10, dicho acto se llevará a cabo a las 11:30 a.m. del día 28 de febrero del año en curso, teniendo como punto de reunión en la calle Nayarit esquina Laredo.

Asimismo agradeceré si convoca a los C.C. Esteban Juan Pérez Rosas y Rosario Josefina Gutiérrez Almazan, integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que usted preside.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Atentamente.

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

C.p. Ing. Reynaldo Gasca Jaime.- Director General de Obras Públicas
C.p. Ing. Jorge Barajas Sánchez.- Subdirector de Evaluación y Control
C.p. Ing. José Israel Domínguez Zavala.- Jefe del Departamento de Obras por Administración
C.p. Tec. Javier Vargas Espinosa.- Supervisor de Obra
C.p. Archivo/Minutario
MAMD/JIDZ/smm

TLALNEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos
2009
2012

Plaza Dr. Gustavo Baz-s/n-Gol.-Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel, 5366-3928



H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalnepanitla de Baz

2009 - 2012

Dirección General de Obras Públicas.
Subdirección de Construcción.

180

"2011, Año del Caudillo Vicente Guerrero".

, a 17 de febrero de 2011.

DGOP/SC/297/11

C. Mauro Montiel Ávila
Contralor Social "A"
Calle Laredo núm. 17
Colonia Constitución de 1917
Teléfono: 5829-45-69

Muse

A través del presente, le extiendo una cordial invitación a efecto de llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos realizados con recurso "PIM", de la obra "Remodelación de Plaza Cívica (Bicentenario)" en Nayarit entre Laredo y San Luis Potosí, colonia Constitución de 1917 de este Municipio, registrada con el número de clave DGOP/SC-Adm/O-0037-10, dicho acto se llevará a cabo a las 11:30 a.m. del día 28 de febrero del año en curso, teniendo como punto de reunión en la calle Nayarit esquina Laredo.

Asimismo agradeceré si convoca a los C.C. Esteban Juan Pérez Rosas y Rosario Josefina Gutiérrez Almazán, integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que usted preside.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.


Atentamente.

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

[Firma]

C.p. Ing. Reynaldo Gasca Jaime.- Director General de Obras Públicas
C.p. Ing. Jorge Barajas Sánchez.- Subdirector de Evaluación y Control
C.p. Ing. José Israel Domínguez Zavala.- Jefe del Departamento de Obras por Administración
C.p. Tec. Javier Vargas Espinosa.- Supervisor de Obra
C.p. Archivo/Minutario
MAMD/JIDZ/smm

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepanitla Centro,
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel. 5366-3928





H. Ayuntamiento Constitucional
De Tlalnepantla de Baz.

Dirección General de Obras Públicas.
Subdirección de Construcción.

2009 - 2012

"2011, Año del Caudillo Vicente Guerrero".

, a 17 de febrero de 2011.

DGOP/SC/297/11

C. Mauro Montiel Ávila
Contralor Social "A"
Calle Laredo núm. 17
Colonia Constitución de 1917
Teléfono: 5829-45-69

A través del presente, le extendiendo una cordial invitación a efecto de llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos realizados con recurso "PIM", de la obra "Remodelación de Plaza Cívica (Bicentenario)" en Nayarit entre Laredo y San Luis Potosí, colonia Constitución de 1917 de este Municipio, registrada con el número de clave DGOP/SC-Adm/O-0037-10, dicho acto se llevará a cabo a las 11:30 a.m. del día 28 de febrero del año en curso, teniendo como punto de reunión en la calle Nayarit esquina Laredo.

Asimismo agradeceré si convoca a los C.C. Esteban Juan Pérez Rosas y Rosario Josefina Gutiérrez Almazán, integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que usted preside.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Atentamente.

Ing. Marco Antonio Martínez Dávalos
Subdirector de Construcción

C.p. Ing. Reynaldo Gasca Jaime.- Director General de Obras Públicas
C.p. Ing. Jorge Barajas Sánchez.- Subdirector de Evaluación y Control
C.p. Ing. José Israel Domínguez Zavala.- Jefe del Departamento de Obras por Administración
C.p. Tec. Javier Vargas Espinosa.- Supervisor de Obra
C.p. Archivo/Minutario
MAM/D/JID/Z/smm



TLAINEPANTLA DE BAZ
Municipio de compromisos

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
C.P. 54000, Tel. 5366-3928



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

182



REPORTE DE ACTIVIDADES DE CUADRILLA DE TRABAJADORES
OBRA: DGO/ISC-Adm/O-003710
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917

27-sep-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 2 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE NIVELACION DEL TERRENO.
29-sep-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 5 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAS CON MEDIOS MANUALES.
30-sep-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 5 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE NIVELACION DEL TERRENO, ASI COMO EL CHEQUEO DE NIVELES.
2-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 5 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS
05-oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL ARMADO DE COLUMNAS CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2".
06-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS
08-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 4 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONTINUAR CON EL COLADO DE BANQUETAS.
09-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS
11-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 4 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS
12-oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL ARMADO DE UNA COLUMNA CON VARILLAS DE 1/2" Y 3/8", ASI COMO EL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS
13-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS
15-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES REALIZAN LA MODIFICACION DEL ARMADO DE LAS COLUMNAS QUE YA SE TENIAN.
16-oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE LA ZONA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



REPORTE DE ACTIVIDADES DE CUADRILLA DE TRABAJADORES
OBRA: DGP/SC-Adm/O-003710
UBICACIÓN: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917

18-Oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F.C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS.
19-Oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 4 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F.C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS.
20-Oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 4 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F.C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS.
21-Oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE ARROYO CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F.C= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.18 MTS, ASI COMO EL ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" Y 1/2" DE UNA TRABE PARA UN ARCO.
22-Oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LA TEJA TIPO COLONIAL SOBRE EL AREA DEL KIOSKO.
25-Oct-10	2 MAESTROS ALBAÑILES Y 6 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DE LA TRABE PARA EL ARCO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F.C= 200 KG/CM2, ASI COMO LA COLOCACION DE TEJA TIPO COLONIAL SOBRE EL KIOSKO.
26-Oct-10	4 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL DECIMBRADO DE LA MADERA QUE SE UTILIZO EN EL COLADO DE LOS ARCOS.
27-Oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LA TEJA TIPO COLONIAL SOBRE EL AREA DEL KIOSKO.
29-Oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 2 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LA TEJA TIPO COLONIAL SOBRE EL AREA DEL MERCADO.
30-Oct-10	1 MAESTRO ALBAÑIL Y 2 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LA TEJA TIPO COLONIAL SOBRE EL AREA DEL MERCADO.
15-Dic-10	3 MAESTROS ALBAÑILES Y 9 AYUDANTES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL COLADO DEL TRAMO DE BANQUETA FALTANTE CON CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA DE F.C= 150 KG/CM2.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE LA ZONA

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION



REPORTE DE ACTIVIDADES DE MAQUINARIA
OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10
UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917

02-sep-10	MAQUINA RETRO EXCAVADORA DM-059 DEL OPERADOR MARIO AVILA MONTERO, LA CUAL REALIZA LA DEMOLICION DE BANQUETAS QUE SE INDICARON.
24-sep-10	MAQUINA RETRO EXCAVADORA DM-059 DEL OPERADOR MARIO AVILA MONTERO Y LOS CAMIONES DE VOLTEO CON NUMEROS ECONOMICOS DM-011 DEL OPERADOR JULIAN CHAVEZ SUAREZ, CAMION DM-012 DEL OPERADOR APOLINAR MAYA ZUÑIGA, CAMION DM-021 DEL OPERADOR ANGEL ALVARADO SANCHEZ Y EL CAMION DM-029 DEL OPERADOR JUAN CARMELO BARRON RANGEL LOS CUALES RETIRAN UN APROXIMADO DE 24.0 M3 DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE BANQUETAS.
28-sep-10	MAQUINA RETRO EXCAVADORA DM-059 DEL OPERADOR MARIO AVILA MONTERO Y LOS CAMIONES DE VOLTEO CON NUMEROS ECONOMICOS DM-011 DEL OPERADOR JULIAN CHAVEZ SUAREZ, CAMION DM-012 DEL OPERADOR APOLINAR MAYA ZUÑIGA Y EL CAMION DM-029 DEL OPERADOR JUAN CARMELO BARRON RANGEL LOS CUALES RETIRAN UN APROXIMADO DE 18.0 M3 DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE BANQUETAS.
01-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-027 DEL OPERADOR JOSE MARIO CUEVAS GALINDO EL CUAL ENTREGA 8 VARILLAS DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", 30 KILOS DE ALAMBRO DE 1/4", 15 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO Y 6.0 M3 DE GRAVA CON LOS VALES AC-140 Y AC-139 RESPECTIVAMENTE Y EL CAMION DM-026 DEL OPERADOR ROBERTO CANO SIERRA EL CUAL ENTREGA 12.0 M3 DE ARENA CON VALES AC-136, AC-137 Y 6.0 M3 DE GRAVA CON EL VALE AC-138.
05-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-062 DEL OPERADOR FACUNDO DIAZ CHAPARO GALINDO EL CUAL ENTREGA 12.0 M3 DE ARENA CON LOS VALES AC-141 Y AC-144 Y EL CAMION DM-024 DEL OPERADOR JUAN CARMELO BARRON RANGEL EL CUAL ENTREGA 9.0 M3 DE GRAVA CON VALES AC-143 Y AC-142.
11-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-024 DEL OPERADOR JUAN CARMELO BARRON RANGEL EL CUAL ENTREGA 9 VARILLAS DE 3/8", 7 VARILLAS DE 1/2", 30 KILOS DE ALAMBRO DE 1/4", 20 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CON NUMERO DE VALE AC-158, EL CAMION DM-026 DEL OPERADOR ROBERTO CANO SIERRA EL CUAL ENTREGA 7.0 M3 DE GRAVA CON EL VALE AC-155 Y EL CAMION DM-012 DEL OPERADOR APOLINAR MAYA ZUÑIGA EL CUAL ENTREGA 8.0 M3 DE ARENA CON VALES AC-156 Y 7.0 M3 DE GRAVA CON EL VALE AC-157.
16-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-027 DEL OPERADOR MARIO CUEVAS GALINDO EL CUAL ENTREGA 5 VARILLAS DE 3/8" Y 20 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CON NUMERO DE VALE AC-166, EL CAMION DM-011 DEL OPERADOR JULIAN CHAVEZ SUAREZ EL CUAL ENTREGA 10.0 M3 DE GRAVA CON LOS VALES AC-165 Y AC-162 Y 9.0 M3 DE ARENA CON LOS VALES AC-164 Y AC-163 RESPECTIVAMENTE.
18-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-021 DEL OPERADOR ANGEL ALVARADO SANCHEZ EL CUAL ENTREGA 12.0 M3 DE ARENA CON LOS VALES AC-175 Y AC-178 Y EL CAMION DM-026 DEL OPERADOR ROBERTO CANO SIERRA EL CUAL ENTREGA 12.0 M3 DE GRAVA CON VALES AC-177 Y AC-176.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE LA ZONA

[Handwritten signature]



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION

185

REPORTE DE ACTIVIDADES DE MAQUINARIA

OBRA: DGO/SC-Adm/O-0037-10

UBICACION: NAYARIT ENTRE LAREDO Y SAN LUIS POTOSI
COMUNIDAD: CONSTITUCION DE 1917



22-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-011 DEL OPERADOR JULIAN CHAVEZ SUAREZ EL CUAL ENTREGA 5 VARILLAS DE 3/8", 5 BULTOS DE CEMENTO Y 10 M3 DE GRAVA CON LOS VALES AC-182, AC-183, AC-181 Y AC-186, EL CAMION DM-180 DEL OPERADOR MIGUEL CANO REYES EL CUAL ENTREGA 6.0 M3 DE GRAVA CON VALE AC-184 Y EL CAMION DM-027 DEL OPERADOR JOSE MARIO CUEVAS GALINDO EL CUAL ENTREGA 5.0 M3 DE GRAVA CON EL VALE AC-185.
29-oct-10	CAMION DE VOLTEO DM-0105 DEL OPERADOR AVELINO DIAZ CHAPARRO EL CUAL ENTREGA 6.0 M3 DE ARENA CON EL VALE AC-191.
15-dic-10	CAMION DE VOLTEO DM-011 DEL OPERADOR JULIAN CHAVEZ SUAREZ EL CUAL ENTREGA 6.0 M3 DE ARENA CON EL VALE AC-191.

TEC. JAVIER VARGAS ESPINOSA
SUPERVISOR DE LA ZONA



CLAVE DE LA OBRA: D60P/SC-Adm/o-0037-10

UBICACIÓN: Calle Neguait entre Laredo y San Luis Potosí

OBRA: Remodelación de Plaza Cívica

En el Municipio de Tlaxiapa, Estado de México, siendo las 14 horas con 30 minutos del día 28 del mes de Febrero del año dos mil Once constituidos:

Calle Magarist entre Mercado y San Luis Potosí, Colonia Constitución

de 1913

Credencial de Elector Folio _____, el Ing. José Israel Domínguez Zavala, Jefe del Departamento de Obras Por Administración, quien se identifica con credencial de Elector Folio _____, y el Supervisor C. Reinier Vargas Espinosa, adscrito a la Subdirección de Construcción, quien se identifica con credencial de Elector Folio _____ y actuando de conformidad con las atribuciones que les fueron conferidas por el Ing. Reynaldo Gasca Jaime, Director General de Obras Públicas, y el C. Arg. Omar Alejandro García, quien se identifica con credencial de Elector Folio _____, Auditor Tesfinge

Auditor Testigo _____, adscrito a la Contraloría Municipal, quien funge como testigo en este acto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 D, fracción VII, y demás Disposiciones Normativas Aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 269 y demás Disposiciones Normativas Aplicables del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; se procede a instrumentar la presente Acta con el objeto de:

HACER CONSTAR

Que en la fecha, hora y lugar precitados, se encuentran presentes en la realización de este acto, los ciudadanos

Contralor Social "A"	Contralor Social "B"	Contralor Social "C"
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, quienes se identifican en este acto con

Credencial de Elector

Y habiendo sido notificados mediante oficio No. D 608/SC/27/17 de fecha 17 de Febrero del año dos mil Once, para participar en esta fecha en la Entrega-Recepción de los trabajos que se llevaron a cabo dentro del PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), con número de Clave de Obra D 608/SC-ADM/2017/10 por lo que una vez que se revisó y verificó que los trabajos están debidamente concluidos, se realiza en este acto la Entrega-Recepción de la Obra Pública denominada:

Remodelación de Plaza Clínica



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlalnepantla de Baz
2009-2012

Dirección General de
Obras Públicas

Subdirección
de Construcción



CLAVE DE LA OBRA: 260915C-ADM-0033-70

OBRA: Remodelación de Plaza Civica

UBICACIÓN: Calle Nuevart entre la cacha
y San Luis Potosi

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Bajo la modalidad de "Obra por Administración", del ejercicio fiscal 2010, donde los materiales, maquinaria y equipo, así como el proyecto, la supervisión, mano de obra y la asistencia técnica, fueron aportados por el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, misma que se realizó en el lugar precisado en el proemio de esta Acta, haciendo constar en este acto:

A) Descripción de los Trabajos: Demolición de Carpeta Asfáltica = 61.25 M³, Demolición de Banquetas = 80.10 M³, Excavación 4.0 M³, Retiro de Escombros = 145.35 M³, Trazo y Nivelación = 1413.65, Reconstrucción de Banquette de Fc = 150 Kg/m² = 80.10 M³, Reconstrucción de Altopo de Fc = 200 Kg/m² = 110.26 M³

B) Fecha de Inicio de Obra Programada:

20-Septiembre-2010

C) Fecha de Inicio de Obra Real:

20-Septiembre-2010

D) Fecha de Término de Obra Programada:

25-October-2010

E) Fecha de Término de Obra Real:

28-Febrero-2011

F) Monto Ejercido de Materiales:

\$ 219,870.35

G) Monto Ejercido de Mano de Obra:

\$ 159,467.42

H) Monto Total Ejercido:

\$ 379,337.77

Asimismo se hace constar que en este acto los representantes del Comité de Ciudadanos de Control y Vigilancia informan a los vecinos, el resultado del desempeño de sus funciones, consistentes en: Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo al Expediente Técnico y dentro de la normatividad correspondiente

No obstante la Recepción formal de la obra, la comunidad beneficiada y el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia adquieren el compromiso de conservar, vigilar y estar al tanto de dar el mantenimiento para su adecuada operación. El supervisor asignado es responsable de la ejecución de los trabajos y del suministro de materiales de acuerdo con las funciones establecidas en el Artículo 217 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y demás Disposiciones aplicables; así mismo los beneficiarios las personas que recibieron los materiales para su guardia y aplicación, serán responsables del correcto manejo de los mismos.

Por otra parte, el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia será responsable de conformidad con las acciones realizadas, en alcance a lo establecido en los Artículos 113 A y 113 D de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

No habiendo mas que agregar a la presente Acta, se da por concluida siendo las 12 horas con 00 minutos de la misma fecha de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido, del cual se dará cuenta al Director General de Obras Públicas de este Municipio,

[Firma]



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tiahuepan de Buz
2009-2012

Dirección General de
Obras Públicas

Subdirección
de Construcción



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CLAVE DE LA OBRA: D609/SC-Adm/0-0037-10

UBICACIÓN: Calle Mayorit entre la ard y San Luis Potosí
OBRA: Remodelación de Plaza Cívica

ENTREGA LA PRESENTE OBRA, POR EL H. AYUNTAMIENTO

SUPERVISOR DE ZONA
NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
JEFE DE DEPTO. DE OBRAS POR ADMINISTRACION

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ DAVALOS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

NOMBRE Y FIRMA
CONTROLORIA MUNICIPAL
(COMO TESTIGO)

RECIBE (N)
EL (LOS) SOLICITANTE (S) Y/O BENEFICIARIO (S)

NOMBRE

Santiago Labreal Ocho
Fernando Soto Jimenez

FIRMA

CARGO

NOMBRE

POR EL "COCICOM"

CONTRALOR SOCIAL "A"

CONTRALOR SOCIAL "B"

CONTRALOR SOCIAL "C"

FIRMA

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Programa de Urbanización, Remodelación y
Mantenimiento de Áreas Urbanas (Obras por
Administración Zona Oriente)

En atención a la demanda de la
comunidad, el H. Ayuntamiento realizó la
Remodelación de la Plaza Cívica (Plaza
Bicentenario) en la Calle Nayarit entre
Laredo y San Luis Potosí de la Col.
Constitución de 1917. Bajo la Modalidad
de Obras por Administración,
Beneficiando a una Población de 1000
habitantes

Con Acciones como esta mejoramos
la Imagen Urbana y mejoramos las
condiciones de vida de los
habitantes del Municipio de
Tlalnepantla de Baz.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ

2009-2012



Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54000, Tel. 5366-3927

Remodelación de Plaza
C í v i c a (P l a z a
Bicentenario) en la Calle
Nayarit entre Laredo y
San Luis Potosí, Col.
Constitución de 1917.

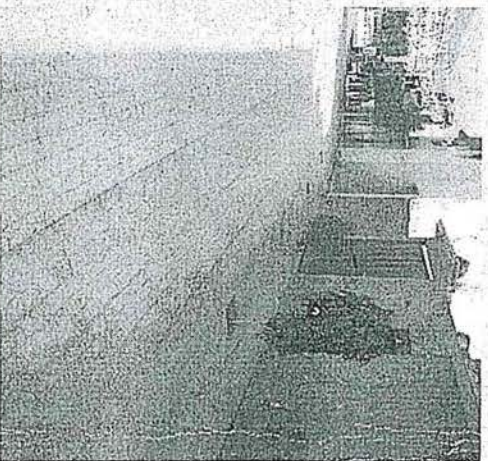

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL "FISM-2009"

