

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
181298/0003	05	10	A	202	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALFONSO FABILA", LOMAS DE ECATEPEC / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	17/06/2014	31/12/2014	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	0	0.00	
181304/0004	05	10	A	222	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPARA SALAZAR", LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA / EMILIANO ZAPATA 1*	CONTRATO	17/06/2014	31/12/2014	2,374,230.56	2,374,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	0	0.00	
181307/0005	05	10	O	222	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 0462, "15 DE SEPTIEMBRE", UBICADA EN AV. VENUSTIANO ZARRANZA, LOCALIDAD LEMCHOR MUZQUIZ / MELCHOR MÚZQUIZ	CONTRATO	17/06/2014	31/12/2014	1,776,593.44	1,776,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,611.42	1,474,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	0	83.00
181314/0006	05	10	O	222	MANTENIMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 462 "15 DE SEPTIEMBRE", UBICADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD MELCHOR MUZQUIZ / MELCHOR MÚZQUIZ	CONTRATO	17/06/2014	31/12/2014	79,067.82	79,067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,025.46	79,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	100	99.95
181325/0007	05	01	A	224	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN AV. ZAFIRO Y CALLE ACERINA, LOCALIDAD LA JOYA / LA JOYA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,765,173.27	1,765,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,345.65	1,506,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	85	85.34
181326/0008	05	10	O	222	MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN AV. ZAFIRO Y CALLE ACERINA S/N, LOCALIDAD LA JOYA / LA JOYA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	133,119.95	133,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,840.45	132,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	100	99.79
181328/0009	05	10	O	211	MANTENIMIENTO EN AZOTEA DE AULAS CON IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN CALLE ZARCO, LOCALIDAD NOVELA MEXICANA / NOVELA MEXICANA II	CONTRATO	01/10/2014	31/10/2014	504,599.95	504,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,810.61	497,810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	99	98.65




REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
181455/0010	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. MIGUEL ALEMÁN", UBICADA EN AV. LÁZARO CARDENAS, LOCALIDAD MÉXICO INSURGENTES / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,780,672.92	1,780,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,932.43	1,553,932.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	100	87.26
181456/0011	05	01	A	224	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESTRUCTURA TIPO U1C EN ESCUELA SECUNDARIA No. 368 "FERNANDO MONTES DE OCA", EN CALLE MIGUEL ALEMAN, LOCALIDAD CORONEL JOSE ANTONIO TORRES / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,292,865.40	1,292,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,661.16	1,155,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	90	89.39
181457/0012	05	10	A	202	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, EN JARDIN DE NIÑOS "FELIPE ANGELES", UBICADO EN CD. CUAUHEMOC / CIUDAD CUAUHEMOC	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	757,605.40	757,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,822.61	601,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	79	79.44
181458/0013	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", LOCALIDAD LA POPULAR / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	2,374,230.56	2,374,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,798.96	1,756,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	74	73.99
181459/0014	05	10	A	202	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "TEPOCHCALLI", CIUDAD CUAUHEMOC GEO 2000 / CIUDAD CUAUHEMOC SECC. GEO 2000	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	757,605.40	757,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	0	0.00
181460/0015	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR", LOCALIDAD CIUDAD CUAUHEMOC, SECCIÓN TECUESCONCO / CIUDAD CUAUHEMOC SECCIÓN TECUESCONCO	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,027.46	1,109,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	93	93.42
181461/0016	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO / MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	01/10/2014	31/10/2014	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,222.69	549,222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	46	46.27




REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
181462 /0017	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "CULTURA AZTECA", CALLE CUAUHTEMOC S/N, LOCALIDAD SAN PEDRO XALASTOC / SAN JOSÉ XALOSTOC	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	3,561,345.84	3,561,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	6.00		5	500	500	0	0.00
181463 /0018	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIDRO FABELA ALFARO", LOCALIDAD TOLOTZIN / TOLOTZIN I	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	593,557.64	593,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,998.29	467,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	79	78.85
181464 /0019	05	10	A	202	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE RANCHO NUEVO, LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA CAÑADA / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,947,582.80	1,947,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,834.11	1,472,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	76	75.62
181465 /0020	05	10	O	222	MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 852 "EHECATL", UBICADA EN CALLE PUERTO VALPARAISO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA / TIERRA BLANCA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	990,216.00	990,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,174.08	731,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	100	73.84
181466 /0021	05	10	A	222	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 852, LOCALIDAD TIERRA BLANCA / TIERRA BLANCA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,780,672.92	1,780,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	0	0.00
181467 /0022	05	10	O	202	MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CIVEIRA TABOADA", LOCALIDAD MEXICANOS UNIDOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	207,173.97	207,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,026.66	198,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	6.00		5	500	500	95	95.58
183475 /0023	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", T.M. UBICADA EN AV. LLANO DE BAEZ S/N, COLONIA MEXICANOS UNIDOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	593,557.64	593,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	0	0.00

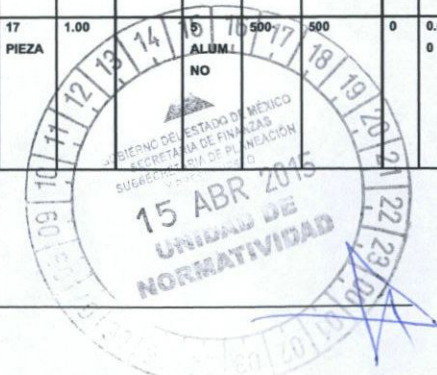


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
183476/0024	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "SILVINA JARDON", CALLE ZAFIRO, LOCALIDAD LA JOYA / LA JOYA	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	864,252.91	864,252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	500	500	0	0.00
183477/0025	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AZOTEA DE AULAS CON IMPERMEABILIZACIÓN, EN EL JARDIN DE NIÑOS "SILVINA JARDON" CALLE ZAFIRO, LOCALIDAD LA JOYA / LA JOYA	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	332,184.60	332,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	500	500	0	0.00
183478/0026	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL ALEMAN", UBICADO EN AV. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, LOCALIDAD EL CHAMIZAL / EL CHAMIZAL	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,642.10	882,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	500	500	74	74.35
183479/0027	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "QUETZACOATL", UBICADA EN AV. JESÚS ARRIAGA S/N, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,780,672.92	1,780,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,576.44	1,498,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		5 ALUMNO	500	500	84	84.16
183490/0028	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE SEIS AULAS ESCUELA PRIMARIA "QUETZACOATL", UBICADA EN AV. JESÚS ARRIAGA S/N, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,931,771.03	1,931,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,654.85	1,353,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		5 ALUMNO	500	500	70	70.07
183492/0029	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C, EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN", UBICADA EN AV. CENTRAL S/N, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,292.41	962,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	500	500	81	81.06
183507/0030	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AZOTEA EN AULAS CON IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 "PORFIRIO DIAZ", CALLE MORELOS S/N, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA / GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,628,544.06	1,628,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,379.51	1,560,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	500	500	96	95.81




REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
183509 /0031	05	10	A	222	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 672 "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", UBICADA EN CALLE 12, LOCALIDAD VILLAS DE ECATEPEC / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	2,374,230.56	2,374,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,201.14	1,316,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	56	55.44
183510 /0032	05	10	A	202	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS "ADRIAN ORTEGA MONROY", CALLE PRIVADA AZTECA S/N, LOCALIDAD SANTA CLARA / SANTA CLARA COATITLA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	593,557.64	593,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,700.62	460,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	78	77.62
183511 /0033	05	10	A	202	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", UBICADA EN CALLE LÁZARO CARDENAS S/N, LOCALIDAD JOSE ANTONO TORRES / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,852.78	1,033,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	100	87.09
183512 /0034	05	10	A	202	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL JOSÉ OTHON", UBICADA EN AV. GRAN CANAL S/N, LOCALIDAD TOLOTZIN I / TOLOTZIN I	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,475.29	864,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	73	72.82
183513 /0035	05	10	A	211	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN", CALLE NOGAL S/N, LOCALIDAD NIENESTAR PAA LA FAMILIA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	593,557.64	593,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,914.70	496,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	100	83.72
183514 /0036	05	10	A	211	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS TIPO ESTRUCTURA U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN AV. RECURSOS HIDRAULICOS S/N, LOCALIDAD ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	4,748,461.10	4,748,461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	8.00		5	500	500	0	0.00

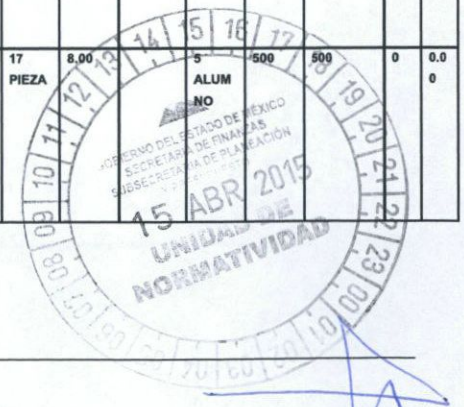


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
183515 /0037	05	10	A	222	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 "JOSÉ MARIA VELASCO", UBICADA EN CALLE RAMÓN CIRA, LOCALIDAD CHICONAUTLAN 3000 BARRIO 3 / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,187,115.28	1,187,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	0	0.00
183516 /0038	05	10	A	222	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA TELESECUNDARIA NO. 581 "20 DE NOVIEMBRE", UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC Y ZAFIRO S/N, LOCALIDAD LA JOYA ECATEPEC / LA JOYA	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	593,557.64	593,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,423.34	464,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	78	78.24
183517 /0039	05	10	O	222	MANTENIMIENTO DE CATORCE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", UBICADA EN AV. SAN AGUSTIN PONIENTE S/N, LOCALIDAD NVO. PASEO DE SAN AGUSTÍN / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	3,319,342.73	3,319,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,567.17	3,295,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	14.00		5	500	500	99	99.28
183518 /0040	05	10	O	202	MANTENIMIENTO DE SEIS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS", UBUICADA EN AV. PALOMAS S/N , LOCALIDAD NUEVA DIAZ ORDAZ / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,780,671.00	1,780,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,945.71	965,945.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	6.00		5	500	500	54	54.25
183519 /0041	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO", UBICADA EN CALLES CUERNAVACA Y TLALNEPANTLA, LOCALIDAD LOMAS DE SAN CARLOS / LOMAS DE SAN CARLOS	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,780,671.00	1,780,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,124.94	687,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	39	38.59
183521 /0043	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN	CONTRA TO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	2,979,328.19	2,979,328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,085.61	804,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	4.00		5	500	500	27	26.99

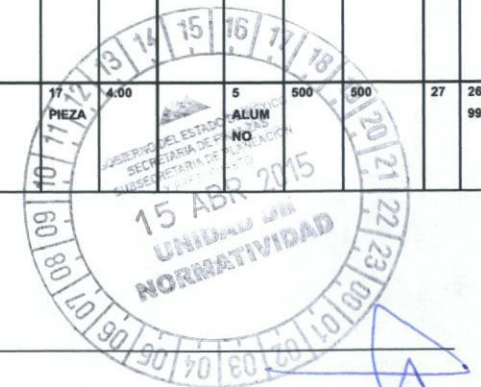

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
									Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
183523/0045	05	10	0	211	MANTENIMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARTÍ", UBICADA EN SUR 24 Y AV. SAN AGUSTIN, LOCALIDAD SAN AGUSTIN / SAN AGUSTIN PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,187,114.00	1,187,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,557.26	1,185,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	8.00		5	500	500	100	99.87
183524/0046	05	10	0	222	MANTENIMIENTO DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TENOCHTTLÁN", UBICADA EN AV. INDUSTRIAS ECATEPEC S/N, ESQ. R-1 LOCALIDAD INDUSTRIAS ECATEPEC / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,187,114.00	1,187,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,160.56	1,135,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	5.00		5	500	500	100	95.63
183525/0047	05	10	0	211	MANTENIMIENTO DE DOCE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADA EN CALLE GEOGRAFOS S/N, LOCALIDAD AMPL. SAN JOSE XALOSTOC / SAN JOSÉ XALOSTOC	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	3,332,000.78	3,332,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,774.46	1,851,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	12.00		5	500	500	56	55.58
183527/0049	05	10	0	222	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 105 / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500		
183528/0050	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N LOCALIDAD TEXALTA / TEXALPA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	2,874,819.15	2,874,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	5.00		5	500	500	0	0.00
183529/0051	05	10	0	211	MANTENIMIENTO DE ONCE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", UBICADA EN AV. CHIAPAS Y JALAPA S/N, LOCALIDAD AMPL. TULPETLAC / AMPLIACIÓN TULPETLAC NORTE	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	703,524.00	703,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	11.00		5	500	500		
183530/0052	05	10	0	211	MANTENIMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DERECHOS DEL NIÑO", UBICADA EN CALLE ZACUATITLAN S/N, LOCALIDAD HANK GONZÁLEZ / HANK GONZÁLEZ	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	608,560.00	608,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,783.33	607,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	8.00		5	500	500	100	99.88



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Físicos y Financieros**  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES**  
**Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
183531/0053	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA E CALLE PAZ S/N, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3RA SECCIÓN / BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,149,927.66	1,149,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	0	0.00
183532/0054	05	10	O	211	MANTENIMIENTO DE 15 AULAS EN LA ESCELA PRIMARIA TULPETLAC, EN AV. 5 DE MAYO, LOCALIDAD EL CHARCO / CHARCO 1	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,141,050.00	1,141,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	15.00		5	500	500		
183533/0055	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA TIPO U1C, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA", UBICADA EN CALLE XOCIALCALCO S/N SECCIÓN TLALOC, LOCALIDAD CIUDAD CUAUHEMOC / CIUDAD CUAUHEMOC SECCIÓN TLALOC	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	574,963.38	574,963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	500	500	0	0.00
183534/0056	05	10	A	202	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "MOCTEZUMA XOCOYOTZIN", UBICADO EN AV. ECATEPEC S/N LOCALIDAD ALMARCIGO NORTE / ALMARCIGO NORTE	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	833,365.94	833,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	0	0.00
183535/0057	05	10	A	222	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESTRUCTURA TIPO U1-C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 162 "EMMA GODOY", UBICADA EN CALLE DOLORES S/N LOCALIDAD SANTA MARIA CHICONAUTLA / PUEBLO SANTA MARÍA CHICONAUTLA	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,724,891.49	1,724,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	3.00		5	500	500	0	0.00
184787/0058	05	10	O	211	MANTENIMIENTO DE CATORCE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA / GRANJAS ECATEPEC	CONTRATO	01/09/2014	31/12/2014	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,826.12	1,707,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	14.00		5	500	500	97	99.28
184788/0059	05	10	A	211	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA TIPO U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA / GRANJAS ECATEPEC	CONTRATO	01/09/2014	31/12/2014	1,015,560.00	1,015,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,090.65	813,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	2.00		5	500	500	91	80.07






REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03


Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
184790 /0061	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS / SAN FRANCISCO DE ASÍS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	2,014,290.13	2,014,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,956.79	1,739,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2168.00		2 COLONIA	1	2500	86	86.38	
184791 /0062	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEXICASCO / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	2,193,187.13	2,193,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,686.45	862,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2200.00		2 COLONIA	1	2500	39	39.33	
184792 /0063	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIDAD TEPEXICASCO / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	5,919,263.06	5,919,263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,538.29	5,402,538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	5700.00		2 COLONIA	1	2500	91	91.27	
184793 /0064	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LAS TORRES, LOCALIDAD MÉXICO NUEVO / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	67,465.44	67,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	96.00		2 COLONIA	1	2500	0	0.00
184794 /0065	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CIUDAD CUAUTEMOC NO. 322, 323 LLANETES / CIUDAD CUAUTEMOC	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	3,783,456.00	3,783,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		2 COLONIA	1	3800	0	0.00
184795 /0066	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE CIUDAD CUAUTEMOC / CIUDAD CUAUTEMOC	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	2,522,304.00	2,522,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		2 COLONIA	1	3800	0	0.00



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
184796 /0067	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	17,058,317.56	17,058,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352,295.40	7,352,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1400.00		2 COLONIA	10	15000	40	43.10
184797 /0068	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	4,626,562.50	4,626,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	45000.00		7 FAMILIA	1250	5000	0	0.00
184798 /0069	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA, UBICADA EN RÍO DE LOS REMEDIOS ESQ. MASSACHUSETTS, LOCALIDAD LAS VEGAS XALOSTOC / SAN JOSÉ XALOSTOC	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,038,204.56	1,038,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,999.90	1,037,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	100	99.98
184799 /0070	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA UBICADA EN CALLE CRUZ DE CALVARIO ESQ. EJOTE, COLONIA TABLAS DEL POZO / TABLAS DEL POZO	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,615,720.00	1,615,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,860.03	1,512,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	93	93.63
184800 /0071	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA, UBICADA EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE DE SANTIAGO Y PASEO DE LOS JARDINES, LOCALIDAD JARDINES DE MORELOS / JARDINES DE MORELOS SECCIÓN MONTES	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,039,015.00	1,039,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,178.81	729,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	500	70	70.18
184801 /0072	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO TIPO UC-1 EN EL JARDÍN DE NIÑOS, / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,318,520.80	1,318,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,959.87	1,064,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	81	80.77
184802 /0073	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA UBICADA EN CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA ESQUINA JUAN ALDAMA, LOCALIDAD HANK GONZÁLEZ, DENTRO DEL PARQUE BICENTENARIO / HANK GONZÁLEZ	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,039,055.00	1,039,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,738.48	959,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	92	92.37



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03


Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
184803/0074	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	0	0.00
184804/0075	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA, UBICADA EN CALLE MARIA DOLORES S/N ESQUINA MARIA DE JESUS Y PROLONGACIÓN AV. MÉXICO, COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ / MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,278,206.00	1,278,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,222.73	816,222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	64	63.86
184805/0076	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	045 LECHERIAS	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA, UBICADA EN AV. OAXACA S/N ENTRE CANAL Y CERRADA DE JAZMIN, LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC / SANTA MARIA TULPETLAC	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,127,287.92	1,127,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,014.88	1,081,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	100	95.90
184806/0077	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO ESTRUCTURA TIPO U1-C, EN LA ESCUELA PRIMARIA / HANK GONZÁLEZ	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,318,520.80	1,318,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,759.36	974,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	74	73.93
184807/0078	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL / SANTA CLARA COATITLA	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	0	0.00
184808/0079	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	01/07/2014 //	31/12/2014 //	2,666,667.00	2,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,667.00	2,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	50000	100	100.00
184809/0080	16 OTP	06 INFRAESTRUCTURA ARTESANAL	I EQUIPAMIENTO	183 ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNIARIOS	ENTREGA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662,699.57	9,662,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	500.00		7 FAMILIA	500	2000	100	96.63

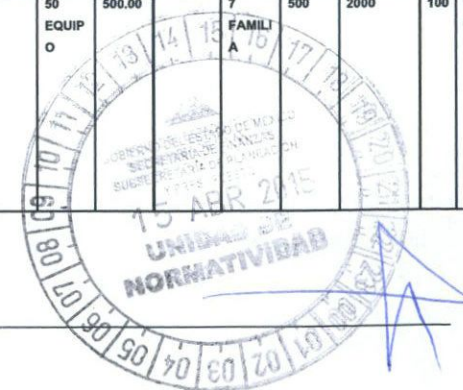

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Físicos y Financieros**  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES**  
**Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03


N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.					
184810/0081	05	EDU	10	0	REZAGO EDUCATIVO	MANTENIMIENTO	215	01/10/2014	31/12/2014	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	1	500	0	0.00	0.00
184811/0082	04	SAL	02	I	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	EQUIPAMIENTO	160	01/10/2014	31/12/2014	3,128,520.00	3,128,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,808.00	2,211,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		4	1	500000	71	70.70	70.70
184812/0083	05	EDU	10	A	REZAGO EDUCATIVO	CONSTRUCCION	215	01/10/2014	31/12/2014	1,130,715.00	1,130,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,548.36	967,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	1	500	85	85.57	85.57
184813/0084	04	SAL	02	I	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	EQUIPAMIENTO	160	01/10/2014	31/12/2014	6,038,600.00	6,038,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038,600.00	6,038,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	3.00		4	1	500000	100	100.00	100.00
184814/0085	05	EDU	10	0	REZAGO EDUCATIVO	MANTENIMIENTO	215	01/10/2014	31/12/2014	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	1	500	0	0.00	0.00
184815/0086	17	URB	09	A	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	196	03/11/2014	31/12/2014	12,968,438.22	7,805,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163,349.65	10,326,699.27	5,163,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163,349.65	0.00	0.00	02	1.00		4	1	10000	66	79.63	79.63
184816/0087	05	EDU	10	0	REZAGO EDUCATIVO	MANTENIMIENTO	206	01/10/2014	31/12/2014	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	1	500	0	0.00	0.00



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Físicos y Financieros**  
**(Cifras en Pesos)**  
**MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES**  
**Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
184817/0088	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODIMDF / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/09/2014 //	31/10/2014 //	1,500,800.00	1,500,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,208.69	1,496,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	52.00		4 MUNICIPIO	1	1656107	0	99.69	
184818/0089	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA / EL CHAMIZAL	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	691,112.48	691,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	0	0.00	
184819/0090	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MUEBLES PARA OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/09/2014 //	31/10/2014 //	1,824,876.94	1,824,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,876.94	1,824,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		4 MUNICIPIO	1	1656107	0	100.00
184820/0091	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADA EN CERRADA GUADALUPE VICTORIA S/N, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA / EJIDAL EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	01/10/2014 //	31/12/2014 //	1,318,520.80	1,318,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	500	0	0.00

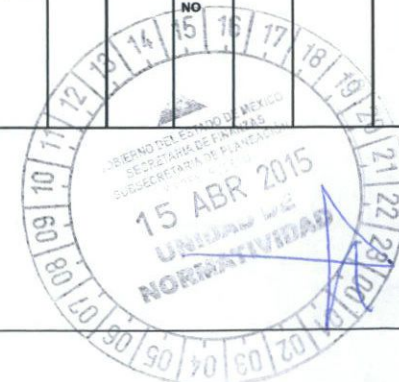

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,283,847.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medidas Aprobadas	U. Medidas Modificadas	U. Medidas Ejecutadas	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
184821/0092	05	10	A	226	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 162 EMMA GODOY, UBICADA EN CALLE DOLORES S/N, LOCALIDAD SANTA MARIA CHICONAUTLA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2014	31/12/2014	1,318,520.80	1,318,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,174.15	450,174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00		5	1	500	34	34	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 86						TOTAL			171,447,196.68	166,283,847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163,349.65	96,414,654.00	91,251,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

LIC. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. EN A.P. JOSÉ ORTEGA RÍOS  
TESORERO MUNICIPAL



ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DR. EN A.P. MAURICIO HERRERA TREJO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

